

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 29 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 08 de agosto de 2024

HORA: 07:30 am a 8:50 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Liliana Chaparro	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Bertha Liliana Torres M.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sandra Palacios Sanabria	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sara Juliana Delgado	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Yira Bolaños Enríquez	Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E)	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-26014

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nicolás Andrade Duque	Profesional Claro Colombia	Claro Colombia	X		
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Fernando Cruz	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416
Alexandra Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Mauricio García	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jorge Enrique Abreo Reyes	Profesional FDL de Chapinero	Alcaldía Local de Chapinero	X		
Laura Ramírez	Profesional FDL de Usaquén	Alcaldía Local de Usaquén	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (28 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión N°. 29 de 2024.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión veintinueve **(29)** del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Chapinero y Usaquén, a continuación, se inicia su participación:

3.1 Alcaldía de Chapinero – Jorge Enrique Abreo Reyes:

Indica que hace parte del área de infraestructura del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero como apoyo a la supervisión y formulación. Posteriormente, informa que dividió los temas a presentar en dos documentos, el primero correspondiente a la vigencia 2023, del contrato 263 de 2023, se tienen varios trámites en curso que son necesarios para dar continuidad y término al proyecto.

- **Caso 151 (nuevo):** Para SDA, corresponde a un permiso silvicultural, a pesar de que algunas intervenciones son sobre calzada, y son de conservación, se requirió este trámite en marzo, contando con respuesta hasta julio. A la fecha se subsanó lo requerido y se está a la espera de la expedición del permiso para dar apertura a los frentes de obra.
Se relacionan los siguientes radicados: 2024ER66489, 2024ER102985 (BTE 2601262024) y 2024ER152450.

Intervención SDA – Sandra Palacios: Se verificó en el sistema, encontrando que la solicitud se encuentra en trámite, por tanto, se gestionará internamente con la subdirección de silvicultura.

- **Caso 152 (nuevo):** Para SDP, se realizó solicitud de declaratoria de espacio público para el CIV 2001250, teniendo en cuenta que se encuentra en inventario IDU, pero no en el de espacio público del DADEP.
Al respecto se efectuó investigación con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, donde se reportaron los documentos que especifican la cartografía en formato Shape con los lotes, las construcciones y manzanas catastrales del sector, siendo parte de la información que requiere la Secretaría Distrital de Planeación de acuerdo con radicado 2-2024-42632.
Esta información inicial se está organizando con la topografía actual, en adición, se está programando mesa de trabajo con las personas que representan estos predios, y en ese orden de ideas, se solicita a la SDP-Subdirección de Centro Ampliado acompañamiento para proceso de socialización.

Intervención SDP – Paola Gámez: Se solicitará a la Subdirección de Centro Ampliado delegar un funcionario para acompañar proceso requerido por el FDL-Chapinero.

- **Caso 153 (nuevo):** Para ENEL Colombia, el contratista hizo una solicitud de traslado de dos postes ubicados en la mitad de la calzada, en el sector Mariscal Sucre, teniendo en cuenta que el límite de la intervención corresponde a los CIV 2001977 y 2001969, por lo cual se requiere comunicación y colaboración de ENEL, teniendo en cuenta que ya se pagó la factura desde el 18 de junio, pero no se ha programado la maniobra.
Se relacionan los siguientes consecutivos: 00731057, 00816096 y 611181811.

Intervención ENEL – Mauricio Arenas: Se solicita confirmar número de oferta y remitir soporte a correo electrónico para realizar seguimiento y gestionar al interior de la ESP.
Se remite vía chat de la reunión, la dirección de e-mail para recibir información correspondiente.

- Por otro lado, con respecto a la mesa de soterramiento de redes, de la cual hace parte el IDU, en el contrato de obra se tienen previstos algunos diseños soterrados sobre el

sector de la DG 76, los diseños ya se encuentran aprobados por ENEL, ETB y demás ESP.

Sin embargo, solo se ha recibido una invitación a una convocatoria para participar en las mesas de trabajo, y se requiere conocer cuáles son los procedimientos a seguir considerando que a diferencia del IDU, el FDL no cuenta con ningún tipo de convenio suscrito con las ESP.

En consecuencia, se solicita informar cuál es el delegado de la Oficina de Coordinación Interinstitucional - OCIT para tratar el tema de la Mesa de Soterramiento de Redes en la Mesa de Asistencia Técnica que convocará el FDL-CH.

Intervención IDU – Jaime Bermúdez: Con respecto a su consulta, se está llevando a cabo un proceso de reglamentación del artículo 222A del Plan de Ordenamiento Territorial, a través de un decreto para soterramiento de redes, por lo cual el borrador ha sido objeto de diversas observaciones, a la fecha se recibieron 176 comentarios, los cuales se están revisando antes de contar con el documento definitivo.

Ahora bien, es importante mencionar que la reglamentación de un artículo no deja sin definición la ejecución de obras de infraestructura, ya que en esa lógica el IDU no hubiera podido ejecutar ningún proyecto, con respeto se precisa que el proceso de reglamentación adelantado por el IDU acompañado de SDHT no impide la ejecución o la gestión de las Entidades encargadas de realizar proyectos de infraestructura.

Se informa que de la OCIT el delegado para temas de soterramiento de redes es el funcionario Daniel Reino, se remitirá contacto.

- También, se indica al IDU que se han solicitado reservas para segmentos viales desde el 14 de junio, pero no se ha recibido respuesta.
Consecutivos asociados: 20245220291891, 20245210069972, 20245210066782.

Intervención IDU – Jaime Bermúdez: Se solicitan radicados IDU, no del FDL, para realizar la respectiva trazabilidad al respecto del tema.

- Finalmente, se requieren los delegados para que en virtud de lo establecido en el Decreto 268 de 2021, desde el FDL-CH se cuente con la debida asistencia técnica de las Entidades y ESP del Distrito Capital, se enviaran los correos electrónicos con las solicitudes de delegación (toda vez que no se cuenta con los radicados de ingreso para cada entidad respectivamente).
- Para SDP se solicita respuesta a delegado a mesa de soterramiento de redes.

Intervención SDP – Paola Gámez: Se aclara que las mesas de soterramiento se sesionan en el marco de la Comisión Intersectorial de Servicios Públicos a cargo de la Secretaría Distrital del Hábitat, desde SDP se ha solicitado la reactivación de esta instancia, no obstante, en respuesta recibida por parte de SDHT se informa que no se han podido reanudar porque no se cuenta con reglamentación. Se emitirá comunicación a FDL-CH con esta claridad en torno a la instancia de coordinación, ya que es una mesa que no puede ser citada por las Alcaldías Locales pues cuenta con una reglamentación establecida a nivel Distrital.

3.2 Alcaldía de Usaquén – Laura Ramírez:

- **Caso 156 (nuevo):** Se informa que se tienen pendientes cierre de pines con la Secretaría Distrital de Ambiente, por lo cual remitirá al correo de la profesional Sandra Palacios la información pertinente para que apoye la gestión al respecto. Se adjunta

correo.

Número de pines: 24605, 24327, 22362, 23130, 23082 y 24596.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (28 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 01 de agosto de 2024, correspondiente a la sesión número 28 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se presentaron observaciones.

También se menciona, que **el acta 27** se encuentra en proceso de publicación en la página Web de la Secretaría Distrital de Planeación. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

Nº.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
3	01/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
4	08/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
5	15/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
6	22/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
7	29/02/2024	X	X	X	X	3-2024-11328	21/03/2024	Publicado en página web.
8	07/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
9	14/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
10	21/03/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.

Nº.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
11	04/04/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
12	11/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
13	18/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
14	25/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16391	8/5/2024	Publicado en página web.
15	02/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18159	27/5/2024	Publicado en página web.
16	09/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18601	06/06/2024	Publicado en página web.
17	16/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
18	23/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
19	30/05/2024	X	X	X	X	3-2024-20615	20/6/2024	Publicado en página web.
20	06/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21201	28/6/2024	Publicado en página web.
21	13/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21311	28/6/2024	Publicado en página web.
22	20/06/2024	X	X	X	X	3-2024-22571	10/7/2024	Publicado en página web.
23	27/6/2024	X	X	X	X	3-2024-23136	10/7/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE II	X	X	X	X	3-2024-26366	2/8/2024	Publicado en página web.
24	04/07/2024	X	X	X	X	3-2024-24411	22/7/2024	Publicado en página web.
25	11/07/2024	X	X	X	X	3-2024-26764	2/8/2024	Publicado en página web.
26	18/07/2024	X	X	X	X	3-2024-27253	2/8/2024	Publicado en página web.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
27	25/07/2024	X	X	X	En trámite	3-2024-28146	Pendiente	En proceso de publicación.
28	01/08/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En proceso de firma en el IDU.

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la ingeniera Bertha Liliana hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 IDU – Liliana Torres Moreno:

De acuerdo con reporte realizado por redes sociales, se requiere de manera urgente:

- **Caso 154 (nuevo):** Para ENEL, en la calle 32 sur con carrera 26F – Barrio Murillo Toro, reposición de tapa para caja de redes secas abierta sobre calzada, se han reportado varios casos de accidente por estado de dicha infraestructura.

De acuerdo con revisión de casos del Comité, la EAAB, ENEL y VANTI tienen la mayor cantidad de casos asignados, por lo cual se solicita su gestión y verificación.

5.2 UAERMV – Humberto Ramírez:

- **Caso 149:** La UAERMV hizo visita, en la misma se verificó que dicho sector fue intervenido por el IDU en enero 16 de 2023, por lo cual se requiere verificar garantías, se solicita reasignar caso.

5.3 ETB – Carmen Rocío López:

Respecto del caso expuesto por la Ingeniera Martha Helena Silva de Secretaría Distrital de Movilidad, por intervención realizada en zona de interés cultural (a cargo del IDPC), hoy se remitió respuesta dando cumplimiento al protocolo establecido. Se adjunta a la presente acta.

5.4 EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:

- **Caso 155 (nuevo):** Para IDU, respecto de la demolición de predios en proyectos IDU, se requiere avanzar con el cierre de las cuentas contrato, previamente se había expuesto en el **caso 112**, no obstante, no es exclusivo de cable aéreo San Cristóbal, sino de otros dos proyectos (Transmilenio AK 68 – Avenida Congreso Eucarístico y, sobre la Avenida Caracas).
Para el caso 112, algunos avances se han dado, pero no ha sido posible gestionar con otros proyectos, por lo anterior, se solicita realizar mesa de trabajo entre EAAB (Dirección Comercial) e IDU (Dirección Técnica de Predios).

NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:

Se informa vía correo electrónico desde el IDU:

- **Caso 83:** La Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, por medio del memorando 202433600231733 da respuesta, aclarando la situación actual en la Av. Guayacanes con respecto al sumidero, se anexa memorando y se solicita cerrar el caso.
- **Caso 144:** Vía chat de WhatsApp, ENEL reporta que ya se realizó reposición de tapa.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4	Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	EAAB – Red Matriz	IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quien se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
23	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.	IDU	Intervención IDU – Angélica López en acta 06: Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.
25	Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	EAAB - Zona 1	Pendiente
26	Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07: Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB. IDU- Onisalba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU, que la EAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como desvío la misma Avenida y que en ese sentido los huecos, posiblemente se han generado por esos desvíos sin que sean exactamente intervenciones como tal para las obras que se adelantan.
28	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.	MOVISTAR	Pendiente
29	Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.	EAAB - Zona 1	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
36	En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva. Observación FDL - 26 de mayo: Corrección de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio público costado norte.	EAAB - Zona 1	Pendiente
39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.	EAAB - Zona 2	Acta 22, EAAB – Zona 2 – Wilson Porras: Para dar continuidad al caso 39 se debe realizar inspección con CCTV, desafortunadamente en este momento el equipo se encuentra fuera de servicio, actualmente se está a la espera de los repuestos para su reparación, y continuar con las actividades programadas en este sector. Se remite el 24/06/2024 registro fotográfico de sectores sobre carrera 4 que ya tuvieron recuperación de espacio público.
43	Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	ENEL COLOMBIA	Sesión 11 - ENEL – Mauricio Arenas: Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días. Observación FDL - 26 de mayo: Se están adelantando las gestiones y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.
47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.	ENEL COLOMBIA	En sesión 21, se reitera el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL CODENSA, donde se requiere instalación del barraje necesario para la energización del parque en el cual ya se encuentran terminadas las obras requeridas y solicitan a ENEL la instalación para poder liquidar el contrato ya que este no es posible sin que el parque tenga la iluminación verificada. Ya se ha notificado a ENEL desde agosto del 2023, pero no han obtenido respuesta. Intervención ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Respecto a la energización del parque, indica que ENEL fue a hacer la revisión de la obra encontrando que las cámaras tienen las tapas soldadas por lo que no fue posible la inspección de la ductería, ni realizar las respectivas validaciones que la compañía debe hacer, se solicitó al área encargada si es posible desoldar para hacer la revisión y realizar la energización lo más pronto posible. Indica que la energización se realiza de una subestación localizada en un conjunto residencial pero que en los documentos aportados no llegó la carta de autorización para obtener el ingreso al conjunto para poder hacer la revisión y la energización cuando corresponda.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.	ENEL COLOMBIA	En sesión 21 , se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzú el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, en donde se había identificado que el problema era un tema con el medidor. Respuesta ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Se solicita de igual manera revisar el tema a las 2:00 pm.
53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras: Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq. Carmen Rocío López a Juan Carlos López.
54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	EAAB - Zona 2	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.
56	Para ENEL, se solicita retiro y reposiciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	Alcaldía Kennedy	Pendiente
77	Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.	Alcaldía Suba	En sesión 19 IDU indica , se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
78	Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	EAAB – Red Matriz	Caso reportado desde 2023. Nubia Riaño informa en sesión 14: Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos. SESIÓN 28: ETB - Carmen Rocío López informa: El Ingeniero Juan Fernando solicita escalonamiento al comité, teniendo en cuenta que no ha sido posible agendar una reunión con la Ingeniera Nubia Riaño, ya que se han enviado correos de fecha 18 y 25 de junio para retomar la reparación de la cámara del sector de la calle 26 con avenida carrera 68, sin respuesta alguna. Intervención EAAB – Red Matriz – Nubia Riaño: Se está reprogramando la visita con el área de mantenimiento, en el transcurso de esta semana se comunicará agendamiento. Se toma nota del número de celular del ingeniero de ETB para realizar contacto.
79	Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.	EAAB - Zona 3	Pendiente
91	Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
92	Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).	VANTI GAS NATURAL	Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García: Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.
95	Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	En acta 19, IDU señala que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.
97	Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.	MOVISTAR	En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña: Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.
98	Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
108	Para VANTI, con referencia a los casos 81 y 82, de acuerdo con lo informado por el área de conservación las situaciones presentadas sobre la AC 80 no fueron recibidas a conformidad por parte de la interventoría y el contratista, por lo tanto, se solicita visita de campo con delegados de UAERMV y VANTI con Ingeniero Sergio Alejandro Díaz quien integra el equipo de apoyo a la supervisión del contrato 1782 de 2021.	VANTI GAS NATURAL	Acta 21 , De IDU se informa que con referencia a los casos 81 y 82, no se han llevado a cabo los recorridos requeridos a VANTI y UAERMV, por parte de la UMV hoy se remitió la información de contacto del Ingeniero Carlos Castaño, quién obra como gerente de infraestructura urbana de la Unidad de Mantenimiento Vial. Desde la OCIT se transmitió la información al Ingeniero Sergio Díaz, quién es apoyo a la supervisión del citado contrato, entonces se espera coordinar prontamente dicha reunión. Respecto de VANTI, se informa por parte de la supervisión que hoy se realizará recorrido. Acta 22 : Con referencia a los casos 81 y 82, el ingeniero Sergio Alejandro Díaz del Área de Conservación informó que el 13 de junio realizaron los recorridos con VANTI y UAERMV. Con la UAERMV se dejó el compromiso que serían reparadas las afectaciones y que iniciarían el día lunes y terminarían el día miércoles. Para el caso de VANTI, se levantó acta de inspección y quedó el compromiso que en un lapso de 15 días hábiles estarían culminando los arreglos de las zonas que habían sido afectadas.
111	Para Movistar, se solicita respuesta de la petición con radicado 20240419105915900 del 24 de abril de 2024.	MOVISTAR	Pendiente
112	Para IDU, presenta situación pendiente relacionada con la construcción del cable aéreo San Cristóbal del contrato IDU 1167 de 2023, para su ejecución se tuvieron que demoler en cada estación 2 manzanas, las estaciones objeto de consulta son "La Victoria" y "Altamira", donde se demolieron predios, pero el IDU no ha generado cierre de las cuentas contrato, de las mismas se está contabilizando consumo. Por lo anterior, se solicita al IDU pronunciamiento, y que como se ha requerido realice los cierres de las cuentas.	IDU	Durante el día 06 de junio de 2024, el Ingeniero Álvaro Reinoso remite correo electrónico a la Dirección Técnica de Predios informando la situación presentada sobre el sector, para realizar la debida suspensión del servicio. Acta 23 - EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López : Se solicita información al IDU respecto de la petición de suspensión de servicio sobre manzanas que fueron adquiridas mediante compra de predios para construcción de proyecto de cable aéreo. Acta 23 - IDU – Álvaro Reinoso : Se remitió correo informando el caso el 06 de junio, no obstante, se continuará gestión con profesional Mateo Grajales, a su vez Liliana Torres puede generar un apoyo escalando tema a interior del IDU.
114	Para EAAB-Red Matriz, se solicita visita técnica de la EAAB en la Avenida Ciudad de Villavicencio con calle 65 sur (se requiere verificar dirección) teniendo en cuenta que se presentan empozamientos posiblemente por causa de las redes, y este corredor vial fue intervenido hace poco mediante contrato de conservación IDU.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
115	Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.	EAAB - Zona 2	Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
116	Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	EAAB – Red Matriz	En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.
122	Para ETB, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 012826 del 31 de octubre de 2023 y 015527 del 31 de enero de 2024, donde se requiere certificado de "paz y salvo".	ETB	Pendiente
123	Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de "paz y salvo".	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
124	Para ENEL, se solicita reposición de tapas de cajas de inspección, las cuales fueron reportadas a la ESP mediante consecutivo 657851 del 23 de noviembre de 2023	ENEL COLOMBIA	Acta 23 - ENEL – Jorge Mauricio Arenas: Se toma nota del número de radicado y se verificará internamente, ya que la reposición de tapas es un tema de atención urgente por la generación de posibles accidentes. Se remite vía chat información de contacto para comunicarse directamente con profesional del Fondo de Desarrollo Local.
127	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una solicitud en la calle 162 entre carrera 54 y 55, donde se evidencia un posible daño de redes, se solicita realizar visita conjunta.	EAAB - Zona 1	Pendiente
128	Para ETB, se solicita atender caso presentado por Alcaldía Mayor sobre el sector de la carrera 7 entre calles 61 y 62 (costado oriental) donde se observan pozos sin tapa, generando alto riesgo para transeúntes.	ETB	Acta 23 - Respuesta ETB – Benjamín Ochoa: Se informa que respecto al caso 128, si corresponden a cámaras de ETB, se procedió a realizar reporte a la Gerencia de Servicios Masivos para que se efectúe la correspondiente reposición, así mismo se remita registro fotográfico para evidenciar el cumplimiento de la actividad.
132	Para IDU, se tienen algunas inquietudes respecto al Decreto 625 de 2023 – "Por medio del cual se reglamenta el artículo 132 del Decreto Distrital 555 de 2021 "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C." y se dictan otras disposiciones", ya que en su artículo 13 se manifiesta que mediante nuevo acto administrativo se adoptarán los manuales e instructivos que se estimen pertinentes, por lo cual, se requiere este documento para iniciar programación de mantenimiento de andenes en la localidad.	IDU	Pendiente
134	Para EAAB, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, hay unas cajas en algunos tramos donde se está ejecutando que requieren intervención, por lo cual se solicita acompañamiento técnico de la ESP, al momento se ha intentado realizar contacto con el Ingeniero Mauricio Mahecha sin que se haya logrado gestionar, se han programado visitas sin llegar a realizarse.	EAAB - Zona 1	Pendiente
135	Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	MOVISTAR	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
136	Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.	EAAB - Zona 2	Pendiente
137	Para EAAB-Zona 3, se reporta en la carrera 13A N°. 23-81 socavación en la vía, falla de la carpeta asfáltica y estructura de soporte, debido a posible fallo de colector de aguas residuales, se evidencia pérdida de material en dicha estructura.	EAAB - Zona 3	UAERMV - Humberto Ramírez - Sesión 25: Para EAAB-Zona 3, se solicita atención de la carrera 13A con calle 23, se relaciona con requerimiento ciudadano para atender hueco generado sobre calzada, una vez realizada la visita se colige que puede relacionarse con atención de fallo sobre redes de alcantarillado, por lo cual se verificó y al parecer EAAB intervino, no obstante, aún se requiere recuperación de calzada.
138	Para EAAB-Zona 1, se presenta socavación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 12, costado sur, en el área aferente se observa pozo del sistema de alcantarillado, es posible que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección y de ser el caso, la debida atención de la EAAB.	EAAB - Zona 1	Pendiente
139	Para EAAB-Zona 3, la situación fue reportada a través de redes sociales, se localiza en la calle 22 con carrera 14 (Avenida Caracas), en donde se puede visualizar a través del registro fotográfico, falla en la estructura de pavimento posiblemente por socavación, se solicita visita de campo de la EAAB para verificar, y para que con el diagnóstico completo de la situación se tomen las decisiones pertinentes en aras de garantizar la seguridad vial en el sector.	EAAB - Zona 3	Pendiente
140	Para EAAB-Zona 1, respecto de la reparación realizada por la EAAB en la calle 134 con carrera 19, se realizó reparación de red sanitaria, no obstante, aún se requiere recuperación de espacio público, se solicita la debida gestión.	EAAB - Zona 1	Pendiente
142	Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.	VANTI GAS NATURAL	Acta 26: Alexandra Rojas solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.
143	Para EAAB-Zona 3, se solicita apoyo para adecuación de collarín de cobre en el CIV 16004474, del barrio San Francisco. Así mismo, se aclara que el Ingeniero Francisco siempre ha sido muy presto en apoyar y atender a los llamados del Fondo de Desarrollo Local.	EAAB - Zona 3	Pendiente
145	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender hundimiento reportado en la AC 3 frente a placa 51A-10.	EAAB - Zona 3	Pendiente
146	Para EAAB-red matriz, se reporta daño en la carrera 70C (Avenida Ciudad de Villavicencio) con calle 63 sur, se solicita verificar estado de redes.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
147	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.	EAAB - Zona 3	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
148	Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y generar las medidas pertinentes para atender daño.	EAAB - Zona 2	Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras: Se realiza verificación frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado lateral occidente, en línea con red. Se verifica pozo aguas abajo en la KR 16A con calle 79 y se encuentra drenando con normalidad, se verifica pozo aguas arriba en la KR 16A con calle 78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad.
149	Para UAERMV, caso reportado en el chat de WhatsApp del comité el día 29 de julio de 2024, se relaciona con hueco en la calle 8B N°. 80C-09, barrio Castilla, el cual presenta alto riesgo para la comunidad, se solicita su atención.	IDU	Acta 28 - EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: Se informa que, verificado el sector, no hay daño de redes asociado a deterioro de calzada. Acta 29 - 5.2 UAERMV – Humberto Ramírez: La UAERMV hizo visita, en la misma se verificó que dicho sector fue intervenido por el IDU en enero 16 de 2023, por lo cual se requiere verificar garantías, se solicita reasignar caso.
150	Para EAAB-Zona 3, caso reportado en el chat de WhatsApp del comité el día 30 de julio de 2024, se relaciona con recuperación del espacio público por intervención de redes en la calle 24 #7-18.	EAAB - Zona 3	Acta 28 - Intervención EAAB-Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez: Se informa que cuenta con aviso EAAB N°. 1002156533 y se encuentra programado para recuperación.
151	Para SDA, corresponde a un permiso silvicultural, a pesar de que algunas intervenciones son sobre calzada, y son de conservación, se requirió este trámite en marzo, contando con respuesta hasta julio. A la fecha se subsanó lo requerido y se está a la espera de la expedición del permiso para dar apertura a los frentes de obra. Se relacionan los siguientes radicados: 2024ER66489, 2024ER102985 (BTE 2601262024) y 2024ER152450.	SDA	Acta 29 - Intervención SDA – Sandra Palacios: Se verificó en el sistema, encontrando que la solicitud se encuentra en trámite, por tanto, se gestionará internamente con la subdirección de silvicultura.
152	Para SDP, se realizó solicitud de declaratoria de espacio público para el CIV 2001250, teniendo en cuenta que se encuentra en inventario IDU, pero no en el de espacio público del DADEP. Al respecto se efectuó investigación con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, donde se reportaron los documentos que especifican la cartografía en formato Shape con los lotes, las construcciones y manzanas catastrales del sector, siendo parte de la información que requiere la Secretaría Distrital de Planeación de acuerdo con radicado 2-2024-42632. Esta información inicial se está organizando con la topografía actual, en adición, se está programando mesa de trabajo con las personas que representan estos predios, y en ese orden de ideas, se solicita a la SDP-Subdirección de Centro Ampliado acompañamiento para proceso de socialización	SDP	Acta 29 - Intervención SDP – Paola Gámez: Se solicitará a la Subdirección de Centro Ampliado delegar un funcionario para acompañar proceso requerido por el FDL-Chapinero.
153	Para ENEL Colombia, el contratista hizo una solicitud de traslado de dos postes ubicados en la mitad de la calzada, en el sector Mariscal Sucre, teniendo en cuenta que el límite de la intervención corresponde a los CIV 2001977 y 2001969, por lo cual se requiere comunicación y colaboración de ENEL, teniendo en cuenta que ya se pagó la factura desde el 18 de junio, pero no se ha programado la maniobra. Se relacionan los siguientes consecutivos: 00731057, 00816096 y 611181811.	ENEL COLOMBIA	Acta 29 - Intervención ENEL – Mauricio Arenas: Se solicita confirmar número de oferta y remitir soporte a correo electrónico para realizar seguimiento y gestionar al interior de la ESP. Se remite vía chat de la reunión, la dirección de e-mail para recibir información correspondiente.
154	Para Claro, en la calle 32 sur con carrera 26f – Barrio Murillo Toro, reposición de tapa para caja de redes secas abierta sobre calzada, se han reportado varios casos de accidente por estado de dicha infraestructura.	ENEL COLOMBIA	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
155	Para IDU, respecto de la demolición de predios en proyectos IDU, se requiere avanzar con el cierre de las cuentas contrato, previamente se había expuesto en el caso 112, no obstante, no es exclusivo de cable aéreo San Cristóbal, sino de otros dos proyectos (Transmilenio AK 68 – Avenida Congreso Eucarístico y, sobre la Avenida Caracas). Para el caso 112, algunos avances se han dado, pero no ha sido posible gestionar con otros proyectos, por lo anterior, se solicita realizar mesa de trabajo entre EAAB (Dirección Comercial) e IDU (Dirección Técnica de Predios).	IDU	Pendiente
156	Se informa que se tienen pendientes cierre de pines con la Secretaría Distrital de Ambiente, por lo cual remitirá al correo de la profesional Sandra Palacios la información pertinente para que apoye la gestión al respecto. Se adjunta correo al acta. Número de pines: 24605, 24327, 22362, 23130, 23082 y 24596.	SDA	Se remitió correo el 08 de agosto de 2024 con archivo que relaciona pines ambientales y su estado.

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
-Casos presentados	156	100,00%
-Casos resueltos al corte	96	61,54%
-Casos pendientes al corte	60	38,46%

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver dos (02) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 83 y 144, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver dos (02) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 83 y 144, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, especialmente ENEL, EAAB – Zona 1 y EAAB – Zona 3.	

8 COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 15 de agosto de 2024
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 15 de agosto de 2024

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 15 de agosto de 2024

9 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número veintinueve **(29)** del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 15-agosto de 2024 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,


JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
PRESIDENTE


PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba– SDP.

Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.
William Fernando Chávez – IDU.


Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.

- Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 29 de 2024.
2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 29 de 2024.
3. Atención caso ETB reporte IDPC.
4. Soporte cierre del caso 83.
5. Seguimiento pines - Alcaldía de Usaquén.
6. Requerimientos Alcaldía Chapinero.


Subserie 2131-2.14

Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO


Número de casos registrados por mes

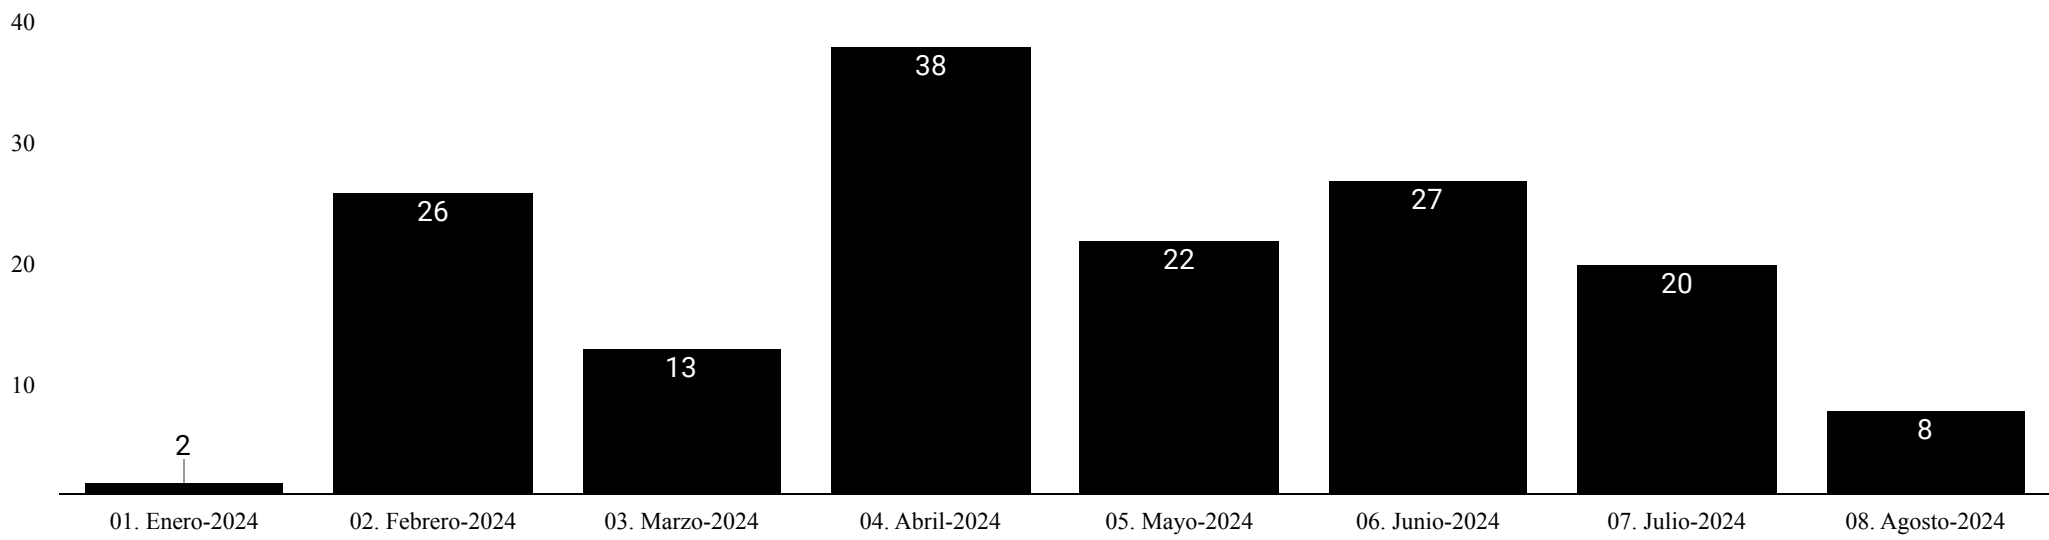

Número de casos resueltos por mes

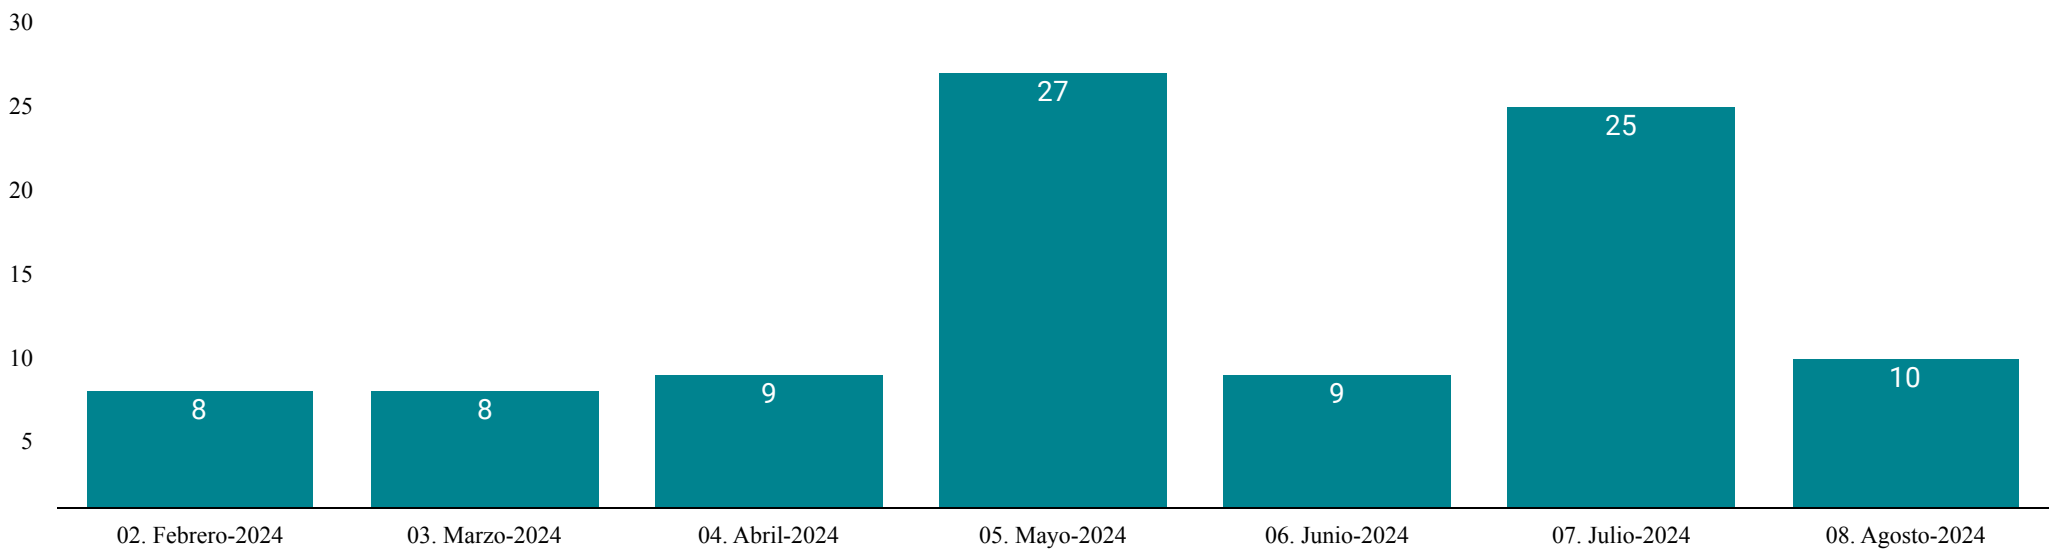

Número de casos pendientes por mes

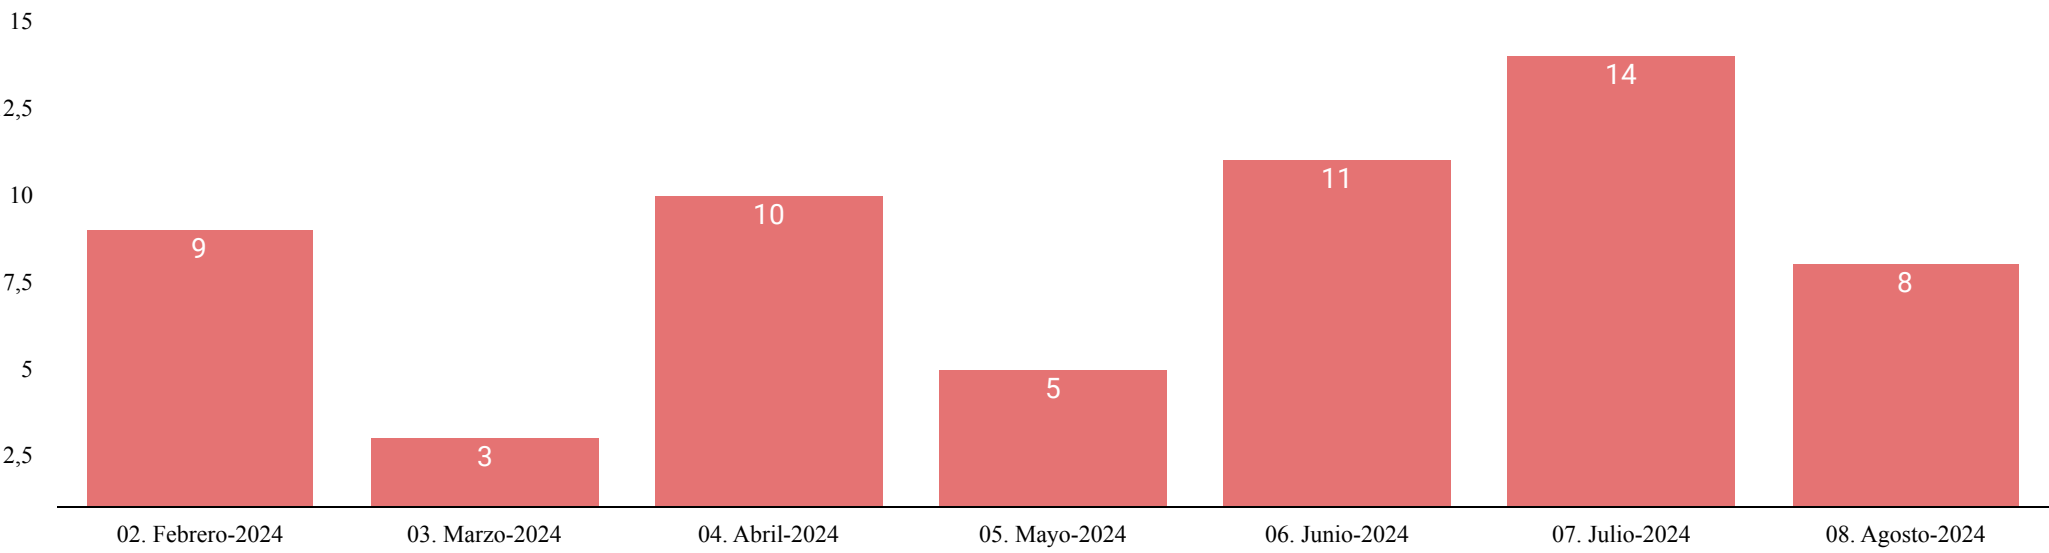

Recuento de casos

Nº. DE CASO	MES REP...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	ESTADO DEL CASO
1	01. Enero-2...	Para ENEL, se solicita que se revis...	ENEL COLOMBIA	Alta	ATENDIDO
2	01. Enero-2...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
3	02. Febrero-...	Se informa sobre las afectaciones ...	IDU	Normal	ATENDIDO
4	02. Febrero-...	Para la EAAB – Red Matriz, se ex...	EAAB – Red Matriz	Alta	PENDIENTE
5	02. Febrero-...	Para la EAAB, en la CL 28 con K...	IDU	Alta	ATENDIDO
6	02. Febrero-...	Para el IDU, solicita reunión para t...	IDU	Normal	ATENDIDO
7	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, En Carrera ...	EAAB - Zona 5	Normal	ATENDIDO
8	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
9	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
10	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo...	EAAB - Zona 4	Normal	ATENDIDO
11	02. Febrero-...	Para ENEL, en la calle 13 por Carr...	ENEL COLOMBIA	Normal	PENDIENTE
12	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
13	02. Febrero-...	Para Alcaldía de Puente Aranda, se...	Alcaldía Puente Aranda	Normal	ATENDIDO
14	02. Febrero-...	Se solicita realizar revisión con un...	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
15	02. Febrero-...	Para ETB, en la calle 47 con carrer...	ETB	Alta	ATENDIDO
16	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero...	EAAB - Zona 3	Normal	ATENDIDO

Casos registrados

156



Nº. Casos Resueltos

96



Nº. Casos Pendientes

60




Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

Porcentaje de avance

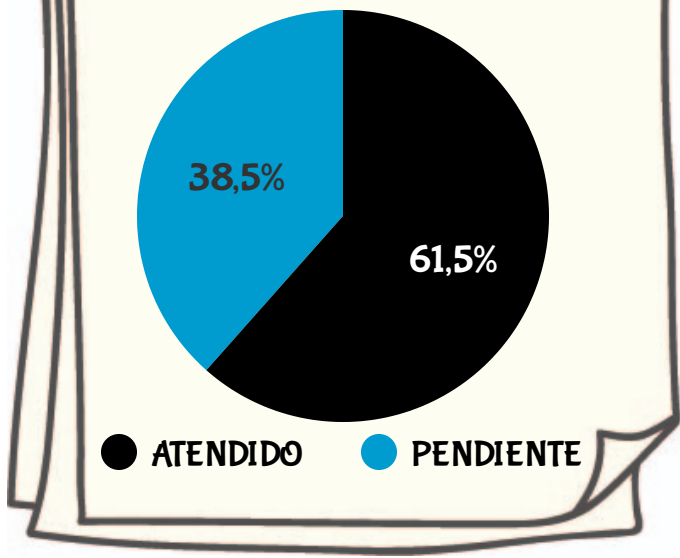

TOP – Entidades más casos asignados

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	30
2.	IDU	19
3.	EAAB - Zona 2	14
Total		155


TOP – Entidades con casos resueltos

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	19
2.	IDU	13
3.	EAAB - Zona 4	9
Total		95


TOP – Entidades con casos pendientes

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	11
2.	EAAB - Zona 1	8
3.	EAAB - Red Matriz	7
Total		60

Número de casos registrados por mes

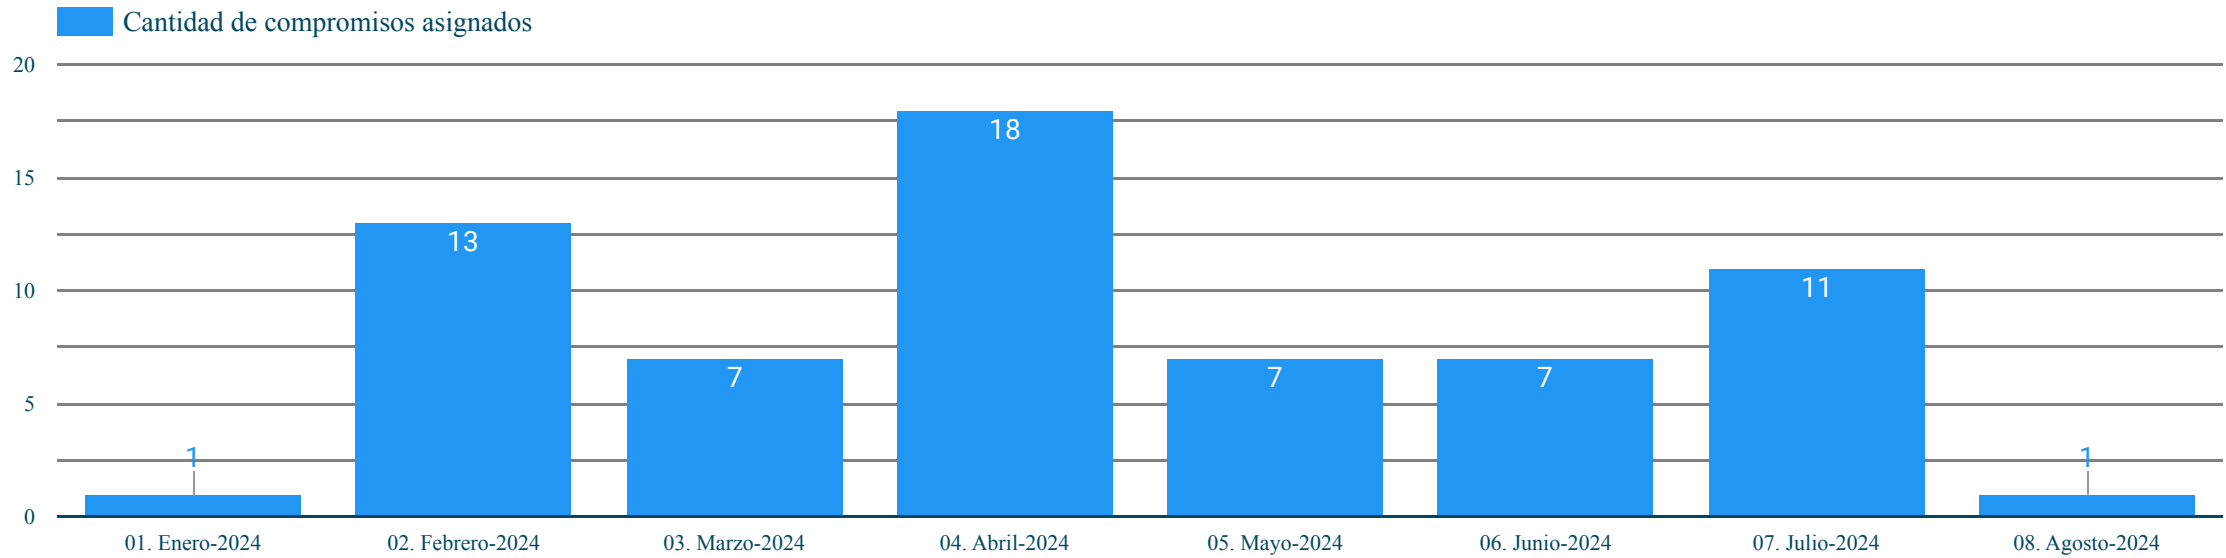


Número de casos por zona o área pendientes

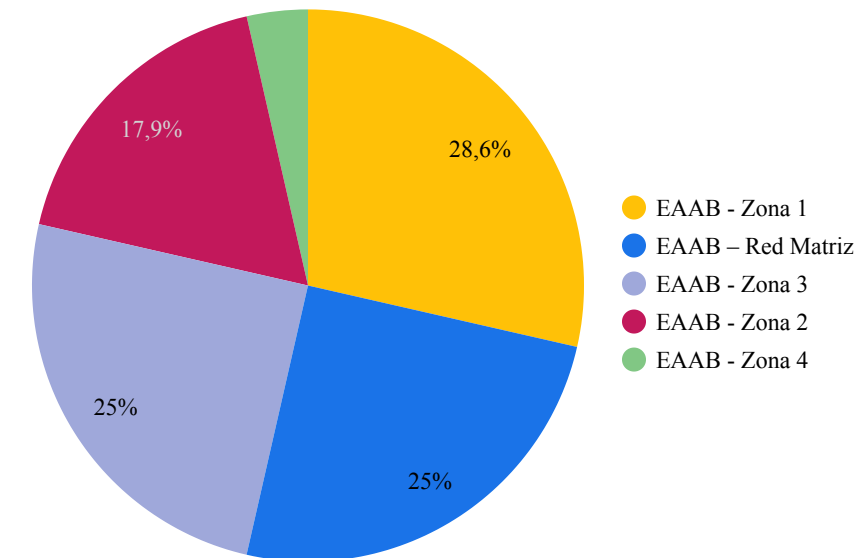

ESTADO DEL...	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucaa, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.
ATENDIDO	18	Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?
ATENDIDO	106	Para EAAB – Zona 2, sobre la calle 85 con carrera 15 se solicita recuperación de espacio público.
ATENDIDO	101	Para EAAB-Zona 3, se recibe derecho de petición N°. 000013183802 relacionado con afectación de cámara ETB. Se realizó visita a la carrera 47 # 22-83 para identificar un daño ocasionado por un contratista de la EAAB a la cámara de la Empresa, dejándola en riesgo de accidente para los peatones. En visita del viernes 24 de mayo el personal contratista negó su identificación y el




Número de casos registrados por mes

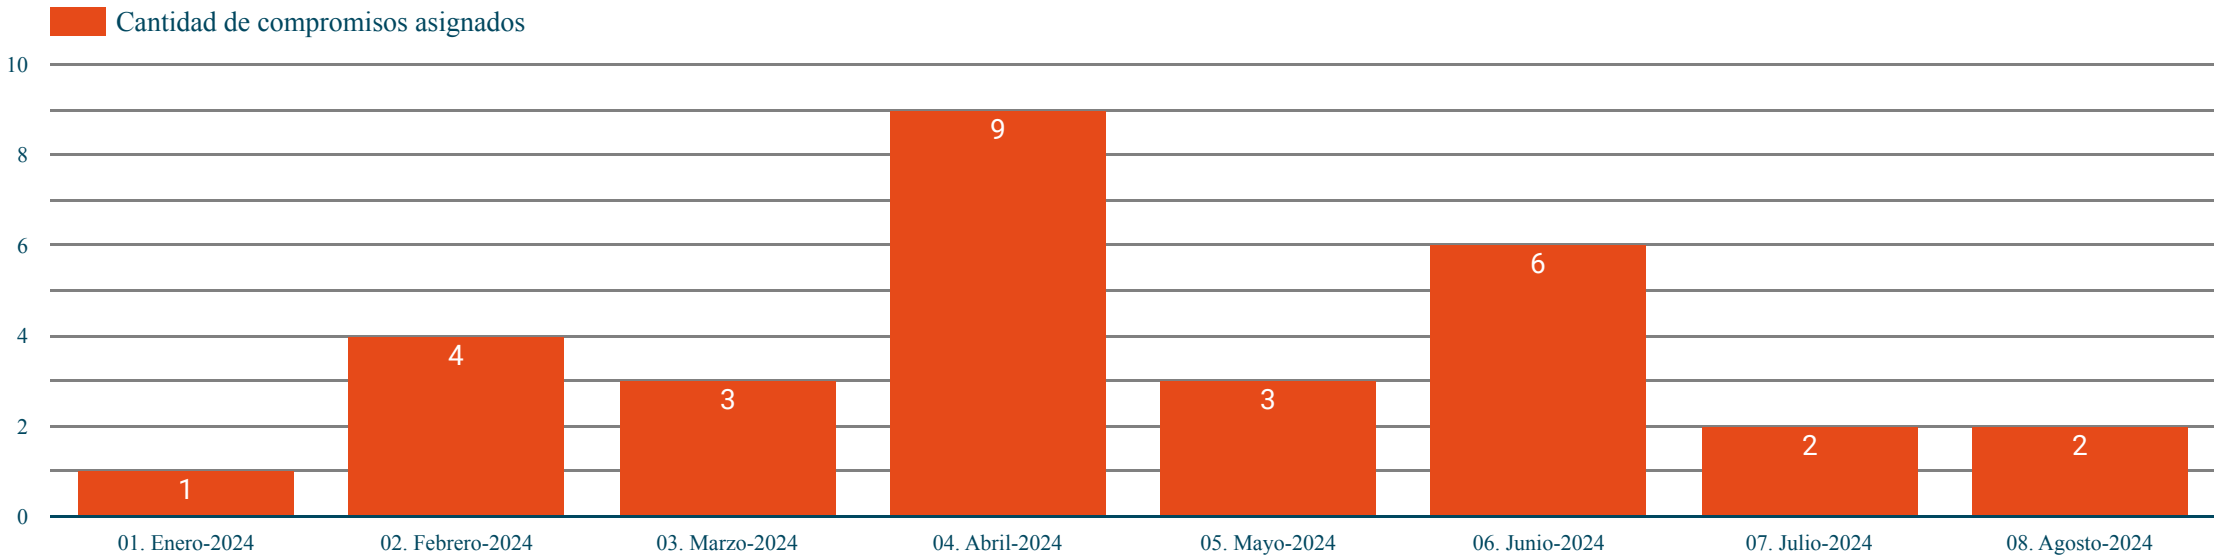

ESTADO DEL CASO ^	N°. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	120	Se informa afectación sobre la Calle 80 N°. 69H-20, que de acuerdo con reporte recibido se ubica infraestructura de la ESP – Enel Colombia SA ESP, por lo cual, se solicita recuperación de calzada y realizar acciones pertinentes.
ATENDIDO	46	Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de “paz y salvo” para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700708.
ATENDIDO	48	Del 336 de 2023, también se requiere certificado de “paz y salvo” por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 22 de marzo, y se requiere adelantar la liquidación.
ATENDIDO	34	El CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado “diseño local”, se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continua o se puede levantar, en caso de haber ejecutado ya actividades, se solicita indicar a IDU levantamiento de la reserva.
ATENDIDO	89	Para ENEL, se solicita aprobación de punto de conexión radicado mediante consecutivo 1500476372 del 10 de abril. Se precisa que se obtuvo factibilidad, pero que se espera aprobación de diseño para continuar con el trámite de aprobación integral del proyecto ante el IDPC.

Número de casos registrados por mes

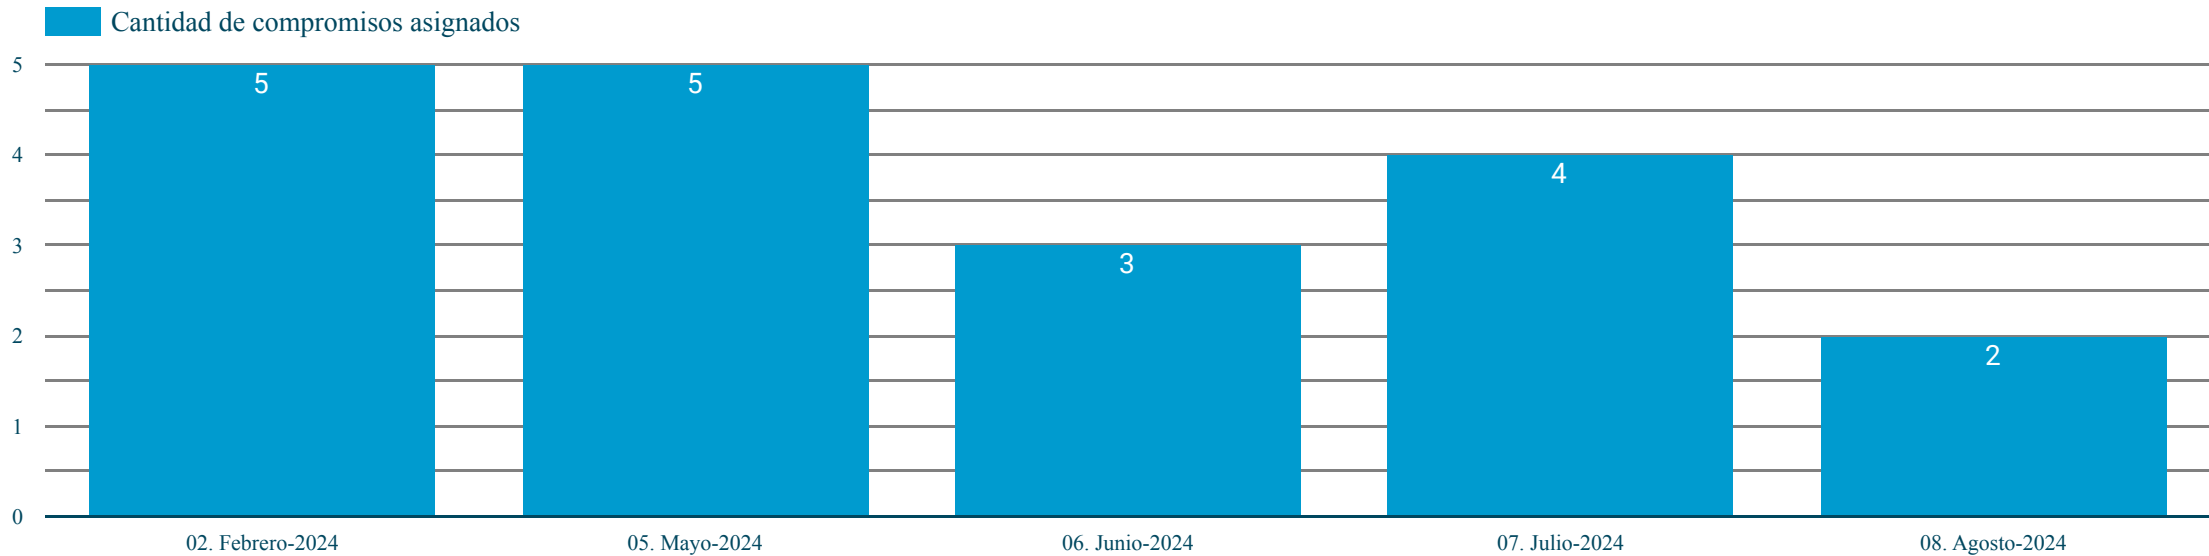

ESTADO DEL CASO ^	N°. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.
ATENDIDO	3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.
ATENDIDO	83	Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra esta finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.
ATENDIDO	86	Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio "El Paraíso", que por nomenclatura es hacia aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRORCIONAZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	1	Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 82, se presenta un desperio importante respecto a la reactiva de la vía, a la cual afecta la movilidad y la seguridad vial. A su vez, se solicita que este tema los lleven a la Mesa Operativa de Montevideo, y allí no se obtiene respuesta, por lo cual se trae a la actual instancia de coordinación, por lo cual, se solicita a Oscar Escobar (delegado de ENEL) que envíe respuesta y realice los gestiones pertinentes para solucionar este caso.	IDU	02 - Enero 25 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	11 - Abril 4 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Pendiente desde 2023 ENEL - Mauricio Arenas informa en sesión 10: En lo relacionado a las cámaras de la NQS, se envió a la empresa instalada que se ejecutó el permiso por parte de secretaría de movilidad, para que hasta el momento, el conograma sigue considerando para darle inicio a los obras, el 27 de marzo de 2024.	04. Abril-2024
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	2	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Trinita - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la EISP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	IDU	02 - Enero 25 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	08 - Marzo 07 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Ingeniero Javier Patiño informa en sesión 08: Se efectuó inspección de CCTV en el sector, no se encontraron problemas estructurales en redes, por lo cual, se concluye que se encuentran trabajando en condiciones normales. Por lo tanto, se descarta hardware producto del sistema de alertamiento. Por lo cual, se recomienda que se programe una intervención por parte de otra Entidad, como Alcaldía o UAERMV, se dejó video de CCTV a su disposición.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcantarillas, están generando estos problemas por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se realice mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.	ETB	03 - Febrero 1 de 2024		Jaime Bermudez	ATENDIDO	25 - Julio 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caladas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Alvaro Roldano en sesión 3 informa: En respuesta a la solicitud de ETB respecto a daños en las obras del IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETB que informe en escritos sobre y que dichos se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETB para dar respuesta.	07. Julio-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	4	Para la EAAB – Red Matiz, se expone un daño grave en la Av. Villaseca entre Cl. 62B y Cl. 62C cabecera oriental, debido a filtraciones al pasar en una cámara de la red matiz "Barroco – Cuadrante" de la Estación de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1607 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructura. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMFV o el IDU reparen en el sector.	UMFV	03 - Febrero 1 de 2024	EAAB – Red Matiz	Nubia Riano	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	IDU – Aracely Tatiana López Figueroa en sesión 6: Se reabre pronta atención por parte de EAAB-Red Matiz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Consejo de Regencia, por lo cual, se solicita respuesta oportuna en la Asesoría Villaseca entre Cl. 62B y Cl. 62C.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	5	Para la EAAB, en la Cl. 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedó sin reparar. Se solicita pronta acción.	UMFV	03 - Febrero 1 de 2024	IDU	Ornelisa Segura	ATENDIDO	28 - Agosto 01 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Acta 04-2024: EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Sin embargo, la división de redes realizó revisión de esta sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respectivamente de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.	08. Agosto-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	EAAB - Zona 4	03 - Febrero 1 de 2024	IDU	Alvaro Roldano	ATENDIDO	28 - Agosto 01 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Acta 04-2024: EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez.	08. Agosto-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	7	Para EAAB – Zona 5, En Camara 79 (ex Primer de Mayo) por Calle 63 ex CIV 800846, poco de daño en el mismo y convertido en depósito de basuras afectando la movilidad. Registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Acta 6 - 2024 - Respuesta EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: En el caso 7 de la Asesoría Primer de Mayo, se efectuó la verificación en terreno y se observó personal de ETB trabajando, se solicita hacer el respectivo direccionamiento a esta Entidad.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	8	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 por Camara 550, se observa hueco en pavimento al pasar originado en daños y/o filtraciones que presenta la infraestructura de la EISP, registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Matachea	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	EAAB Zona 1 reportó mediante el chat de WhatsApp atención del caso 08, por lo cual se da cierre en sesión 17.	01. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	9	Para EAAB-Zona 1, en cámara 11 entre calles 135C y 138 hubo intervención de la EAAB encontrándose pendiente la recuperación de la carpeta asfáltica, registro fotográfico enviado al chat el lunes 5 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB – Zona 1	Mauricio Matachea	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Se informa atendido.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Pápero Quiroz, TV 73P con Cl. 49 Sur, barrio La chuvia, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo limitado en audio de redacción RCI enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta ítemmente pago de un trabajador de mayor experiencia.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Pendiente, IDU informa: Que el ingeniero Juan Carlos López remitió registro fotográfico donde se realizó atención de la situación presentada sobre la vía Pápero Quiroz.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	11	Para ENEL, en la calle 13 por Camara 680 estructura raja de redes sean con afectación obstruye el paso en andar obstruyendo peajes a las transacciones, enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Concomitante, se solicita a la EISP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Pendiente.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	12	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Trinita - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la EISP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB – Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	El pasado lunes 4 de marzo, se realizó la inspección de CCTV (Acto 201738418) solicitada a través del contrato 1462-2023 solicitada de la Calle 41B Sur desde la transversal T C hasta la Transversal T4 Sur A encontrando la tubería de 10" en gran estado de deterioro en presencia de infiltración de material, únicamente una domérmica instalada a los 13 metros del punto deteriorado del tramo indicado en el esquema anexo por el Ing. Ferny. Esto nos concluye que las conexiones que se ven sobre la vía NO son debido a la red de alcantarillado.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	13	Para Alcaldía de Puente Arenas, se encontró afectación de la infraestructura de ETB en la Avenida Calle 6 entre las carreras 32 y 40, contacto norte, se observó en el sector canalizaciones afectadas, hoy día, pero no tienen valla. Se solicita contactar con el fondo de desarrollo local para conocer el número del contrato que generó los daños.	ETB	04 - Febrero 8 de 2024	Alcaldía Puente Arenas	Delegado	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Acta 04-2024: IDU indica que se remitió atención vía correo electrónico a delegados de la Alcaldía de Puente Arenas de acuerdo con base de datos de la gestión 2023.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos críticos de requerimiento.	EAAB	04 - Febrero 8 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	15	Para ETB, en la calle 47 con cámara 7 se reporta fallando de tipo, lo cual puede generar accidentes.	IDU	05 - Febrero 15 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Se informa atendido, se remitió registro fotográfico vía chat.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	16	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero Juan Rivera indica que en la Avenida Caracas con Calle 3 Sur, se solicita apoyo de la UAERMV para recuperación del sector deteriorado por la EISP. Por lo cual, se solicita a la EAAB lo siguiente: transferir la liberación de la reserva que tiene el fondo de desarrollo local de Antonio Nariño, y transferir al PMT.	UMFV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	06 - Febrero 22 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	UAERMV - Humberto Ramirez informa que se había recibido solicitud de Juan Rivera de la EAAB, para realizar espacio público a raíz de una emergencia. A UAERMV solicitó levantamiento de reserva y PMT apropiado, pero verificado en sitio, se observó que el tramo ya fue pavimentado.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	17	Para EAAB – Zona 2, en la calle 90 con Avenida Ciudad de Cali, se presentó daño en calzada de Transmilenio, el Ingeniero Diego Montoya – Gerente del Sistema Masivo solicita apoyo para recuperación de la calzada. Por lo anterior, se solicita a la EAAB se brinde primero con Transmilenio y PMT.	UMFV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	La calzada fue recuperada el lunes 12 de febrero de 2024 a través del contrato de Recuperación de Espacio Público de la Zona 2. Esta información se compartió en el chat del Comité el día 15 de febrero de 2024.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	18	Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 34 con calle 3, donde se detectó intervención en calada, el respectivo se indaga ¿Si hay alguna información adicional?	UMFV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	08 - Marzo 07 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Atendido por Ingeniero Francisco Rodríguez	03. Marzo-2024

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITU	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRORCIONAZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	37	Se reportó al Chif el día de hoy 14/03/2024 un caso relacionado con hundimiento en calzada que al pasar tiene su origen en filaciones o fallas en infraestructura de la EABM, se aboca en la Calle 53 por Carrera 87. Para el mismo considerandose se solicita verificación y acciones que se requieran por parte de zona 2.	IDU	09- Marzo 14 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	15- Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Esta solicitud se atendió con trabajos de reparación de 2 conexiones domiciliarias frente al predio de la Calle 83 No. 5-40 solucionando el problema del hundimiento que se presentaba en el sitio. Entre trabajos se realizaron el día 25 de marzo de 2024.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	38	Se reportó a la EABM - Zona 4, fuga fallante en pozo de alcantarillado en el sector de la Avenida Caracas con calle 81 sur - Barrio La Andina - Localidad de Usme.	IDU	09- Marzo 14 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	09- Marzo 14 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Ingeniero Juan Carlos López informa que se repuso fuga	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	39	Se reportó al Chif el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EABM - Zona 2.	IDU	09- Marzo 14 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Acta 19, Wilson Porras informa que se realizó el tema con el equipo de construcción interdisciplinario, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se reportó al área correspondiente en analítico y administrado según sea el caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan las actividades. Al las cosas, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	40	Para el contrato de consultoría COR-242 de 2022, se solicita certificado de "gas y salm" de la empresa de servicio público VANTU, se realizó requerimiento mediante radiado 000716047, se pide pronta respuesta.	Alcaldía Santa Fe	10- Marzo 21 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuaity	ATENDIDO	17- Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caladas y embases sobre las vías principales y colectoras de la mala red de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 12- Mario Insuaity solicita ampliación de la información por parte de la Alcaldía de Santa Fe, por lo que no se encuentra referencia a radiado 000716047, se solicita información de contacto de funcionario del FCL.	06. Mayo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	41	En la calle 32 por carrera 17, se reporta daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por infiltraciones o por daños en infraestructura de la EABM-Zona 3, se solicita realizar verificación y realizar reparación correspondiente.	IDU	10- Marzo 21 de 2024	EABM - Zona 3	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	16- Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Se efectuó verificación en el sitio determinando que no existe daño en la infraestructura de redes de la EABM. Adicionalmente los puntos donde se presenta deterioro de la vía no concuerdan con el abastecimiento de las redes de alcantarillado existentes allí.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	42	Se informa que el FCL Usme tiene en desarrollo el proyecto de construcción de un salón comunal del barrio Villa Aremosa - Sector 1, contrato 659 de 2023, sobre el mismo se va a expedir la correspondiente licencia, por lo cual se han un contrato de consultoría, ahora bien, se está solicitando la disponibilidad de servicio de alcantarillado y alcantarillado. No obstante, en el año 2023 la EABM informó que para expedir la disponibilidad requería que se contactó con la oficina de construcción, por lo cual se requiere que se confirme esta información o si realmente se requiere en la información correspondiente a la fase de construcción.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	20- Junio 06 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Observación FCL - 26 de mayo: Se han mesa de trabajo con la EABM Zona 4 donde indican que la disponibilidad de cobertura está aplicada al proyecto confora con la licencia de urbanismo, por lo tanto, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, la EABM presentó lo requerido para realizar el proceso de disponibilidad.	06. Junio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	43	Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Aremosa - Sector 1, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEC Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2023 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Sesión 11 - ENEL - Mauricio Arenas: Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberá volver a solicitar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	44	Para EABM - Zona 4, se presenta situación respecto de vías frente al nuevo Hospital de Usme, en la referencia a red de alcantarillado y no comunal, ya que por esa sector pasa una red que alimenta a casi 3 localidades. Se hace la sugerencia con el ingeniero Cesar Nolasco para la revisión de la conexión y realizar los ajustes, para se indique a que se realice visita de campo y se cierre la conexiones para terminar la intervención de este contrato.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	20- Junio 06 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Observación FCL - 26 de mayo: Dentro de la ejecución del contrato 591 de 2021, se realizaron las mesas de trabajo pertinentes con la EABM, por lo cual se adelantaron todas las acciones pertinentes y a la fecha todo el sistema de suministro de agua se encuentra funcionando sin novedad.	06. Junio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	45	Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comentó que por el cambio de gobierno no se estarían expediendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	SDA	Naren Delgado	ATENDIDO	27- Julio 25 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Observación FCL - 26 de mayo: Se tramitó en el mes de abril un oficio a la SDA, con el fin de ultimar detalles. Ya se adelantó las mesas técnicas y se está atento a la respuesta por parte de la SDA con los requisitos finales para la expedición de los permisos de ocupación.	07. Julio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	46	Del contrato 362 de 2022, el contratista solicitó certificado de "gas y salm" para cerrar la licitación, se efectuó radiación el 20 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radiado 00070708	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	12- Abril 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	ENEL remitió certificación, se encuentra adjunta al acta 11.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL, realizó vía como eléctrico en julio de 2023 comunicando indicando que se habían requerido de instalar el barrido necesario para la energización del parque los puntos como el contratista terminara la obra civil, hasta ya un tiempo se confirió a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se previene que la obra civil termine hace aproximadamente un año.	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 21, se reitera el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL CODENIA, donde se requiere instalación del barrido necesario para la energización del parque en el cual se encuentran terminadas las obras civiles y se invita a ENEL la instalación para poder liquidar el pago ya que este no es posible sin que el parque tenga la verificación verificada. Ya se ha notificado a ENEL desde agosto del 2023, pero no han obtenido respuesta.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	48	Del 336 de 2023, también se requiere certificado de "gas y salm" por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 22 de marzo, y se requiere adelantar la liquidación.	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	25- Julio 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Información: ENEL CODENIA - Mauricio Arenas: Se encuentra a la espera de la certificación.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzi, el parque ha tenido un problema con algunas tuberías, pero a la que se realizó y se han identificado que el contratista corresponde a un problema de la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo realizando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la EDP.	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 21, se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzi el parque ha tenido un problema con algunas tuberías, en donde se había certificado que el problema era un tema con el medidor.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	50	Se tiene en ejecución el contrato 316 de 2023, el cual consiste en la construcción de mala vía, uno de los tramos de este contrato corresponde a la calle de San Benito, en este corredor se encuentra un pozo de media tensión hacia el acceso a la Avenida Boyacá, se le verificado adelantado traslado del mismo sin respuesta concreta por parte de ENEL Colombia.	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	25- Julio 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 21, se reitera el estado del caso 50 referente al traslado de un pozo ubicado en la calle de San Benito. Indica que hubo demora en la realización del pago pero que se va a efectuar.	07. Julio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	51	Para EABM-Zona 4, se solicita visita a uno de los segmentos viales que se están ejecutando en el contrato 337 de 2023, por lo cual se reitera invitación al ingeniero Jorge Barja a realizar recorrido de campo antes de avanzar con las actividades de validación de campo.	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	19- Mayo 30 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En reporte realizado por SDO con delegados de Alcaldías Locales se reporta resultado.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	52	Se solicita a la EABM-Zona 2, realizar estudio y reparación de daño sobre estructura de pavimento registrada en la calle 33 entre carreras 17 y 18.	IDU	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	12- Abril 11 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	EABM-Zona 2 - Wilson Porras informa en sesión 12: La semana pasada se hizo la reparación de la red que estaba afectada y está semana se adelantó la recuperación de espacio público, por lo dimensión y características fue prioritaria.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	53	Para la EABM-Zona 2, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se desahogan afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N° 46-48 sur, cada vez que llueve se desahoga el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EABM para efectuar visita campo y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	ETB	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 12 - Zona 2 - EABM - Wilson Porras: se va a realizar confora con tabla ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de mantenimiento por temas de mantenimiento de agua, entonces durante el día se efectuó el mantenimiento para atender el requerimiento.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	54	Para EABM-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 59B, en razón, a una obra que adelantó la EABM mediante contrato 1-01-2010-1559 de 2021 - Contrato Cuencal, el parámetro la EABM en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del anteparedón de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a petición. Se adjunta documento.	ETB	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona responsable de ETB, para lo indicados que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección.	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N° DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	N° SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N° SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACION	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	04-Abril-2024	55	Pais ENEL, se solicita retiro y reposición de tapa de Enel en la Calle 13 con Avenida Boyardá sobre la glorieta costado occidental.	MOVISTAR	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "urgencia".	Alta	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	Atendido, se reporta mediante chat de WhatsApp el 03 de mayo de 2024.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	56	Pais ENEL, se solicita retiro y repuestos de tapas de Enel en Calle I 2 # 6-14.	MOVISTAR	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "urgencia".	Alta	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	Pendiente	
		57	Para modular, se relación con un asocio de futura de un edificio denominado "Experiencia" localizado en el barrio El Recuerdo, cerca a Confites, la dirección es carrera 36 #2B-55, allí y que solicitan la instalación de una valla delimitadora, por lo cual se pide al cliente, una vez revisada la valla se evidencia que la infraestructura corresponde a Movistar (la tapa), por lo cual se adjunta documento de Enel y se solicita a un profesional de Movistar realizar la valla para emitir respuesta correspondiente.	CLARO	11 - Abril 4 de 2024	ETB	Carmen Rocio Lopez	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "urgencia".	Alta	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	En sesión 12 Julián Peña de Montiel informa que una vez realizada visita técnica, se lepa correspondió a ETB por lo cual se solicita reagendar caso. En sesión 15, Carmen Rocio López comunica que se realizó visita y se observa que, si bien redes de ETB, no obstante, la caja no cumple con las especificaciones de la ESP, por lo cual, el caso se remitió al área de construcción para que se hagan los correcciones y se proceda a la instalación de la tapa. En sesión 18, ETB-Carmen Rocio solicita cierre, el caso ha atendido. Se sigue.	05-Mayo-2024
I TRIMESTRE	04-Abril-2024	58	Pais Zona 4 EAAB, en la calle 38B Sur con Carrera CC Este - Barrio Ramallo, la UMF interviene esta vía, la profundidad máxima de excavación fueron 23 cm. Se están presentando filtraciones en la red de alcantarillado de EAAB, ya sea facha hacen funcionamiento y cuando se hace mantenimiento de la línea de drenaje, el CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la Empresa. Se solicita a la EAAB de su veloz y económicamente colaboración ante la situación que se presenta.	UMV	11 - Abril 4 de 2024	EAAB – Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	23 - Junio 27 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de catallanes y andenes sobre las vías principales y colectores de la malva vital de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	En sesión 14 informo que se ha avanzado con visita por parte de la EAAB – Zona 4 , se espera reunión para llegar a conclusiones respecto de la intervención Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: El ingeniero Santiago Vilar informa que en la Inspección por CCTV se observaron fisuras en la tubería y se va a realizar manga para remediar el problema de redes en el área, se tiene programada la actividad para dentro de dos semanas.	06-Junio-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	59	Pais EAAB – Zona 5, el 10 de abril se efectuó solicitud via correo electrónico para verificar disponibilidad de tubería y accesorios, si es posible que la EAAB apoye al FCD, con el suministro	Altadita Bosa	12 - Abril 11 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Peñero	ATENDIDO	12 - Abril 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de catallanes y andenes sobre las vías principales y colectores de la malva vital de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	Intervención EAAB – Zona 5 – Javier Peñero" Se informa que se llegó al correo electrónico mencionado, y se verificó la disponibilidad ya que se tuvieron material, no obstante la medida para remediar que se requiera aperturando los tramos a vaya reparando el material, en aras de prioritar. Por lo anterior, se respondió al correo en los términos indicados y para que se tenga una respuesta por parte de la EAAB.	04-Abril-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	60	Para ETB, el contrato SDB de 2021 se encuentra en etapa de liquidación y se requiere apoyo para generar certificado de "paz y salvo" de ETB, se recomienda con el Ingeniero Berjanto, pero no se ha obtenido respuesta. El ingeniero Berjanto se comunicó con personal de la Alcaldía, indica que se han hecho varias visitas de obra, en uno de los puntos se observó el daño que se atribuye al contratado, el contratado en vice de obtener certificado de "paz y salvo" con prontitud realizará el pago, pero a la fecha no se ha generado recibos por parte de ETB.	Altadita Bosa	12 - Abril 11 de 2024	ETB	Carmen Rocio Lopez	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	Se remite certificado de "Paz y Salvo" de acuerdo con lo indicado en acta 14.	04-Abril-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	61	Pais EAAB – Red Matiz, se reporta en la Diagonal 108B Sur con Carrera 48J dando sobre espacio público donde se aboca tapa de residuos, se solicita reparación.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	EAAB – Red Matiz	Nadia Ruiz	ATENDIDO	16 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "urgencia".	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	Red matiz informó el 25 de abril que la situación había sido atendida.	05-Mayo-2024
I TRIMESTRE	04-Abril-2024	62	Para UAERUV, se reporta en grado TV 1A No. 544-78 excomente sobre vía pública, se solicita nota.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	UMV	Humberto Ramirez Gómez	ATENDIDO	16 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "urgencia".	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	UMV informa en sesión 13 que, una vez revisada la base de datos de la UAERUV, no se encontró este sector, y se reitera que la UAERUV nunca debe encontrarse solo vía, se envía respuesta. La solicitud verifique por parte de la EAAB, cuando se realiza visita al mismo jueves 02 de mayo se informa que no hay excomente en la ubicación indicada, se remite registro fotográfico vía chat.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	63	Pais EAAB-Zona 1, se reporta en la KR 45A entre CL 136A y CL 13AD dando sobre estructura de pavimento, posiblemente por redes, se solicita verificar y realizar la recuperación del espacio público.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	EAAB – Zona 1	Mauricio Malache	ATENDIDO	16 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "urgencia".	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	Se afirma que el pavimento ya se encuentra recuperado.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	64	Para UAERUV, se reporta hundimiento en la CL 85 entre KR 12 y KR 13, dando sobre estructura de pavimento, las verificaciones por EAAB indicando que corresponden a daños por redes, por lo cual se solicita su reparación.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	UMV	Humberto Ramirez Gómez	ATENDIDO	13 - Abril 18 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "urgencia".	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	UAERUV informa en acta 18: que no se ha podido intervenir, a la fecha la UAERUV se encuentra trabajando PMT para ejecutar labores en el segmento vital.	04-Abril-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	65	Para EAAB – Zona 3, se solicita del contrato FOUL-COP-379-2023 que tiene por objeto "Realizar las obras de conservación de la malva vit y espacio público asociado en la localidad de Fontibón, Bogotá, D.C. a través del sistema de precios unitarios fijos y a metro apostado", la respuesta al radicado E-2024-03062 correspondiente a redes sobre la CL 13 con KR 13AD.	Altadita Fontibón	13 - Abril 18 de 2024	EAAB – Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de catallanes y andenes sobre las vías principales y colectores de la malva vital de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	En sesión 16, Luis Francisco informa que se cuenta con respuesta mediante oficio E-2024-17144, con nota comunicativa se emitió respuesta a la Altadita Local de Fontibón.	05-Mayo-2024
I TRIMESTRE	04-Abril-2024	66	Para EAAB – Zona 2, se solicita respuesta a certificado de "paz y salvo" radicado mediante número E-2024-02208 del 04 de marzo de 2024, que se relaciona con una sentencia de especies arbóreas.	Altadita Engativá	13 - Abril 18 de 2024	EAAB – Zona 2	Wilson Javier Ponce	ATENDIDO	19 - Mayo 30 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de catallanes y andenes sobre las vías principales y colectores de la malva vital de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	En sesión 16, Luis Francisco informa que se cuenta con respuesta mediante oficio E-2024-17144, con nota comunicativa se emitió respuesta a la Altadita Local de Fontibón.	05-Mayo-2024
		67	Para VANTI, el contrato de obra pública FOL-E-492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requiere certificado de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 01523XRD01544 del 05 de diciembre de 2023.	Altadita Engativá	13 - Abril 18 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insaurry	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de catallanes y andenes sobre las vías principales y colectores de la malva vital de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	En sesión 17, VANTI informa que se emitió respuesta al FCD, se anexa soporte a dicha acta.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	68	Para ETB, el contrato de obra pública FOL-E-492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requiere certificado de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 012626 del 07 de octubre de 2023 y 015507 del 31 de enero de 2024.	Altadita Engativá	13 - Abril 18 de 2024	ETB	Carmen Rocio Lopez	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de catallanes y andenes sobre las vías principales y colectores de la malva vital de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	En sesión 18, ETB solicita cierre, toda vez que se requirió información adicional al ingeniero Ibañ, representante del contrato y a la fecha no se ha recibido respuesta.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconformidad en el barrio La Chocula, CL 40 sur con KR 75A, se está tratando, tiene desde agosto de 2023, con Movistar se evidenció mala intervención y se está interveniendo por un contratista del FCD Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó varias peticiones por hundimientos, entre ellas se acortó la infraestructura de Movistar, en la cual se presento filtración de aguas residuales. Se requiere intervención de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con gerencia y plomos, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presente problemas en redes.	EAAB – Zona 4	13 - Abril 18 de 2024	Altadita Kennedy	Delgado	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	Pendiente	
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	70	Se indica que la Alcaldía Local de Suba ejecutó contrato de mantenimiento de parques durante el año 2023, en el cual se realizaron una serie de reuniones con la Empresa de Aseo Urbano y Abastecimiento de Bogotá – EAAB, allí se acordaron algunas intervenciones y destinos importantes sobre la ejecución. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita firma y cierre de las actas involucradas, ya que se han emitido via correo electrónico a los Ingenieros Mauricio Malache y Germán López, sin embargo, no se han recibido diligencias. Se solicita emitir documentos para que se sigan en el expediente del contrato.	Altadita Suba	14 - Abril 25 de 2024	EAAB – Zona 1	Mauricio Malache	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de catallanes y andenes sobre las vías principales y colectores de la malva vital de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	Atendido durante comit, se cuenta con registro fotográfico de documento enviado en acta 14.	04-Abril-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	71	Para Javier Botolíder de Bogotá, dentro de los factores prioritarios que se le solicitó al contratado que favoreciera dentro de su propuesta económica para la adjudicación del contrato, sea realizar la siembra de algunas especies de árboles en cada uno de los parques que abarca a través del contrato de mantenimiento de 2023 (Contrato 484 de 2023), no obstante, no se tiene respuesta de fondo por parte del Javier Botolíder de Bogotá y se requiere para cumplir con el factor de sustentabilidad antes mencionado.	Altadita Suba	14 - Abril 25 de 2024	SDA	Karen Segura	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	Se actúa que como delegada hace parte del área de manejo de RCD y obras, no obstante, se pasó en contacto con la subdirectora de actividades de SDA, para ayudar a gestionar solicitud, pero no existe a esta instancia de coordinación.	04-Abril-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	72	Se informa que el FCD, está desarrollando un proyecto de rehabilitación de 19 segmentos viales, pero se firmó el convenio con 14 de estos tramos, CMI 1200587, 1200778, 1200875, 1200965. Se requiere una mesa de trabajo con Empresa Metro, ya que se debe aclarar una situación en torno al contrato 363 de 2022, al respecto de los segmentos mencionados se desarrollaron estudios y diseños en lo correspondiente a malva vital intermedia, con ciertas características que permiten la intervención por parte del FCD. Si e eje vía tuviera alto tráfico, no se ejecutaría.	Altadita Barrios Unidos	14 - Abril 25 de 2024	SDM	Martha Helena Silva	ATENDIDO	19 - Mayo 30 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de catallanes y andenes sobre las vías principales y colectores de la malva vital de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.ceia.gov/handle/documento/874263?sequence=1&view=true&openAccess=false	SDU informa mediante revisión de casos que se realizó oficio radicado FOL-BU No 2024022015534 el 19 de Abril de 2024 a Empresa Metro solicitando información sobre detalles por proyecto Metro en zona de interés, se recibió respuesta el 8 de mayo de 2024 por parte de Empresa Metro, en el que indica que por el momento en estos segmentos no se tiene prioridad intervenciones como desarrollo de zona de interés, por lo tanto continúa el proceso sobre estos segmentos de interés para su intervención.	05-Mayo-2024

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N° DE CASO	SOLICITU	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	N° SEÑÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N° SEÑÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓ	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVO
II TRIMESTRE	04_Abril-2024	73	Para EABZ-Zona 3, se reporta fuga que presenta daño y consecuente riesgo para los transeúntes en la C+V 7 U+6.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EABZ - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	18 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	EABZ - Zona 3 - Luis Francisco informa en sesión 16 que ya fue atendido el caso.	05_Mayo-2024
II TRIMESTRE	04_Abril-2024	74	Para ENEL, se reporta fallos de tapa en la calle 147 al accidente de la carrera 9 con calzada norte.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	Se reporta reposición de tapa en la calle 147 con carrera 9. Se solicita cierre del caso expuesto por Cristóbal Segura.	04_Abril-2024
II TRIMESTRE	04_Abril-2024	75	Para EABZ-Zona 1, se reporta intervención realizada en la carrera 5 con calle 141, donde se requiere recuperación de pavimento.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EABZ - Zona 1	Mauricio Mancha	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	En sesión 14 informa EABZ - Zona 1 - Mauricio Arenas: Se comunicó vía correo electrónico que la intervención efectuadamente fue de EABZ, y no está permitiendo la recuperación de espacio público, la cual se encuentra a cargo de un contratista privado, el cual tiene programada la actividad para el 24 de abril de 2024. En sesión 17 se informa que, con el reporte realizado por el ingeniero Mauricio Mancha, el caso quedó cerrado.	05_Mayo-2024
II TRIMESTRE	04_Abril-2024	76	Para EABZ – Zona 5, se reporta sucesión en la calle 26 sur con carrera 78B, se solicita verificar y atender situación de emergencia.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EABZ - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	21 - Junio 13 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	En sesión 21, EABZ – Zona 5 - Javier Patiño informa que sobre la calle 26 sur con carrera 78B no se encuentran actividades, se cierran, se hace repavimentación de terreno adyacente adonde está, se hizo intervención de la EABZ, se efectuó recuperación del pavimento el 18 de abril. Por lo anterior, se resalta cierre del caso expuesto.	06_Junio-2024
II TRIMESTRE	04_Abril-2024	77	Para EABZ – Zona 1, se recibió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da trámite por intervención en la calle 107 con carrera 65 en el Barrio Babilonia, quiproteca se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Figueroa se reagrupa caso a la Alcaldía Local de Suba.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	Alcaldía Suba	Danielo	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	En sesión 17, el IDU indica que no se reportó avance ni respuesta. En sesión 17, el IDU informa que, si la EABZ mediante oficio 31-33000, De 2024-14000 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba. El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de Aseo Urbano de Bogotá EASUB, contrato de verificación, a la dirección: Calle 107 con Carrera 65, Suba, Bogotá D.C., Colombia . En sesión 18, EABZ - Zona 1 - Juan Carlos López informa que el caso 87 lo está atendiendo el área operativa.	05_Mayo-2024
II TRIMESTRE	04_Abril-2024	78	Para EABZ – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB rota por control operado por la EABZ con N° 1022400003001021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en esta sector se afectó infraestructura de ETB, después la plaza superior disminuyó y las cámaras desplazadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran vulnerables, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	ETB	14 - Abril 25 de 2024	EABZ - Red Matriz	Nadia Roldán	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen los diferentes entidades y/o sus contratistas.	Aja	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	En sesión 18, EABZ - Zona 1 - Juan Carlos López informa que el caso 87 lo está atendiendo el área operativa. En sesión 18, EABZ - Zona 1 - Juan Carlos López informa que el caso 87 lo está atendiendo el área operativa. En sesión 18, EABZ - Zona 1 - Juan Carlos López informa que el caso 87 lo está atendiendo el área operativa.	05_Mayo-2024
II TRIMESTRE	04_Abril-2024	79	Para EABZ – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, inspección y reparación de canalización de Telefonía, que fue afectada en intervención realizada por la EABZ para instalación de tubería.	MOVISTAR	14 - Abril 25 de 2024	EABZ - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen los diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	Pendiente	05_Mayo-2024
II TRIMESTRE	05_Mayo-2024	80	Se relaciona con el oficio DOU2024000548771, correspondiente a derecho de petición que fue trasladado por una lupa telefónica en una cámara instalada en la carrera 39 N° 62 al sur, una vez recibida la visita se observa que la infraestructura no es de EBT, sino de la EABZ.	ETB	15 - Mayo 02 de 2024	EABZ - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	En esta 16 EABZ Zona 4 informa que, realizó la investigación de la caja de registro qué regula tapa, se observó que no se proyectaba de la EABZ, y no tiene infraestructura de la empresa. Por tanto, se emite un comunicado por internet, y como tal deberíamos realizar el debido mantenimiento, se verificó que desde la representación de la EABZ que tiene asignada la petición sea dada respuesta de fondo.	05_Mayo-2024
II TRIMESTRE	05_Mayo-2024	81	Para LMV, se informó desde el área de conservación que llegó comunicación donde se indica que la LUERMV había realizado instalación de carpentado de obra fresca y reemplazamiento de magnesia pasiva frente al CIV 10007845 – PK 0107360, en la calle 88 entre carrera 103A y carrera 104, lo que quiere decir que el registro está rodeado interiormente por el contrato de conservación T782 de 2021.	IDU	15 - Mayo 02 de 2024	LMV	Humberto Ramiro Gómez	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	En esta 16 Humberto Ramiro Gómez afirma que la LUERMV realizó carpentado frente al CIV 10007845 – PK 0107360, en la calle 88 entre carrera 103A y carrera 104, sin embargo, se efectuó desplazamiento del estado público, la Gerencia de Intervención respondió el aspecto, hubo algunos daños en adyacencias, pero fueron reemplazados.	05_Mayo-2024
II TRIMESTRE	05_Mayo-2024	82	Para VANTI, se recibió información que sobre este mismo contrato (AC 80) entre carrera 103 y carrera 104A, en el coboso norte hubo un interevento en el CIV 10007845 – PK 010602, se hizo interevento por emergencia en vez de gas natural affectingo tuberías zona intervenida por contrato de conservación T782 de 2021.	IDU	15 - Mayo 02 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insauty	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	En esta 17, VANTI - Mario Insauty: En caso 82 se gestiona a través del ingeniero Mauricio del área de mantenimiento, se informa que hubo reposición del estado público, se realizó registro fotográfico.	05_Mayo-2024
II TRIMESTRE	05_Mayo-2024	83	Para IDU, se le envió informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayaquena con calle 10 (contrato 154 de 2016) que los servicios combis	EABZ - Zona 5	15 - Mayo 02 de 2024	IDU	Cristóbal Segura	ATENDIDO	29 - Agosto 08 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen los diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	La Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, por medio del memorando 20240380023773 de respuesta, aclarando la situación actual en la A. Guayaquena con respecto al sustento, se anexa memorando y se solicita cerrar el caso.	08_Agosto-2024
II TRIMESTRE	05_Mayo-2024	84	Para IDA, se solicita cierre de pozo de ventilación N° 2790 del contrato de obra 270 de 2022.	Alcaldía Antonio Narváez	16 - Mayo 09 de 2024	IDA	Karen Bajarano	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	Karen Bajarano: Informa que se realizó verificación del pozo, encontrando que fue hecho el 12 de noviembre de 2022, al cual se usó aplicativas las disposiciones de la Resolución Técnica 1257 de 2021. Por otro lado, se observa que no hay nada de información cargada a esta pól, por lo cual la solicitud de cierre no es posible, se deben cargar las verificaciones de disposición final y aprovechamiento de acuerdo con el anexo 1 de la licitación mencionada previamente. Finalmente, de acuerdo con el informe respaldado de la finalización del contrato se subió por 24 de mayo 2024 se realizó registro fotográfico para la intervención.	05_Mayo-2024
II TRIMESTRE	05_Mayo-2024	85	Para EABZ – Zona 2, se solicita en la carrera 24 diagonal al caso 45 (h 5) verificación de redes que puedan estar generando daño sobre estructura de pavimento.	IDU	16 - Mayo 09 de 2024	EABZ - Zona 2	William Javier Perraes	ATENDIDO	19 - Mayo 23 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen los diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4e6c6d7f74004000?open=1&lang=es&from_view=detail&from_tab=content	En sesión 16, EABZ - Zona 2 - William Javier Perraes informa que está semana se hizo revisión de los trabajos de instalación ocidental, se verificó la correcta instalación del sistema de drenaje, se verificó la correcta instalación de las cámaras, en desarrollo de los acuerdos con la mencionada, se descarta que el funcionamiento que está dando el sistema se encuentre afectado, alguna falta de la infraestructura de la red de alcantarillado, exactamente de la conexión de la EABZ con la EABZ.	05_Mayo-2024
II TRIMESTRE	05_Mayo-2024	86	Para IDU se le envió a presentar un informe con la Alcaldía Ciudadante con Tránsito 17 por vía de la Inspección de											

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N.º DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	N.º. SEÑÓN PRESTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N.º. SEÑÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVO
I TRIMESTRE	06. Junio-2024	109	Para ENEL, se solicita respuesta de la petición remitida respecto del contrato 1-072400-1000 de 2021 de ENEL, teniendo en cuenta que aún no se ha emitido pronunciamiento, el radicado de la comunicación es 01711756.	EAAB	20 - Junio 06 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	25 - Julio 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de catálisis y andenes sobre las vías principales y colectoras de la media vía de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=1 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=2 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=3 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=4 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=5 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=6 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=7 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=8 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=9 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=10 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=11 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=12 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=13 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=14 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=15 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=16 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=17 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=18 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=19 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=20 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=21 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=22 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=23 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=24 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=25 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=26 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=27 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=28 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=29 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=30 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=31 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=32 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=33 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=34 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=35 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=36 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=37 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=38 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=39 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=40 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=41 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=42 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=43 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=44 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=45 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=46 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=47 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=48 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=49 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=50 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=51 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=52 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=53 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=54 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=55 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=56 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=57 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=58 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=59 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=60 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=61 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=62 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=63 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=64 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=65 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=66 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=67 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=68 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=69 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=70 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=71 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=72 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=73 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=74 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=75 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=76 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=77 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=78 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=79 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=80 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=81 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=82 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=83 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=84 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=85 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=86 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=87 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=88 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=89 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=90 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=91 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=92 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=93 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=94 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=95 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=96 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=97 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=98 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=99 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=100 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=101 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=102 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=103 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=104 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=105 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=106 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=107 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=108 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=109 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=110 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=111 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=112 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=113 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=114 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=115 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=116 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=117 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=118 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=119 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=120 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=121 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=122 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=123 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=124 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=125 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=126 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=127 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=128 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=129 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=130 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=131 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=132 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=133 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=134 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=135 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=136 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=137 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=138 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=139 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=140 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=141 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=142 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=143 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=144 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=145 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=146 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=147 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=148 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=149 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=150 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=151 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=152 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=153 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=154 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=155 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=156 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=157 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=158 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=159 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=160 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=161 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=162 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=163 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=164 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=165 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=166 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=167 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=168 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=169 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=170 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=171 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=172 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=173 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=174 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=175 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=176 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=177 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=178 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=179 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=180 https://repositorio.enel.com.co/handle/documento/130064776?sequence=181 https://repositorio.enel.com.co/h		

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

RESPUESTA RADICADO IDPC No. 20245110033732

Ing. Residente Juan Pablo <residente17975@gmail.com>

Mar 30/07/2024 18:48

Para:correspondencia_salida@idpc.gov.co <correspondencia_salida@idpc.gov.co>

CC:MELBA INGRID CARO CIFUENTES <melbcarc@etb.com.co>;CONTROL PROYECTO <controlproyecto17975@gmail.com>;Karenn Cepeda <direccion17975@fibernet.com.co>

 1 archivos adjuntos (2 MB)

Informe Final 4440054.pdf;

Buen día,

En respuesta al Radicado IDPC No. 20245110033732, a continuación encontrarán adjunto Informe final 4440054 de ejecución de actividades ubicado en la Cr43#13-24, CUNI, la cual consistió en el realce de aro tapa de camara ETB.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente.

--

La información contenida y transmitida en este correo electrónico y/o cualquiera de sus anexos es dirigida para uso exclusivo del destinatario y puede contener información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es el destinatario, queda enterado de que la divulgación, copia, distribución, retransmisión o el uso de los contenidos de este mensaje están prohibidos.

Reporte Acta 27 25 julio 24- Numeral 5.2

CARMEN ROCIO LOPEZ LOPEZ <carmlopl@etb.com.co>

Jue 08/08/2024 7:56

Para:mhsilva <mhsilva@movilidadbogota.gov.co>

CC:Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>;jaime.bermudez <jaime.bermudez@idu.gov.co>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

RESPUESTA RADICADO IDPC No. 20245110033732; OFICIO SDM 202461202590872 (2) - IDU 20243010035401.pdf;

Martha buenos días:

En respuesta al requerimiento efectuado en la sesión 27 del comité celebrado el pasado 25 de julio/24, referido a la entrega del informe final al IDPC correspondiente a la intervención por emergencia autorizada en la carrera 43 N°. 13-24, de manera se remite el correo mediante el cual, el contratista Fibernet remitió al correo IDPC (correspondencia_salida@idpc.gov.co) el informe final.

Cordialmente,

CARMEN ROCIO LOPEZ LOPEZ

PROFESIONAL I

EQUIPO CONSTRUCCION Y GESTION CONVENIOS

VP TECNOLOGÍAS

 6012422762 |  3057001932

 Salitre, Cra 52 44C-55 | Piso 2 | Bogotá - Colombia



Los correos recibidos no implican respuesta inmediata si son enviados fuera de la jornada laboral, en cumplimiento con la Ley 2191 de desconexión laboral

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de ETB. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridad_informatica@etb.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information ETB. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply. If you have received this e-mail transmission in error, please inform us at seguridad_informatica@etb.com.co and erase it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

Bogotá D.C., 30 de Julio de 2024


REFERENCIA: Contrato No. 4600017975 cuyo objeto es la ejecución de obras civiles de expansión, renovación, mantenimiento de redes e infraestructura y modernización de la red de acceso en Bogotá D.C., Gran Bogotá, Cundinamarca, Meta y regiones definidas del país.

ASUNTO: Informe Final Recuperación de Infraestructura RC 4440054

FIBERNET TELECOMUNICACIONES S.A.S. Realiza entrega de informe final ante la secretaria de Movilidad del proyecto en mención que consistió en la limpieza de cámara, realce de aro y tapa esto teniendo en cuenta que se encontraba en mal estado y se requería con urgencia debido al riesgo que representa a peatones y vehículos que transitan por el sector, el proyecto se ubica en la KR 33No 13-24 en la zona de PUENTE ARANDA, el cual se debía ejecutar para la verificación de obstrucciones y garantizar la continuidad y ampliación de FFTH.

Para lo cual, **FIBERNET TELECOMUNICACIONES S.A.S** presenta a continuación:

- Descripción de los trabajos ejecutados.
- Registro fotográfico



1014261332

JUAN PABLO BOCANEGRA VILLALOBOS
Ing. Residente Cont. 4600017975
3002880269
residente17975@gmail.com

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Instalación de Señalización



Corte y Demolición de placa 1mx1mx0.15m



Instalación de varilla (Estrella de david)



Aplicación Sika Dur 32



Recuperación área en concreto acelerado



Instalación de tapa y soldada



Fraguado de la recuperación en concreto



 FIBERNET S.A.S. Empresa Instaladora y Mantenimiento de Redes de Telecomunicaciones		Tipo de documento: FORMATO		PROCESO PRODUCTIVO OP-00-F-002 V.01 27/03/2024 CODIGO: VERSION: FECHA:	
CONTRATO			4600017975		
FECHA:	25/04/2024	PROYECTO	4440054		
DISTRITO	12064	DIRECCION	KR 43 13-24		
				A N T E S	
					
				D U R A N T E	
					
				D E S P U E S	
					



MEMORANDO



STESV
202433600231733
Información Pública
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., AGOSTO 04 de 2024

PARA: **JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ**
Jefe Oficina de Coordinación Interinstitucional

DE: Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA IDU-1540-2018. Construcción de la Avenida Tintal desde la Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta la Avenida Alsacia y la Avenida Alsacia desde El Tintal hasta la Avenida Ciudad de Cali y obras complementarias en Bogotá D.C. Respuesta memorando 202416500225453, información por colmatación de sumideros en calle 10.

Respetado Ingeniero Bermúdez:

En respuesta al memorando del asunto mediante el cual solicita información respecto a: "... se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto...", nos permitimos informar que la construcción de los sumideros construidos a lo largo del corredor vial de la Avenida Guayacanes, así como las obras ejecutadas en las redes pluvial y sanitaria no presentan inconvenientes en su operación y se realizaron en cumplimiento con los diseños aprobados con concepto de NO objeción por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB. Igualmente, se precisa que las obras construidas por el Contrato IDU 1540 de 2018; corredores principales, sumideros, pozos de inspección y las áreas de urbanismo, entre otras, han optimizado el manejo del drenaje de la zona.

Acorde con lo anterior, se aclara que, las afectaciones reportadas han venido ocurriendo desde antes del inicio del proyecto y son independientes a las obras desarrolladas por el Contrato IDU 1540 de 2018, dado que los edificios construidos se encuentran sobre un punto bajo en referencia a los niveles constantes y actuales que maneja el canal La Magdalena; es así que, desde su construcción, no se tuvo en



MEMORANDO



STESV
202433600231733

Información Pública
Al responder cite este número

cuenta dichas alturas, dejando las áreas de las unidades residenciales por debajo de la cota de nivel.

Se aclara que, dentro de la ronda del vallado de La Magdalena que se ubica sobre la calle 9 entre la carrera 88D y la Av. Guayacanes, se encuentra instalado un equipo de Bombeo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB que trabaja constantemente cuando se presentan los eventos de lluvias importantes en la zona, dando como resultado la mitigación de los sucesos, la recirculación de las aguas empozadas de las áreas referidas hacia el canal y colocando bajo el control normal la situación del tráfico

Finalmente se informa que las inundaciones del sector, manifestadas por la comunidad, no están relacionadas con la ejecución del proyecto del asunto, sino con el estado de la red de alcantarillado pluvial de la zona aledaña al proyecto, así como la falta de mantenimiento, la limpieza del canal La Magdalena y las condiciones pre-existentes del conjunto residencial aledaño, se reitera que las inundaciones no son consecuencia de las obras del proyecto Guayacanes sino del estado de las redes de alcantarillado pluvial y del Canal La Magdalena a cargo de la EAAB.

De esta manera, se precisa que el contrato IDU 1540 de 2018, contrario a generar cualquier afectación a la comunidad ha optimizado las condiciones hidráulicas generales del proyecto

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial

Firma mecánica generada el 04-08-2024 09:14:36 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Elaboró: KAREM NOFRED SAAVEDRA BRAVO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: MILDRED ALVARADO PATIÑO – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: LILIANA USECHE RODRÍGUEZ – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

N° CTO	VIGENCIA	TIPO CONTRATO	ENTIDAD	RADICADO DEL FDL O CONTRATISTA	FECHA DE RADICADO	RADICADO ENTIDAD QUE RECIBE	FECHA RAD. ENTIDAD	TIPO DE SOLICITUD	No. PIN	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	RADICADO DE ALCANCE	FECHA RADICADO DE ALCANCE	ESTADO	No DE FACTIBILIDAD CUANDO APLIQUE
FDLUSA-CTO-632-2023	2023	OBRA		RADICADO ALCALDIA 20245120415691	7 DE JUNIO DE 2024	NO CUENTA CON RADICADO POR PARTE DE SDA	No Aplica	CIERRE DEL PIN 24605	24605	SOLICITUD CIERRE DEL PIN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 632-2023 CUYO OBJETO ES : CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL"	No Aplica	No Aplica	En Proceso de revisión de la Secretaría Distrital de Ambiente	No Aplica
FDLUSA-CTO-292-2023	2023	OBRA		RADICADO ALCALDIA 20245120493511	10 DE JULIO DE 2024	NO CUENTA CON RADICADO POR PARTE DE SDA	No Aplica	CIERRE DEL PIN 24606	24327	SOLICITUD CIERRE DEL PIN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 292-2023 CUYO OBJETO ES : CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52"	No Aplica	No Aplica	En Proceso de revisión de la Secretaría Distrital de Ambiente	No Aplica
FDLUSA-CTO-590-2022	2023	OBRA		RADICADO ALCALDIA 20240021134461	14 de Noviembre de 2023	NO CUENTA CON RADICADO POR PARTE DE SDA	No Aplica	PIN Cerrado Radicado No. 2024EE72402	22362	El PIN 22362 fue Objeto de Cierre	No Aplica	No Aplica	CULMINADO	No Aplica
FDLUSA-CTO-327-2023	2023	OBRA		RADICADO ALCALDIA 20245120525681	24 de Julio de 2024	NO CUENTA CON RADICADO POR PARTE DE SDA	No Aplica	Se remitieron los ajustes solicitados por la Secretaría Distrital de Ambiente a través del Comunicado Radicado No. 2024EE137613 . Se emitió un Oficio de Respuesta notificando que los ajustes ya se encuentran en el aplicativo RCD - Radicado No. 20245120525681	23130	SOLICITUD CIERRE DEL PIN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA No. 327 DE 2023 CUYO OBJETO ES : CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	No Aplica	No Aplica	En Proceso de revisión de la Secretaría Distrital de Ambiente	No Aplica
FDLUSA-CTO-285-2023	2023	OBRA		En Proceso	En Proceso	NO CUENTA CON RADICADO POR PARTE DE SDA	No Aplica	CIERRE DEL PIN 23082	23082	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VEJINALES Y DE BOLSILLO, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.	No Aplica	No Aplica	En Proceso de salida de la Alcaldía Local de Usaquén hacia la Secretaría Distrital de Ambiente	No Aplica
FDLUSA-CTO-536-2023	2023	OBRA		En Proceso	En Proceso	NO CUENTA CON RADICADO POR PARTE DE SDA	No Aplica	CIERRE DEL PIN 24596	24596	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES DE ESCALA LOCAL SOBRE CUERPOS DE AGUA CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ	No Aplica	No Aplica	En Proceso de salida de la Alcaldía Local de Usaquén hacia la Secretaría Distrital de Ambiente	No Aplica

Compromisos 08-08-24 Mesa de servicios públicos IDU - Solicitud delegado asistencia técnica mesa de soterramiento de redes

Jorge Enrique Abreo Reyes <Jorge.Abreo@gobiernobogota.gov.co>

Lun 12/08/2024 18:15

Para:jaime.bermudez <jaime.bermudez@idu.gov.co>;daniel.reino@idu.gov.co <daniel.reino@idu.gov.co>;Jacqueline.Villa <Jacqueline.Villa@gobiernobogota.gov.co>
CC:Jaime Hernando Prieto Alvarez <jaime.prieto@gobiernobogota.gov.co>;Alexandra Mejia Guzman <Alcalde.Chapinero@gobiernobogota.gov.co>; Alba Stella Falkonerth Roza <alba.falkonerth@gobiernobogota.gov.co>;Jairo Esteban Tobon Maldonado <jairo.tobon@gobiernobogota.gov.co>;Juan Carlos Rivera Castro <jrivera@sdp.gov.co>;Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>;Manuel Augusto Calderon Ramirez <manuel.calderon@gobiernobogota.gov.co>

📎 2 archivos adjuntos (20 MB)
08-08-24.rar; TRAMITE ASISTENCIA TECNICA - FORMULACION 2024 - PROYECTO 1734.pdf;

Buenas tardes Ingenieros, un saludo. Espero se encuentren bien. En atención a los compromisos de la mesa de servicios públicos del IDU realizada 08-08-24, y en el marco de los lineamientos establecidos en el decreto distrital No. 168 de 2021; se remite trazabilidad de las gestiones realizadas por el FDLCH para la asistencia técnica del proceso de formulación para la vigencia 2024 del proyecto 1734; incluyendo la relación de respuestas recibidas por entidades del Distrito, empresas de servicios públicos y prestadores de servicios de redes de telecomunicaciones, para los fines pertinentes.

Lo anterior, aclarando que, la entidad ha tenido en cuenta durante el proceso de formulación las disposiciones contenidas en la Ley 1682 de 2013 *“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias”* y sus decretos reglamentarios, que establecen procedimientos para coordinar con las Empresas de Servicios Públicos y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la remisión de información precisa de redes existentes, necesidades de protección y traslado de redes, diseños de protección y traslado, ejecución y responsabilidades para asumir costos de redes de servicios públicos existentes dentro del límite de un proyecto de infraestructura de transporte.

Así las cosas, inicialmente, se requiere el apoyo interinstitucional con la **confirmación de designación de profesionales para la asistencia técnica**, por parte de las Entidades, ESP y PSRT que faltan por complementar o dar respuesta; con el objetivo de poder convocar a una mesa de trabajo en el FDLCH para la presentación del proyecto.

No radicado FDLCH	Fecha	Entidad	No. Respuesta	Datos de contactos del delegado
20245220291861 20245220291871 20245220291881 20245220291561 20245220282441 20245220352711 - En trámite de firma	18-06-2024 14-06-2024 01-08-2024	IDU – Dirección Técnica De Inteligencia De Negocio E Innovación DTINI – Dirección Técnica de Proyectos DTP - Dirección Técnica De Administración De La Infraestructura DTAI – Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura DTCI Reservas Alcance	20245210066782 20245210069972 -	edgar.comas@idu.gov.co - diego.mejia@idu.gov.co lari.penuela@idu.gov.co
20245220291891	18-06-2024	IDU – Oficina De Coordinación Interinstitucional OCIT - Mesa de Soterramiento Redes	SIN DELEGADO	Delegado en Mesa de Servicios Públicos: daniel.reino@idu.gov.co

20245220291571	18-06-2024	CAR	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA
20245220291581	18-06-2024	CLARO COLOMBIA	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA Delegado en Mesa de Servicios Públicos: nicolas.andrade@claro.com.co
20245220291591	18-06-2024	EAAB	20245210075362	jegonzalez@acueducto.com.co
20245220291601	18-06-2024	ENEL CODENSA	20245210073082 20245210073822 20245210074062 20245210079772 20245210080172	sergio.suarez@enel.com
20245220291611	18-06-2024	ETB	20245210074422	carlos.bermeoc@etb.com.co
20245220291621	18-06-2024	JBB – Jardín Botánico de Bogotá D.C.	RESPUESTA PARCIAL 20245210071562	NO REGISTRA
20245220291631	18-06-2024	IDECA	20245210073802	hbernal@catastrobogota.gov.co - ymorales@catastrobogota.gov.co
20245220291641	18-06-2024	IDIGER	RESPUESTA PARCIAL 20245210071432 20245210076452	NO REGISTRA
20245220291651	18-06-2024	IDPC – Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA
20245220291681	18-06-2024	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP (MOVISTAR)	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA Delegado en Mesa de Servicios Públicos: jpena@optecom.com.co
20245220291701	18-06-2024	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA
20245220291721	18-06-2024	SDA – Secretaria Distrital de Ambiente	RESPUESTA PARCIAL 20245210072402	atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co NO REGISTRA Delegados en Mesa de Servicios Públicos: Helman.gonzalez@ambientebogota.gov.co Yiseth.tello@ambientebogota.gov.co
20245220291731	18-06-	Secretaria Distrital de Movilidad – SDM	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA

	2024	Dirección De Ingeniería De Tránsito: Subdirección De Señalización. Subdirección De Planes De Manejo De Tránsito. Subdirección De Bicicleta Y El Peatón		Delegado en Mesa de Servicios Públicos: mhsilva@movilidadbogota.gov.co
20245220291741	18-06-2024	Secretaria Distrital de Planeación SDP - Mesa de Soterramiento Redes	20245210081622	jrivera@sdp.gov.co - Delegado en Mesa de Servicios Públicos: Pgamez@sdp.gov.co
20245220291751	18-06-2024	TIGO-UNE	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA
20245220291761	18-06-2024	UAECD - Mesa de Soterramiento Redes	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA
20245220291771	18-06-2024	UAESP - Mesa de Soterramiento Redes	SIN DELEGADO UNAL – 20244212417872 20244212417832	NO REGISTRA
20245220291781	18-06-2024	UAERMV	20241200064161 20245210067062 20245210067202	liset.castro@umv.gov.co juan.cruz@umv.gov.co jarrison.murcia@umv.gov.co
20245220291791	18-06-2024	VANTI	20245210069942	hfernandez@grupovanti.com
20245220291801	18-06-2024	UNE-EPM	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA
20245220291811	18-06-2024	GRUPO ENERGIA BOGOTA	RESPUESTA PARCIAL 20245210070582	NO REGISTRA
20245220291821	18-06-2024	METRO	20245210067692	ernesto.sandoval@metrodebogota.gov.co
20245220291841	18-06-2024	Secretaria Distrital de Hacienda SDH - Mesa de Soterramiento Redes	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA
20245220291851	18-06-2024	DADEP	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA
20245220007973	18-06-	Secretaria Distrital de Gobierno SDG - Mesa	SIN RESPUESTA	NO REGISTRA

	2024	de Soterramiento Redes	
--	------	---------------------------	--

Adicionalmente, en el marco de la Comisión Intersectorial de Servicios Públicos y la Mesa de Soterramiento de Redes; se requirió a las entidades que participaron en dicho espacio, **información sobre el estado actual del proceso de definiciones y/o actualizaciones del decreto No. 555 de 2021,** específicamente, a las entidades del distrito Secretaria Distrital De Hábitat, Secretaria Distrital De Planeación, Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital, Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos; y a La Secretaria Distrital De Gobierno; dada la dificultad de efectuar un cruce de cuentas o suscribir convenios directos con Empresas de Servicios Públicos; especialmente con ENEL CODENSA desde la Alcaldía Local de Chapinero; además de las restricciones para la intervención de redes o infraestructura que pertenece a los activos de las ESP, como el riesgo eléctrico, y el mismo alcance del proyecto 1734; con el fin de dar claridades a las situaciones administrativas, que, actualmente se encuentra en definición por parte de las Entidades del Distrito; con el motivo de poder lograr la ejecución de los diseños existentes en el banco del FDLCH, desarrollados en el contrato No. 90 de 2018; los cuales, fueron aprobados por ENEL CODENSA, y las demás ESP y PRST.

Si bien, según el decreto No. 555 de 2021, el componente de obra civil de redes secas, que incluye sistema de cárcamos, cajas y cámaras de servicios públicos, entre otros elementos, dentro de los cuales se instalan las redes eléctricas, de telecomunicaciones y elementos tecnológicos que requiera la ciudad en el marco de las ciudades y territorios inteligentes será diseñado y construido, por la entidad distrital que desarrolle los proyectos de infraestructura en el espacio público; Las redes, cableado y equipo serán instaladas, tendidas y mantenidas por parte de las empresas de redes de los servicios públicos y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, para lo cual, y con el objeto que se optimice el uso del espacio público y se agilice la coordinación para la ejecución integral de estos proyectos de infraestructura, la administración distrital establecerá las reglamentaciones específicas para su coordinación y administración, y podrá definir condiciones y medidas de aprovechamiento económico en el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público.

Una vez recibido el Borrador Decreto Reglamentación Art 222A - POT 555 del 2021, *“Por medio del cual se reglamenta y actualiza la norma técnica y urbanística relacionada con el soterramiento de redes y sus excepciones, la organización de redes aéreas, y la postería de los servicios públicos domiciliarios y las tecnologías de la información y las comunicaciones, en la ejecución integral de proyectos de infraestructura ubicados en espacio público de Bogotá D.C., en los términos señalados en el artículo 222A del Decreto Distrital 555 de 2021 y se dictan otras disposiciones”*; donde se indica de forma textual: **Las Empresas de Servicios Públicos y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y otras, deberán aprovechar la ejecución del proyecto de Infraestructura de espacio público para el encuentro y para la movilidad para coordinar el soterramiento, armonizando la instalación de sus redes con las demás redes de servicios públicos y los otros componentes del proyecto de infraestructura. Los costos derivados del soterramiento deberán ser asumidos por los propietarios u operadores de los respectivos servicios públicos. Estos corresponden a costos directos y asociados al soterramiento y retiro de infraestructura soporte de las redes aéreas;** se enviaron observaciones el pasado 24/05/24; para lo cual, se recomienda que, a través del delegado para la asistencia técnica por parte de la mesa de soterramiento de redes, se aclaren los lineamientos, procedimientos o tiempos tentativos de definición, toda vez que los costos asociados a los activos que pertenecen a terceros, según el borrador, deben ser asumidos por los mismos (ESP y PSRT).

Se recomienda, una vez se reactiven las mesas de trabajo de soterramiento de redes, sea convocado el FDLCH; teniendo en cuenta lo determinado en el artículo 3 del POT, **se convocará a representantes de los gobiernos locales;** con el fin de poder analizar desde el punto de vista técnico y jurídico las actuaciones que se deban realizar, para poder lograr la ejecución de los E&D que contemplan subterranización de redes en el sector DG 76 Bis.

Por consiguiente, quedamos atentos del nombre del delegado por parte de la Oficina De Coordinación Interinstitucional OCIT del IDU y de la Secretaria Distrital de Gobierno para las mesas de trabajo que convocara la entidad.

Agradeciendo su colaboración y tiempo.

Cordialmente,



Logo

Jorge Enrique Abreo Reyes

Profesional contratista Infraestructura - FDLCH

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000www.gobiernobogota.gov.co

Logo

Jorge Enrique Abreo Reyes*CONTRATISTA***Secretaría Distrital de Gobierno**

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000www.gobiernobogota.gov.co[facebook](#)[twitter](#)[Flickr](#)

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente
