

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 30 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 15 de agosto de 2024

HORA: 07:30 am a 8:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Liliana Chaparro	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Bertha Liliana Torres M.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sandra Palacios Sanabria	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sara Juliana Delgado	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Yira Bolaños Enríquez	Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E)	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-26014

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nicolás Andrade Duque	Profesional Claro Colombia	Claro Colombia	X		
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Fernando Cruz	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416
Alexandra Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Mauricio García	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Diego Caballero Rojas	Profesional FDL de San Cristóbal	Alcaldía Local de San Cristóbal	X		
Jaime Andrés Silva Gómez	Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E)	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP	X		Profesional encargado por vacaciones de la Dra. Yira Bolaños.
Magda Dávila	Profesional FDL de Santa Fe	Alcaldía Local de Santa Fe	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (29 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión N°. 30 de 2024.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión treinta (30) del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa

de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de San Cristóbal y Santa Fe, a continuación, se inicia su participación:

3.1 Alcaldía de San Cristóbal – Diego Caballero Rojas:

- **Caso 157 (nuevo):** Se trae a la mesa de trabajo un proyecto del barrio “Nueva Gloria” que se encuentra relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue reservado por el IDU para intervención del tipo reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para atención prioritaria por emergencia, petición que fue aprobada.
El segmento efectivamente fue intervenido con maquinaria amarilla en la zona más crítica, sin embargo, teniendo en cuenta que el IDU va a excluir el segmento, y este se encuentra bastante afectado en su totalidad y es bastante largo.
La Alcaldía Local propone intervenir el segmento completamente, pero se solicita que el IDU entregue los estudios y diseños que se hicieron para el tramo vial, o se informe si los diseños iban a ser ejecutados por el contratista. De esta manera se incluirá dentro del contrato de conservación que se está formulando, y que próximamente se publicará para contratación.
Se estarán enviando las reservas viales al IDU de este próximo proyecto, por lo cual se solicita también información de contacto, para agilizar y hacer seguimiento a este proceso.

Intervención IDU – Liliana Torres: Se revisará el tema al interior del Instituto, se dará respuesta de manera pertinente a la Alcaldía Local.

En adición, se envía al chat de Google Meet la información de contacto para hacer seguimiento al tema de las reservas cuando sea radicado por el Fondo.

3.2 Alcaldía de Santa Fe – Magda Dávila:

Se informa que no se tienen temas pendientes para presentar en este espacio de coordinación. Se agradece la invitación a la mesa de trabajo.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (29 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 08 de agosto de 2024, correspondiente a la sesión número 29 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se presentaron observaciones.

También se menciona, que **el acta 27** se encuentra publicada en la página Web de la Secretaría Distrital de Planeación, mientras que **el acta 28** se encuentra en trámite de firma en el IDU. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
3	01/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
4	08/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
5	15/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
6	22/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
7	29/02/2024	X	X	X	X	3-2024-11328	21/03/2024	Publicado en página web.
8	07/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
9	14/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
10	21/03/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
11	04/04/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
12	11/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
13	18/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
14	25/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16391	8/5/2024	Publicado en página web.
15	02/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18159	27/5/2024	Publicado en página web.
16	09/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18601	06/06/2024	Publicado en página web.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
17	16/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
18	23/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
19	30/05/2024	X	X	X	X	3-2024-20615	20/6/2024	Publicado en página web.
20	06/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21201	28/6/2024	Publicado en página web.
21	13/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21311	28/6/2024	Publicado en página web.
22	20/06/2024	X	X	X	X	3-2024-22571	10/7/2024	Publicado en página web.
23	27/6/2024	X	X	X	X	3-2024-23136	10/7/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE II	X	X	X	X	3-2024-26366	2/8/2024	Publicado en página web.
24	04/07/2024	X	X	X	X	3-2024-24411	22/7/2024	Publicado en página web.
25	11/07/2024	X	X	X	X	3-2024-26764	2/8/2024	Publicado en página web.
26	18/07/2024	X	X	X	X	3-2024-27253	2/8/2024	Publicado en página web.
27	25/07/2024	X	X	X	X	3-2024-28146	15/8/2024	Publicado en página web.
28	01/08/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En proceso de firma en el IDU.

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la ingeniera Bertha Liliana hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 SDA – Sandra Palacios:

Se informa que la plataforma de correos electrónicos de la Secretaría Distrital de Ambiente está en mantenimiento durante más o menos doce días, por lo cual no se tendrán habilitados los correos electrónicos.

De tal manera, se solicita remitir las actas o los soportes de casos a los correos personales.

Respuesta SDP – Paola Gámez: Se indica que no hay inconveniente, y se solicita escribir dirección de correo electrónico personal en chat para enviar información correspondiente a la mesa de trabajo, hasta tanto se tenga sistema en SDA.

5.2 ETB – Carmen Rocío López:

Se solicita cerrar **caso 122***, teniendo en cuenta que el día 08 de agosto de 2024 se remitieron soportes de gestión, en los cuales se emitía respuesta de fondo a la Alcaldía Local. (*Se adjunta a la presente acta documentación).

Respecto del **caso 128** se informa que realizada visita de campo, no se observan cámaras sin tapa, por lo cual se solicita efectuar cierre.

5.3 SDP – Paola Andrea Gámez Tabimba:

Se solicita cierre del **caso 152**, relacionado con delegación de funcionario para trámite de socialización adelantado por el FDL de Chapinero en torno a la declaratoria de espacio público del CIV 2001250.

5.4 EAAB – Zona 5 – Javier Patiño:

- **Caso 158 (nuevo):** Para ENEL, en la Av. Ciudad de Cali con calle 69B sur, se observa como unos cables ingresan a pozo de alcantarillado y los mandan por la red, se solicita verificar, para que se proceda a su retiro. Es importante mencionar, que al pozo no se le puede poner tapa porque los cables impiden asegurarla, generando un riesgo.

5.5 Movistar – Jolgilio Peña:

- **Caso 159 (nuevo):** Para ENEL, se remite reporte de tapa en mal estado en la calle 15 # 9-23 coordenadas 4.602832,-74.075433. Se solicita recuperación de infraestructura.

NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:

Se informa vía chat de WhatsApp cierre de los siguientes casos: **caso 56** y **caso 154**.

Se remite correo electrónico con solicitud de cierre del **caso 132**, se adjunta soporte a la presente acta.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4	Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se	EAAB – Red Matriz	IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector		
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.
23	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.	IDU	Intervención IDU – Angélica López en acta 06: Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.
25	Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	EAAB - Zona 1	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
26	Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07: Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB. IDU- Onisalba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU, que la EAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como desvío la misma Avenida y que en ese sentido los huecos, posiblemente se han generado por esos desvíos sin que sean exactamente intervenciones como tal para las obras que se adelantan.
28	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.	MOVISTAR	Pendiente
29	Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.	EAAB - Zona 1	Pendiente
36	En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva. Observación FDL - 26 de mayo: Corrección de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio público costado norte.	EAAB - Zona 1	Pendiente
39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.	EAAB - Zona 2	Acta 22, EAAB – Zona 2 – Wilson Porras: Para dar continuidad al caso 39 se debe realizar inspección con CCTV, desafortunadamente en este momento el equipo se encuentra fuera de servicio, actualmente se está a la espera de los repuestos para su reparación, y continuar con las actividades programadas en este sector. Se remite el 24/06/2024 registro fotográfico de sectores sobre carrera 4 que ya tuvieron recuperación de espacio público.
43	Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	ENEL COLOMBIA	Sesión 11 - ENEL – Mauricio Arenas: Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Observación FDL - 26 de mayo: Se están adelantando las gestiones y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.
47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.	ENEL COLOMBIA	En sesión 21, se reitera el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL CODENSA, donde se requiere instalación del barraje necesario para la energización del parque en el cual ya se encuentran terminadas las obras requeridas y solicitan a ENEL la instalación para poder liquidar el contrato ya que este no es posible sin que el parque tenga la iluminación verificada. Ya se ha notificado a ENEL desde agosto del 2023, pero no han obtenido respuesta. Intervención ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Respecto a la energización del parque, indica que ENEL fue a hacer la revisión de la obra encontrando que las cámaras tienen las tapas soldadas por lo que no fue posible la inspección de la ductería, ni realizar las respectivas validaciones que la compañía debe hacer, se solicitó al área encargada si es posible desoldar para hacer la revisión y realizar la energización lo más pronto posible. Indica que la energización se realiza de una subestación localizada en un conjunto residencial pero que en los documentos aportados no llegó la carta de autorización para obtener el ingreso al conjunto para poder hacer la revisión y la energización cuando corresponda.
49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.	ENEL COLOMBIA	En sesión 21, se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzú el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, en donde se había identificado que el problema era un tema con el medidor. Respuesta ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Se solicita de igual manera revisar el tema a las 2:00 pm.
53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras: Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq. Carmen Rocío López a Juan Carlos López.
54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	EAAB - Zona 2	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	Alcaldía Kennedy	Pendiente
77	Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.	Alcaldía Suba	En sesión 19 IDU indica, se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.
78	Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	EAAB – Red Matriz	Caso reportado desde 2023. Nubia Riaño informa en sesión 14: Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos. SESIÓN 28: ETB - Carmen Rocío López informa: El Ingeniero Juan Fernando solicita escalonamiento al comité, teniendo en cuenta que no ha sido posible agendar una reunión con la Ingeniera Nubia Riaño, ya que se han enviado correos de fecha 18 y 25 de junio para retomar la reparación de la cámara del sector de la calle 26 con avenida carrera 68, sin respuesta alguna. Intervención EAAB – Red Matriz – Nubia Riaño: Se está reprogramando la visita con el área de mantenimiento, en el transcurso de esta semana se comunicará agendamiento. Se toma nota del número de celular del ingeniero de ETB para realizar contacto.
79	Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.	EAAB - Zona 3	Pendiente
91	Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.	ENEL COLOMBIA	Pendiente

Nº.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
92	Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).	VANTI GAS NATURAL	Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García: Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.
95	Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	En acta 19, IDU señala que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.
97	Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.	MOVISTAR	En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña: Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.
98	Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
108	Para VANTI, con referencia a los casos 81 y 82, de acuerdo con lo informado por el área de conservación las situaciones presentadas sobre la AC 80 no fueron recibidas a conformidad por parte de la interventoría y el contratista, por lo tanto, se solicita visita de campo con delegados de UAERMV y VANTI con Ingeniero Sergio Alejandro Díaz quien integra el equipo de apoyo a la supervisión del contrato 1782 de 2021.	VANTI GAS NATURAL	Acta 21, De IDU se informa que con referencia a los casos 81 y 82, no se han llevado a cabo los recorridos requeridos a VANTI y UAERMV, por parte de la UMV hoy se remitió la información de contacto del Ingeniero Carlos Castaño, quién obra como gerente de infraestructura urbana de la Unidad de Mantenimiento Vial. Desde la OCIT se transmitió la información al Ingeniero Sergio Díaz, quién es apoyo a la supervisión del citado contrato, entonces se espera coordinar prontamente dicha reunión. Respecto de VANTI, se informa por parte de la supervisión que hoy se realizará recorrido. Acta 22: Con referencia a los casos 81 y 82, el ingeniero Sergio Alejandro Díaz del Área de Conservación informó que el 13 de junio realizaron los recorridos con VANTI y UAERMV. Con la UAERMV se dejó el compromiso que serían reparadas las afectaciones y que iniciarían el día lunes y terminarían el día miércoles. Para el caso de VANTI, se levantó acta de inspección y quedó el compromiso que en un lapso de 15 días hábiles estarían culminando los arreglos de las zonas que habían sido afectadas.
111	Para Movistar, se solicita respuesta de la petición con radicado 20240419105915900 del 24 de abril de 2024.	MOVISTAR	Pendiente
112	Para IDU, presenta situación pendiente relacionada con la construcción del cable aéreo San Cristóbal del contrato IDU 1167 de 2023, para su ejecución se tuvieron que demoler en cada estación 2 manzanas, las estaciones objeto de consulta son “La Victoria” y “Altamira”, donde se demolieron predios, pero el IDU no ha generado cierre de las cuentas contrato, de las mismas se está contabilizando consumo. Por lo anterior, se solicita al IDU pronunciamiento, y que como se ha requerido realice los cierres de las cuentas.	IDU	Durante el día 06 de junio de 2024, el Ingeniero Álvaro Reinoso remite correo electrónico a la Dirección Técnica de Predios informando la situación presentada sobre el sector, para realizar la debida suspensión del servicio. Acta 23 - EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: Se solicita información al IDU respecto de la petición de suspensión de servicio sobre manzanas que fueron adquiridas mediante compra de predios para construcción de proyecto de cable aéreo. Acta 23 - IDU – Álvaro Reinoso: Se remitió correo informando el caso el 06 de junio, no obstante, se

Nº.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			continuará gestión con profesional Mateo Grajales, a su vez Liliana Torres puede generar un apoyo escalando tema a interior del IDU.
114	Para EAAB-Red Matriz, se solicita visita técnica de la EAAB en la Avenida Ciudad de Villavicencio con calle 65 sur (se requiere verificar dirección) teniendo en cuenta que se presentan empozamientos posiblemente por causa de las redes, y este corredor vial fue intervenido hace poco mediante contrato de conservación IDU.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
115	Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.	EAAB - Zona 2	Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público.
116	Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	EAAB – Red Matriz	En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.
123	Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de "paz y salvo".	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
124	Para ENEL, se solicita reposición de tapas de cajas de inspección, las cuales fueron reportadas a la ESP mediante consecutivo 657851 del 23 de noviembre de 2023	ENEL COLOMBIA	Acta 23 - ENEL – Jorge Mauricio Arenas: Se toma nota del número de radicado y se verificará internamente, ya que la reposición de tapas es un tema de atención urgente por la generación de posibles accidentes. Se remite vía chat información de contacto para comunicarse directamente con profesional del Fondo de Desarrollo Local.
127	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una solicitud en la calle 162 entre carrera 54 y 55, donde se evidencia un posible daño de redes, se solicita realizar visita conjunta.	EAAB - Zona 1	Pendiente
134	Para EAAB, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, hay unas cajas en algunos tramos donde se está ejecutando que requieren intervención, por lo cual se solicita acompañamiento técnico de la ESP, al momento se ha intentado realizar contacto con el Ingeniero Mauricio Mahecha sin que se haya logrado gestionar, se han programado visitas sin llegar a realizarse.	EAAB - Zona 1	Pendiente
135	Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	MOVISTAR	Pendiente
136	Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a	EAAB - Zona 2	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.		
137	Para EAAB-Zona 3, se reporta en la carrera 13A N°. 23-81 socavación en la vía, falla de la carpeta asfáltica y estructura de soporte, debido a posible fallo de colector de aguas residuales, se evidencia pérdida de material en dicha estructura.	EAAB - Zona 3	UAERMV - Humberto Ramírez - Sesión 25: Para EAAB-Zona 3, se solicita atención de la carrera 13A con calle 23, se relaciona con requerimiento ciudadano para atender hueco generado sobre calzada, una vez realizada la visita se colige que puede relacionarse con atención de fallo sobre redes de alcantarillado, por lo cual se verificó y al parecer EAAB intervino, no obstante, aún se requiere recuperación de calzada.
138	Para EAAB-Zona 1, se presenta socavación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 12, costado sur, en el área aferente se observa pozo del sistema de alcantarillado, es posible que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección y de ser el caso, la debida atención de la EAAB.	EAAB - Zona 1	Pendiente
139	Para EAAB-Zona 3, la situación fue reportada a través de redes sociales, se localiza en la calle 22 con carrera 14 (Avenida Caracas), en donde se puede visualizar a través del registro fotográfico, falla en la estructura de pavimento posiblemente por socavación, se solicita visita de campo de la EAAB para verificar, y para que con el diagnóstico completo de la situación se tomen las decisiones pertinentes en aras de garantizar la seguridad vial en el sector.	EAAB - Zona 3	Pendiente
140	Para EAAB-Zona 1, respecto de la reparación realizada por la EAAB en la calle 134 con carrera 19, se realizó reparación de red sanitaria, no obstante, aún se requiere recuperación de espacio público, se solicita la debida gestión.	EAAB - Zona 1	Pendiente
142	Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.	VANTI GAS NATURAL	Acta 26: Alexandra Rojas solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.
143	Para EAAB-Zona 3, se solicita apoyo para adecuación de collarín de cobre en el CIV 16004474, del barrio San Francisco. Así mismo, se aclara que el Ingeniero Francisco siempre ha sido muy presto en apoyar y atender a los llamados del Fondo de Desarrollo Local.	EAAB - Zona 3	Pendiente
145	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender hundimiento reportado en la AC 3 frente a placa 51A-10.	EAAB - Zona 3	Pendiente
146	Para EAAB-red matriz, se reporta daño en la carrera 70C (Avenida Ciudad de Villavicencio) con calle 63 sur, se solicita verificar estado de redes.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
147	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.	EAAB - Zona 3	Pendiente
148	Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y generar las medidas pertinentes para atender daño.	EAAB - Zona 2	Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras: Se realiza verificación frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado lateral occidente, en línea con red. Se verifica pozo aguas abajo en la KR 16A con calle 79 y se encuentra drenando con normalidad, se verifica pozo aguas arriba en la KR 16A con calle 78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad.
149	Para UAERMV, caso reportado en el chat de WhatsApp del comité el día 29 de julio de 2024, se relaciona con hueco en la calle 8B N°. 80C-09, barrio Castilla, el cual presenta alto riesgo para la comunidad, se solicita su atención.	IDU	Acta 28 - EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: Se informa que, verificado el sector, no hay daño de redes asociado a deterioro de calzada. Acta 29 - 5.2 UAERMV – Humberto Ramírez: La UAERMV hizo visita, en la misma se verificó que dicho sector fue intervenido por el IDU en enero 16

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			de 2023, por lo cual se requiere verificar garantías, se solicita reasignar caso.
150	Para EAAB-Zona 3, caso reportado en el chat de WhatsApp del comité el día 30 de julio de 2024, se relaciona con recuperación del espacio público por intervención de redes en la calle 24 #7-18.	EAAB - Zona 3	Acta 28 - Intervención EAAB-Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez: Se informa que cuenta con aviso EAAB N°. 1002156533 y se encuentra programado para recuperación.
151	Para SDA, corresponde a un permiso silvicultural, a pesar de que algunas intervenciones son sobre calzada, y son de conservación, se requirió este trámite en marzo, contando con respuesta hasta julio. A la fecha se subsanó lo requerido y se está a la espera de la expedición del permiso para dar apertura a los frentes de obra. Se relacionan los siguientes radicados: 2024ER66489, 2024ER102985 (BTE 2601262024) y 2024ER152450.	SDA	Acta 29 - Intervención SDA – Sandra Palacios: Se verificó en el sistema, encontrando que la solicitud se encuentra en trámite, por tanto, se gestionará internamente con la subdirección de silvicultura.
153	Para ENEL Colombia, el contratista hizo una solicitud de traslado de dos postes ubicados en la mitad de la calzada, en el sector Mariscal Sucre, teniendo en cuenta que el límite de la intervención corresponde a los CIV 2001977 y 2001969, por lo cual se requiere comunicación y colaboración de ENEL, teniendo en cuenta que ya se pagó la factura desde el 18 de junio, pero no se ha programado la maniobra. Se relacionan los siguientes consecutivos: 00731057, 00816096 y 611181811.	ENEL COLOMBIA	Acta 29 - Intervención ENEL – Mauricio Arenas: Se solicita confirmar número de oferta y remitir soporte a correo electrónico para realizar seguimiento y gestionar al interior de la ESP. Se remite vía chat de la reunión, la dirección de e-mail para recibir información correspondiente.
155	Para IDU, respecto de la demolición de predios en proyectos IDU, se requiere avanzar con el cierre de las cuentas contrato, previamente se había expuesto en el caso 112, no obstante, no es exclusivo de cable aéreo San Cristóbal, sino de otros dos proyectos (Transmilenio AK 68 – Avenida Congreso Eucarístico y, sobre la Avenida Caracas). Para el caso 112, algunos avances se han dado, pero no ha sido posible gestionar con otros proyectos, por lo anterior, se solicita realizar mesa de trabajo entre EAAB (Dirección Comercial) e IDU (Dirección Técnica de Predios).	IDU	Pendiente
156	Se informa que se tienen pendientes cierre de pines con la Secretaría Distrital de Ambiente, por lo cual remitirá al correo de la profesional Sandra Palacios la información pertinente para que apoye la gestión al respecto. Se adjunta correo al acta. Número de pines: 24605, 24327, 22362, 23130, 23082 y 24596.	SDA	Se remitió correo el 08 de agosto de 2024 con archivo que relaciona pines ambientales y su estado.
157	Se trae a la mesa de trabajo un proyecto del barrio "Nueva Gloria" que se encuentra relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue reservado por el IDU para intervención del tipo reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para atención prioritaria por emergencia, petición que fue aprobada. El segmento efectivamente fue intervenido con maquinaria amarilla en la zona más crítica, sin embargo, teniendo en cuenta que el IDU va a excluir el segmento, y este se encuentra bastante afectado en su totalidad y es bastante largo. La Alcaldía Local propone intervenir el segmento completamente, pero se solicita que el IDU entregue los estudios y diseños que se hicieron para el tramo vial, o se informe si los diseños iban a ser ejecutados por el contratista. De esta manera se incluirá dentro del contrato de conservación que se está formulando, y que próximamente se publicará para contratación. Se estarán enviando las reservas viales al IDU de este próximo proyecto, por lo cual se solicita también información de contacto, para agilizar y hacer seguimiento a este proceso.	IDU	Intervención sesión 30 IDU – Liliana Torres: Se revisará el tema al interior del Instituto, se dará respuesta de manera pertinente a la Alcaldía Local. En adición, se envía al chat de Google Meet la información de contacto para hacer seguimiento al tema de las reservas cuando sea radicado por el Fondo.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
158	Para ENEL, en la Av. Ciudad de Cali con calle 69B sur, se observa como unos cables ingresan a pozo de alcantarillado y los mandan por la red, se solicita verificar, para que se proceda a su retiro. Es importante mencionar, que al pozo no se le puede poner tapa porque los cables impiden asegurar la tapa, generando un riesgo.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
159	Para ENEL, se remite reporte de tapa en mal estado en la calle 15 # 9-23 coordenadas 4.602832,-74.075433. Se solicita recuperación de infraestructura.	ENEL COLOMBIA	Pendiente

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
-Casos presentados	159	100,00%
-Casos resueltos al corte	102	64,15%
-Casos pendientes al corte	57	35,85%

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver seis (06) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 56, 122, 128, 132, 152 y 154, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver seis (06) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 56, 122, 128, 132, 152 y 154, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, especialmente ENEL, EAAB – Zona 1 y EAAB – Zona 3.	

8 COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 22 de agosto de 2024
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 22 de agosto de 2024

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 22 de agosto de 2024

9 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número treinta **(30)** del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 22-agosto de 2024 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,



JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
PRESIDENTE


PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA


- Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba– SDP.
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.
William Fernando Chávez – IDU.
Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.
- Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 30 de 2024.
2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 30 de 2024.
3. Soporte cierre caso 122.
4. Soporte cierre caso 132.
5. Soporte cierre caso 152.

Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO


Número de casos registrados por mes

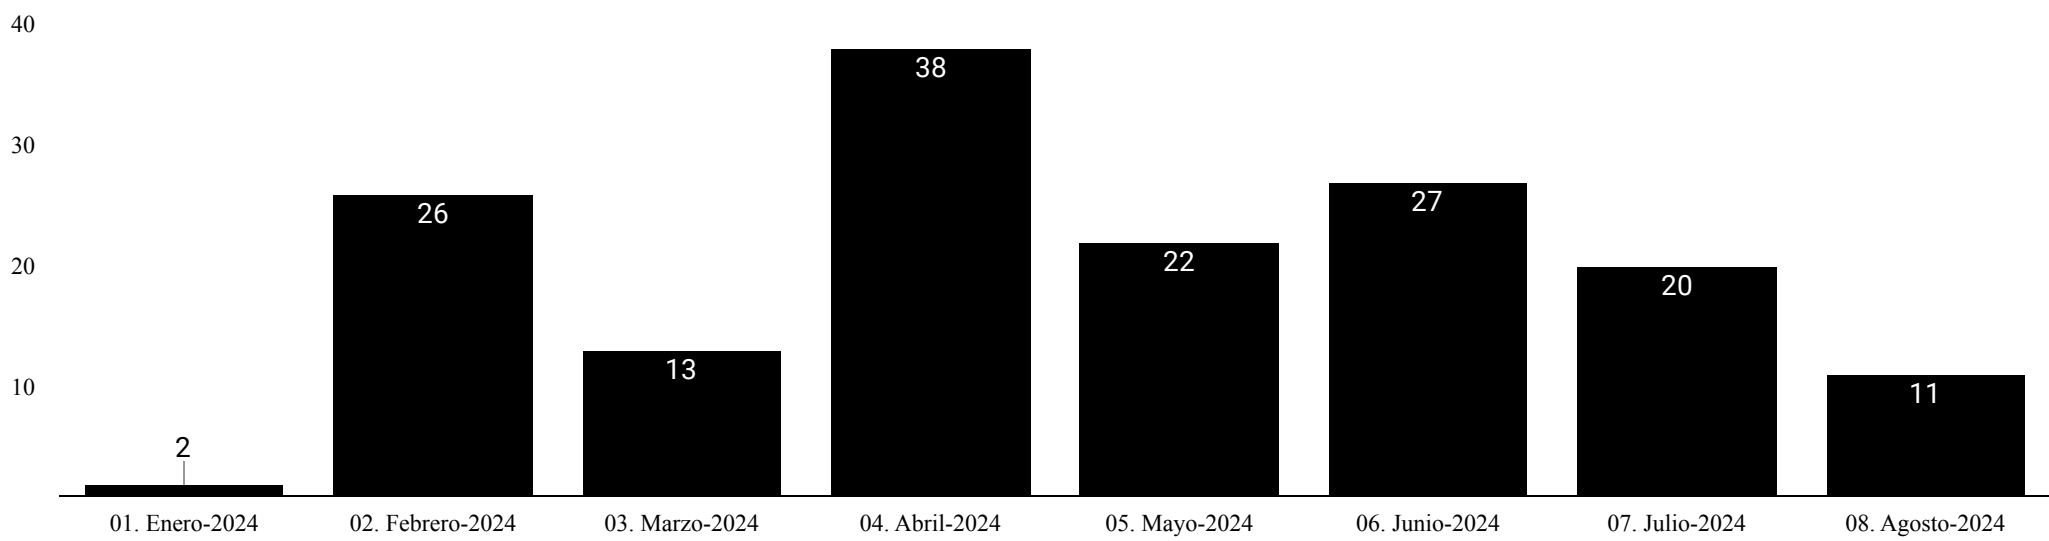

Número de casos resueltos por mes

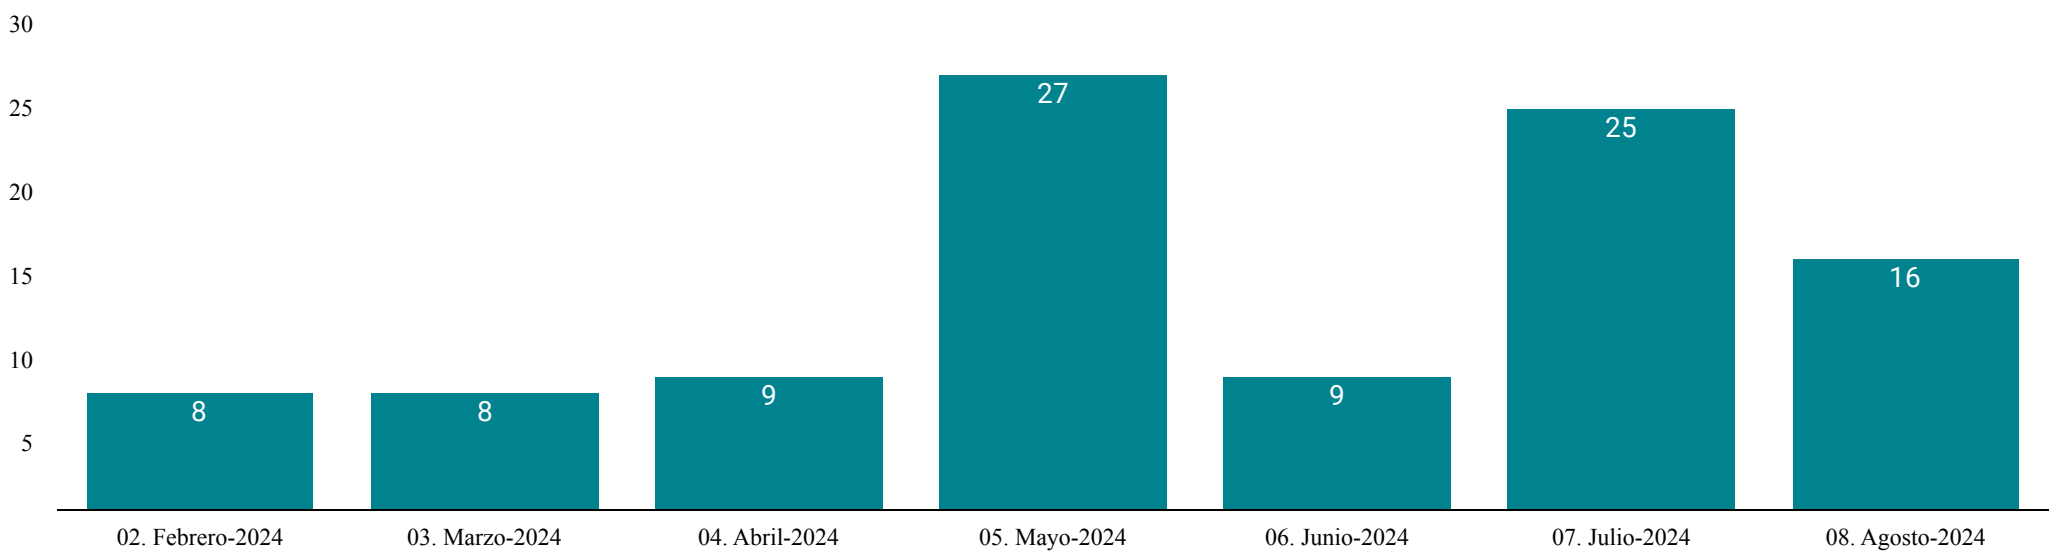

Número de casos pendientes por mes

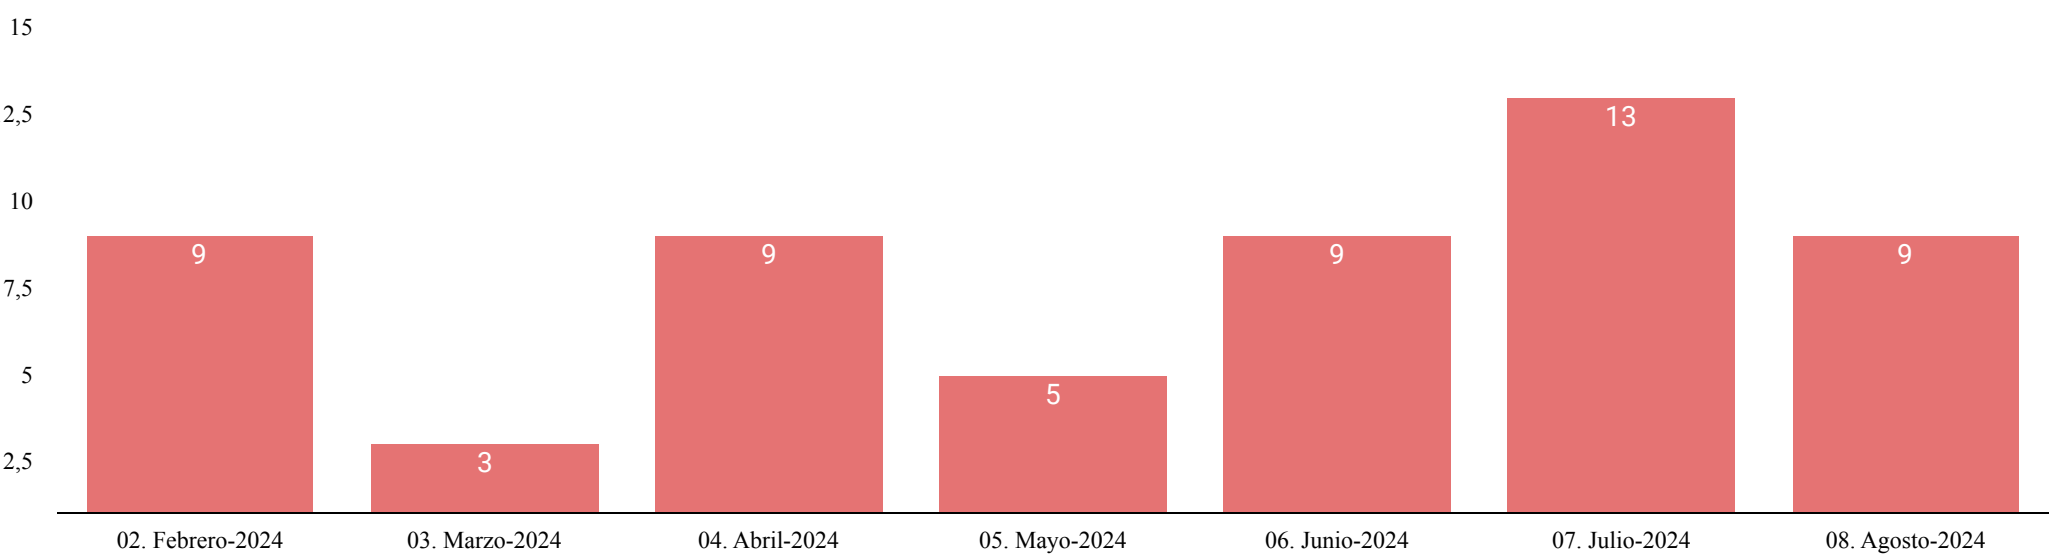


Recuento de casos

Nº. DE CASO	MES REP...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	ESTADO DEL CASO
1	01. Enero-2...	Para ENEL, se solicita que se revis...	ENEL COLOMBIA	Alta	ATENDIDO
2	01. Enero-2...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
3	02. Febrero-...	Se informa sobre las afectaciones ...	IDU	Normal	ATENDIDO
4	02. Febrero-...	Para la EAAB – Red Matriz, se ex...	EAAB – Red Matriz	Alta	PENDIENTE
5	02. Febrero-...	Para la EAAB, en la CL 28 con K...	IDU	Alta	ATENDIDO
6	02. Febrero-...	Para el IDU, solicita reunión para t...	IDU	Normal	ATENDIDO
7	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, En Carrera ...	EAAB - Zona 5	Normal	ATENDIDO
8	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
9	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
10	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo...	EAAB - Zona 4	Normal	ATENDIDO
11	02. Febrero-...	Para ENEL, en la calle 13 por Carr...	ENEL COLOMBIA	Normal	PENDIENTE
12	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
13	02. Febrero-...	Para Alcaldía de Puente Aranda, se...	Alcaldía Puente Aranda	Normal	ATENDIDO
14	02. Febrero-...	Se solicita realizar revisión con un...	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
15	02. Febrero-...	Para ETB, en la calle 47 con carrer...	ETB	Alta	ATENDIDO
16	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero...	EAAB - Zona 3	Normal	ATENDIDO


Casos registrados

159

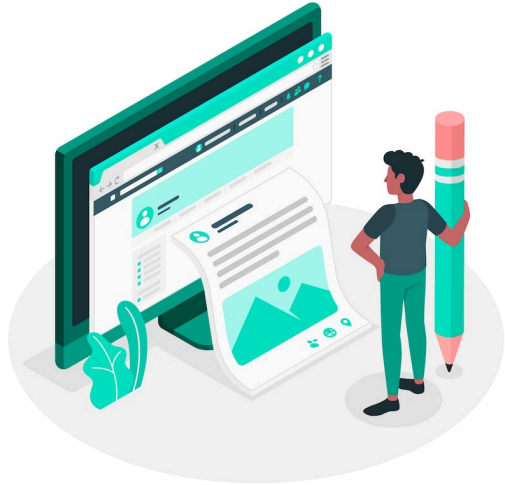

Nº. Casos Resueltos

102

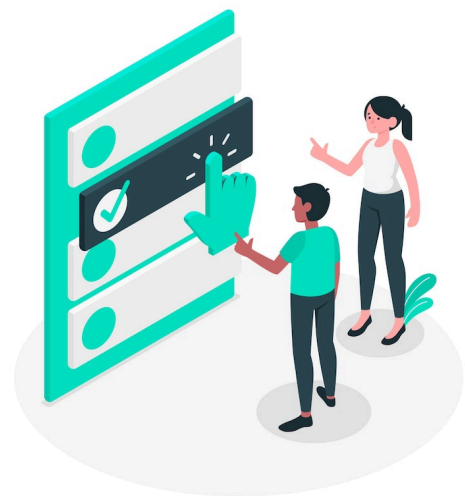

Nº. Casos Pendientes

57




Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

Porcentaje de avance

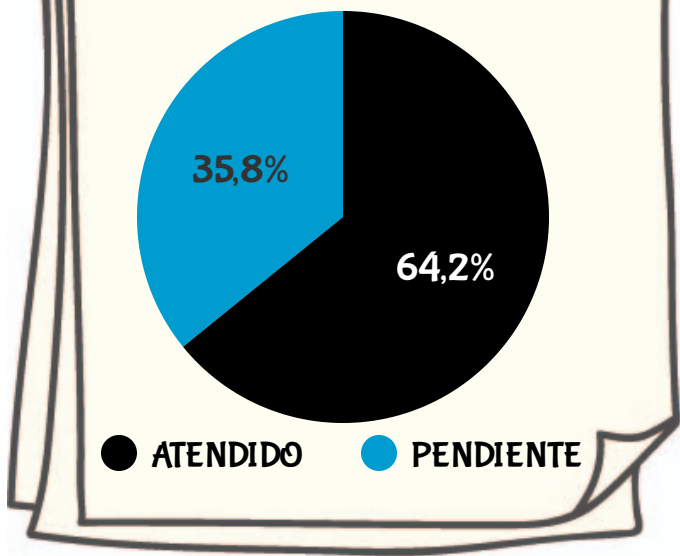

TOP – Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	32
2. IDU	20
3. EAAB - Zona 2	14
Total	158


TOP – Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	21
2. IDU	14
3. EAAB - Zona 4	9
Total	101


TOP – Entidades con casos pendientes

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	11
2. EAAB - Zona 1	8
3. EAAB - Zona 3	7
Total	57

Número de casos registrados por mes

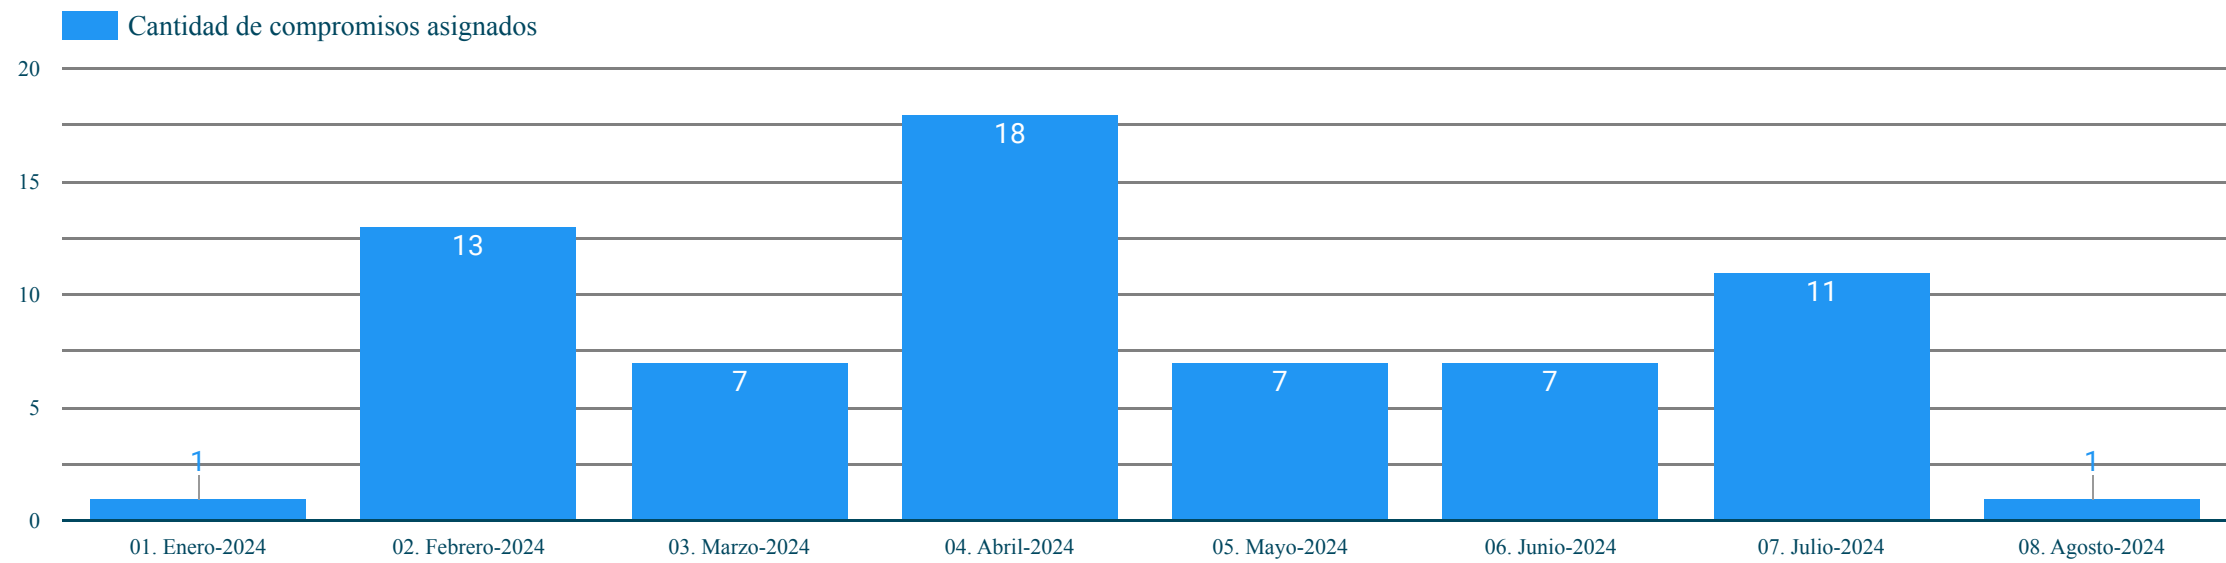


Número de casos por zona o área pendientes

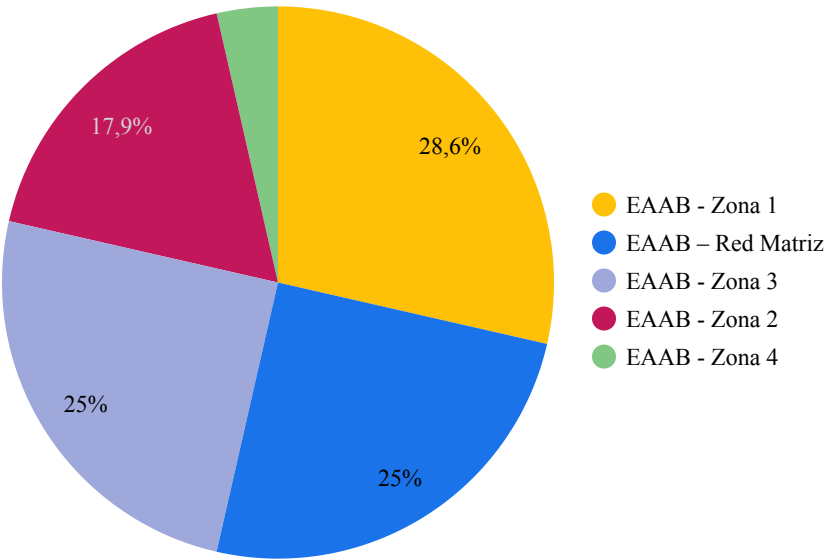

ESTADO DEL...	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.
ATENDIDO	18	Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?
ATENDIDO	106	Para EAAB – Zona 2, sobre la calle 85 con carrera 15 se solicita recuperación de espacio público.
ATENDIDO	101	Para EAAB-Zona 3, se recibe derecho de petición N°. 000013183802 relacionado con afectación de cámara ETB. Se realizó visita a la carrera 47 # 22-83 para identificar un daño ocasionado por un contratista de la EAAB a la cámara de la Empresa, dejándola en riesgo de accidente para los peatones. En visita del viernes 24 de mayo el personal contratista negó su identificación y el




Número de casos registrados por mes

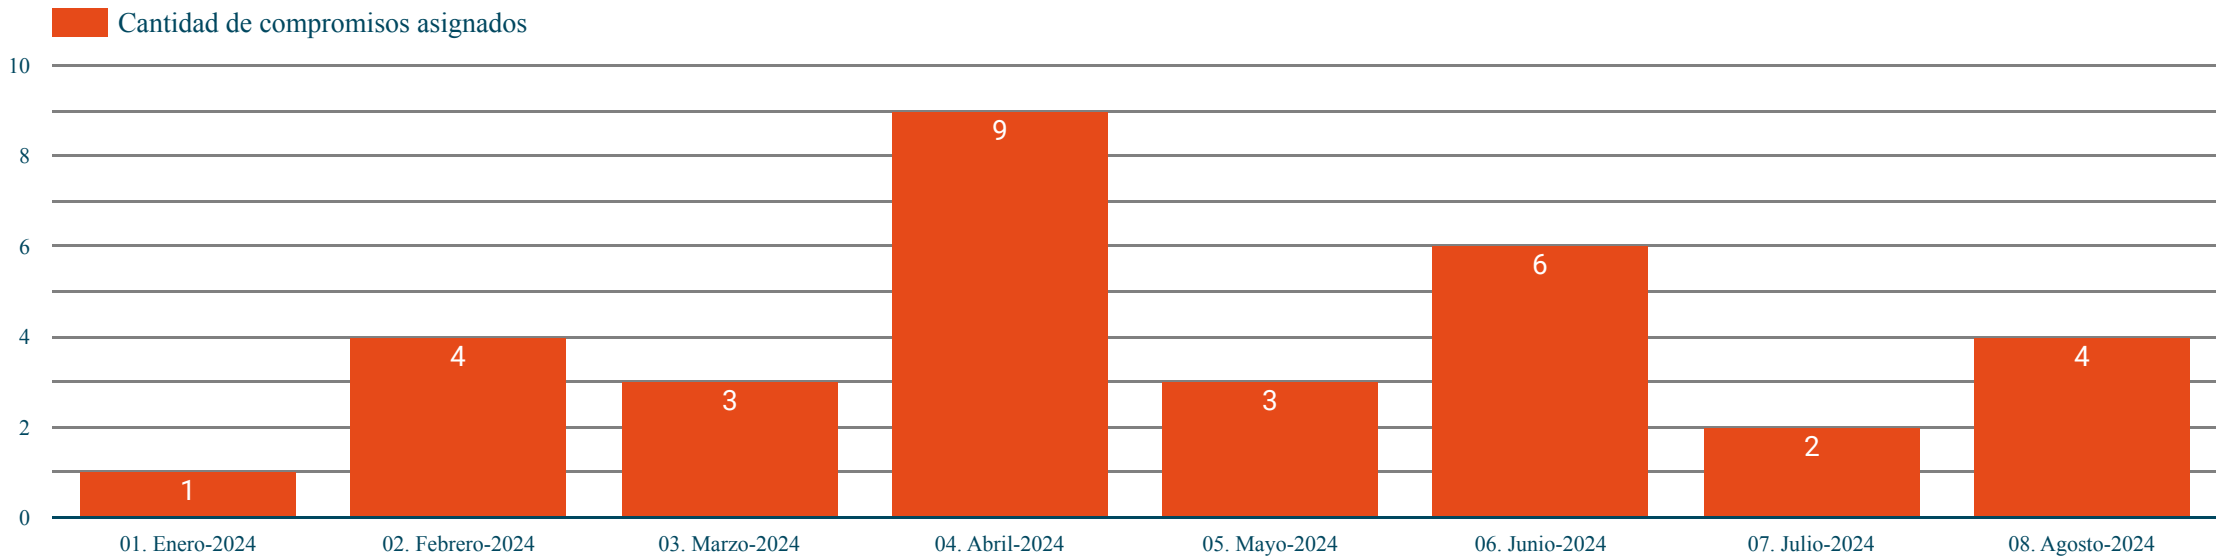

ESTADO DEL CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	120	Se informa afectación sobre la Calle 80 N°. 69H-20, que de acuerdo con reporte recibido se ubica infraestructura de la ESP – Enel Colombia SA ESP, por lo cual, se solicita recuperación de calzada y realizar acciones pertinentes.
ATENDIDO	46	Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de “paz y salvo” para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700708.
ATENDIDO	133	Para ENEL, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se tiene referencia de un poste con alta inclinación en el barrio Salitre. La comunidad, el contratista y la interventoría han solicitado varias visitas técnicas, sin embargo, la respuesta de ENEL es que no existe riesgo, ya que la infraestructura se encuentra dentro de los parámetros.
ATENDIDO	34	El CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado “diseño local”, se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continua o se puede levantar, en caso de haber ejecutado ya actividades, se solicita indicar a IDU levantamiento de la reserva.
ATENDIDO	89	Para ENEL, se solicita aprobación de punto de conexión radicado mediante consecutivo 1500476372 del 10 de abril. Se precisa que se obtuvo factibilidad, pero que se espera aprobación de diseño para continuar con el trámite de aprobación integral del proyecto ante el

Número de casos registrados por mes

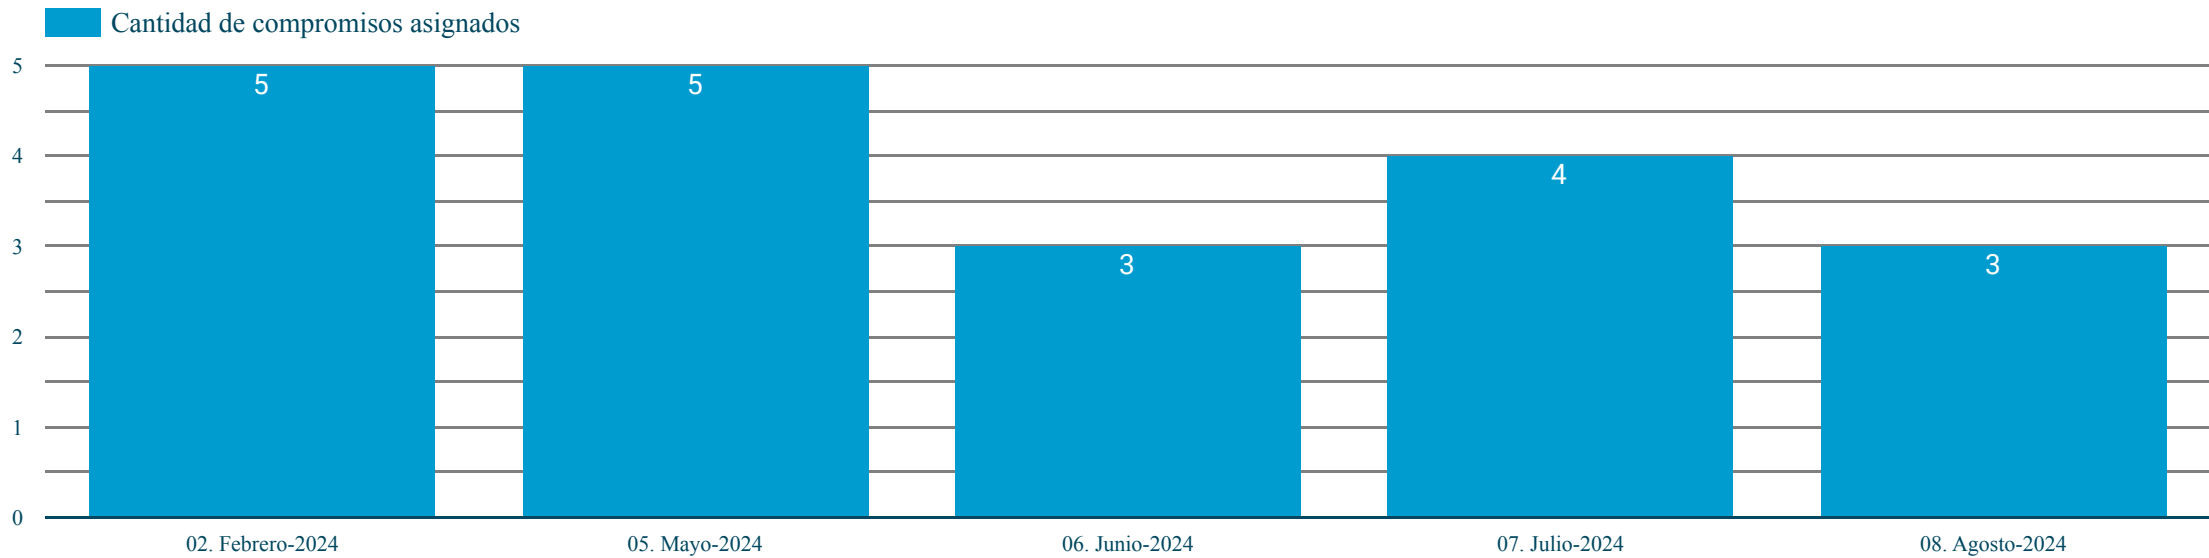

ESTADO DEL CASO ▴	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.
ATENDIDO	3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.
ATENDIDO	83	Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra esta finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.
ATENDIDO	86	Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio "El Paraíso", que por remodelación se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRORCIONAZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	1	Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 82, se presenta un desperio importante respecto a la seccante de la vía, la cual afecta la movilidad y la seguridad vial. A su vez, se solicita que este tema los lleven a la Mesa Operativa de Montevideo, y allí no se obtiene respuesta, por lo cual se trae a la actual instancia de coordinación, por lo cual, se solicita a Oscar Escobar (delegado de ENEL) que envíe respuesta y realice los gestiones pertinentes para solucionar este caso.	IDU	02 - Enero 25 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	11 - Abril 4 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Pendiente desde 2023 ENEL - Mauricio Arenas informa en sesión 10: En lo relacionado a las cámaras de la NQS, se envió a la empresa instalada que se ejecutó el permiso por parte de secretaría de movilidad, para que hasta el momento, el conograma sigue considerando para darle inicio a los obras, el 27 de marzo de 2024.	04. Abril-2024
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	2	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 418 sur 74-65 en el barrio Trinita - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la EISP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	IDU	02 - Enero 25 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	08 - Marzo 07 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Ingeniero Javier Patiño informa en sesión 08: Se efectuó inspección de CCTV en el sector, no se encontraron problemas estructurales en redes, por lo cual, se concluye que se encuentran trabajando en condiciones normales. Por lo tanto, se descarta hardware producto del sistema de alertamiento. Por lo cual, se recomienda que se programe una intervención por parte de otra Entidad, como Alcaldía o UAERMV, se dejó video de CCTV a su disposición.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcantarillas, están generando estos conflictos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se realice mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.	ETB	03 - Febrero 1 de 2024		Jaime Bermudez	ATENDIDO	25 - Julio 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caladas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Alvaro Roldán en sesión 3 informa: En respuesta a la solicitud de ETB respecto a daños en las obras IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETB que informe en escritos sobre y que dichos se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETB para dar respuesta.	07. Julio-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	4	Para la EAAB – Red Matiz, se expone un daño grave en la Av. Villaseca entre Cl. 62B y Cl. 62C cabecera oriental, debido a filtraciones al pasar en una cámara de la red matiz "Barroco – Cuadrante" de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1607 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructura. Solicito revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMF o el IDU reparen en el sector.	UMV	03 - Febrero 1 de 2024	EAAB – Red Matiz	Nubia Riano	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	IDU – Aracely Tatiana López Figueroa en sesión 6: Se reabre pronta atención por parte de EAAB-Red Matiz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Consejo de Regencia, por lo cual, se solicita respuesta oportuna en la Asesoría Villaseca entre Cl. 62B y Cl. 62C.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	5	Para la EAAB, en la Cl. 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedó sin reparar. Se solicita pronta acción.	UMV	03 - Febrero 1 de 2024	IDU	Ornelisa Segura	ATENDIDO	28 - Agosto 01 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Acta 04-2024: EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Sin embargo, la división de redes realizó revisión de esta sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respectivamente de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.	08. Agosto-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	EAAB - Zona 4	03 - Febrero 1 de 2024	IDU	Alvaro Roldán	ATENDIDO	28 - Agosto 01 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Acta 04-2024: EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez.	08. Agosto-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	7	Para EAAB – Zona 5, En Camara 79 (ex Primer de Mayo) por Calle 63 a ex CIV 800846, poco de daño en el mismo y convertido en depósito de basuras afectando la movilidad. Registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Acta 6 - 2024 - Respuesta EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: En el caso 7 de la Asesoría Primer de Mayo, se efectuó la verificación en terreno y se observó personal de ETB trabajando, se solicita hacer el respectivo direccionamiento a esta Entidad.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	8	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 por Camara 550, se observa hueco en pavimento al pasar originado en daños y/o filtraciones que presenta la infraestructura de la EISP, registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Matachea	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	EAAB Zona 1 reportó mediante el chat de WhatsApp atención del caso 08, por lo cual se da cierre en sesión 17.	01. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	9	Para EAAB-Zona 1, en cámara 11 entre calles 135C y 138 hubo intervención de la EAAB encontrándose pendiente la recuperación de la carpeta asfáltica, registro fotográfico enviado al chat el lunes 5 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB – Zona 1	Mauricio Matachea	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Se informa atendido.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Pápero Quiroga, TV 73P con Cl. 49 Sur, barrio La chuvia, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo limitado en audio de redacción RCI enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta solamente pago de un trabajador de mayor experiencia.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Pendiente, IDU informa: Que el ingeniero Juan Carlos López remitió registro fotográfico donde se realizó atención de la situación presentada sobre la vía Pápero Quiroga. EAAB solicita apoyo a la UAERMV para que se efectúe reparación de pavimento. UAERMV - Humberto Ramirez indica en sesión 6: Se expone cronología y se realiza una serie de comentarios en torno a la situación que se presentó en el sector, actualizándose la UAERMV se encuentra efectuando las evaluaciones correspondientes sobre el tema, al no haberse alcanzado el acuerdo.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	11	Para ENEL, en la calle 13 por Camara 680 estructura raja de redes sean con afectación obstruye el paso en andar obstruyendo peajes a las transacciones, enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Concomitante, se solicita a la EISP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	12	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 418 sur 74-65 en el barrio Trinita - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la EISP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB – Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	El pasado lunes 4 de marzo, se realizó la inspección de CCTV (Acto 201738418) solicitada a través del contrato 1462-2023 solicitada de la Calle 418 Sur desde la transversal 74 C hasta la Transversal 74 Bis A encontrando la tubería de 10" en gran estado de deterioro en presencia de infiltración de material, únicamente una domérmica instalada a los 13 metros del punto deteriorado del tramo indicado en el esquema anexo por el Ing. Ferny. Esto nos conlleva que las conexiones que se van sobre la vía NO son diseñadas a la red de alcantarillado.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	13	Para Alcaldía de Puente Arenas, se encontró afectación de la infraestructura de ETB en la Avenida Calle 6 entre las carreras 32 y 40, contacto norte, se observó en el sector canalizaciones afectadas, hoy día, pero no tienen valla. Se solicita contactar con el fondo de desarrollo local para conocer el número del contrato que generó los daños.	ETB	04 - Febrero 8 de 2024	Alcaldía Puente Arenas	Delegado	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Acta 04-2024: IDU indica que se remitió atención de correo electrónico a delegados de la Alcaldía de Puente Arenas de acuerdo con base de datos de la gestión 2023. Acta 05-2024: Se solicita dar cierre, toda vez que no hay delegado en la materia por parte de IDU y que ETB realizará la gestión directamente con la Alcaldía Local.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos críticos de requerimiento.	EAAB	04 - Febrero 8 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	15	Para ETB, en la calle 47 con cámara 7 se reporta fallando de tipo, lo cual puede generar accidentes.	IDU	05 - Febrero 15 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Se informa atendido, se remitió registro fotográfico vía chat.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	16	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero Juan Rivera indica que en la Avenida Caracas con Calle 3 Sur, se solicita apoyo de la UAERMV para recuperación del sector deteriorado por la EISP. Por lo cual, se solicita a la EAAB lo siguiente: transferir la liberación de la reserva que tiene el fondo de desarrollo local de Antonio Nariño, y transferir al PMT.	UMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	06 - Febrero 22 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	UAERMV - Humberto Ramirez informa que se había recibido solicitud de Juan Rivera de la EAAB, para realizar espacio público a raíz de una emergencia. A UAERMV solicitó levantamiento de reserva y PMT apropiado, pero verificado en sitio, se observó que el tramo ya fue pavimentado.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	17	Para EAAB – Zona 2, en la calle 90 con Avenida Ciudad de Cali, se presentó daño en calzada de Transmilenio, el Ingeniero Diego Montero – Gerente del Sistema Masivo solicita apoyo para recuperación de la calzada. Por lo anterior, se solicita a la EAAB se brinde primero con Transmilenio y PMT.	UMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	La calzada fue recuperada el lunes 12 de febrero de 2024 a través del contrato de Recuperación de Espacio Público de la Zona 2. Esta información se compartió en el chat del Comité el día 15 de febrero de 2024.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	18	Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 34 con calle 3, donde se detectó intervención en calada, el respectivo se indaga ¿Si hay alguna información adicional?	UMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	08 - Marzo 07 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2266766	Atendido por Ingeniero Francisco Rodríguez	03. Marzo-2024

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVO
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	19	Para EAB-Zona 1, en la Carrera 58 entre Calle 137 y Calle 1274 se realizaron intervenciones por emergencia, en la cual se presentó afectación de redes de ENEL, quién actualmente está pendiente por atender reparación, no obstante, apenas se realice dicha actividad, se solicita a EABB realizar la recuperación del espacio público.	IDU	06 - Febrero 22 de 2024	EABB - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Respuesta ENEL – Mauricio Arenas en sesión 18: Se informa que el contrato llegó a fines al medio día de ENEL, las mismas por el área jurídica y hoy se realizó conversión al respecto a EABB, no obstante, se informa que por se mantiene conversación con el Gerente de Servicio al Cliente con Mauricio Riano del IDU, hoy se comprometen de pago y de cumplimiento de la obligación, entonces hoy se dio la orden de iniciar las obras, entonces ya se encuentran trabajando. En sesión 19 Informo. Con respecto a la calle 127, las obras empezaron por el sector de emergencia, las obras de emergencia se dio a las 3:30 a.m.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	20	Para UNET-Tipo, se reportó en la Avenida Ciudad de Cúcuta entre Avenida Calle 26 y Avenida La Esperanza, caja de agua que se encontraba en mal estado. Por lo cual, se hizo requerimiento de manera informal.	IDU	06 - Febrero 22 de 2024	TIGO	Delgado	ATENDIDO	06 - Febrero 22 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Alvaro Roldano Informo: El área atendió la solicitud, esta situación se encuentra superada.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	21	Se recomendó a la EABB-Red Matiz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Alvaro Roldano anualmente realizó contacto de la persona con quien se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	ENEL COLOMBIA	06 - Febrero 22 de 2024	EABB – Red Matiz	Nidia Riano	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Intervención IDU – Alvaro Roldano en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EABB para la mejoría de la red matriz de Tallas, se envió desde IDU al contrato del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pide un compromiso a Nidia Riano de la situación, para indicar que se va a comunicar con el Ingeniero Ciro como supervisor del contrato.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Tallas (actualmente Claro) de características 27E, al intentar se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para algar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una excavación por obras con ductos y ya instaló tuberías eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a CJED en el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está controlada para algar los activos de telecomunicaciones, y por lo norma eléctrica? Se solicita sesión en terreno con profesional de ENEL.	CLARO	06 - Febrero 22 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con licencia para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	ENEL – Mauricio Arenas en sesión 06: Se coordinó visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y esta manera se pueda dar solución al caso solicitado.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	23	Para IDU, se informa que a la EABB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barríos Unidos, donde se solicita explicar en otro lugar unos cargan ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NSQ (también llamada calle de los muertos). Debido del punto hay unos cargan, y se requiere retirar de las mismas ya que se observa problema por espacio de tierra e irregularidad, al respecto, se encuentra indicar que la EABB no debe elementos al espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargan son de la contratista que están desarrollando actividades sobre la carrera 95, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1594 de 2018, al cual se le otorgó una licencia de construcción.	EABB - Zona 2	06 - Febrero 22 de 2024	IDU	Angélica Tatiana López Higuera	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Intervención IDU – Angélica López en sesión 06: Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha recibido el Ingeniero Wilson Páez.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	24	Para EABB-Red matiz, se solicitó adecuada recuperación de pavimento sobre la Avenida Boyacá con Calle 72, ya que se pueden presentar accidentes.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	EABB – Red Matiz	Nidia Riano	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	se indica que el 28 de febrero se realizó registro fotográfico de la recuperación del pavimento de esta sector, para lo cual se reportó a la mesa de trabajo como parte de las acciones de coordinación con las empresas de servicio público.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	25	Para EABB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 30, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	EABB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	26	Para IDU, el periodista de RICH Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se caían como mortales, los cuales se encuentran ubicados en las curvas de la Avenida Boyacá en el sector Norte del área de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	IDU	Ornela Segura	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Intervención EABB-Zona 2 – Wilson Páez en sesión 07: Desde zona 2 se han escuchado de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectiva recorrió por el canal central de la Avenida Boyacá, se realizó un corte, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por huecos, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EABB. IDU: Ornela Segura precisa en sesión 08: Se informó el comité interno del IDU, una de las áreas que se están viendo de mantenimiento, donde se está viendo.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	27	Para ENEL, se reportó por parte del concejal Edwin Julián Forero que en la Calle 13 con Avenida Boyacá, bajante al puente, siendo occidental-oriental, se encuentra obstrucción del servicio público, la EABB red matiz indica que la no pertenece a la EABB, se observa cámara abandonada con ductos para canalización.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	25 - Junio 11 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Sesión 09 - ENEL – Mauricio Arenas: En relación con el caso 27 se efectuó levantamiento, efectivamente se encuentran dos cámaras, una es de ENEL, la hace falta la tapa y se espera que hoy se esté reportando. Del mismo, se evidenció huecos que se forman en el área por la remoción del terreno, se solicita hacer visita conjunta con IDU, para programar las acciones que se deban tomar.	07. Julio-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	28	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N° 100A-21 (también conocida como Estación de Bomberos el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de escape de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, el personal Movistar estaba adelantando unas obras entre el mano hospital de Zona 4 y el Colegio Platan Luterio Gómez, cuando generó un levantamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros está la epulación de una tubería de 10" a 16" y que desgraciadamente al ir con las aguas sanitarias, poco a poco se fueron llenando las cámaras cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que entre otras sean sanitarias y consultadas, la EABB cuenta con repuestos de manómetros especiales que pueden realizar un acompañamiento relativo a las ESP.	EABB - Zona 5	07 - Febrero 29 de 2024	MOVISTAR	Jorge Augusto Peña	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de cañales y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Pendiente	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	29	Enlizado al chal al pasado 4 de marzo, relacionado con huecos que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 142 - 31, sentido norte - sur, se realizó por parte de quien reportó huecos el reporte que se presentó para originar en posibles filtraciones procedentes de redes de la EABB-Zona 1.	IDU	08 - Marzo 07 de 2024	EABB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Pendiente	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	30	Para EABB-Zona 4, se presenta en la calle 30B Sur entre carrera 90 Este y carrera 11 Esta, CIV 4094491, hace dos días hubo una fuga muy fuerte y es posible que un colector se lagure, la UERHVI está adelantando actividades en el sector, pero por la cantidad de fuga que ha sido, no es viable. Por lo tanto, se solicita la presencia de la EABB para que se permita su ayuda con la limpieza de las redes, y se verifique si existe algún daño para que la UERHVI pueda seguir interviniendo.	UAEV	08 - Marzo 07 de 2024	EABB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	09 - Marzo 14 de 2024	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Atendido por el Ingeniero Juan Carlos Lopez - Zona 4 - EABB	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	31	Para ENEL, respecto del contrato FOLCH-263 de 2023, el contratista hizo una solicitud de traslado de dos postes ubicados en la vialidad de la ciudad, en el sector Matamoros Sur, teniendo en cuenta que el límite de la intervención corresponde a la CV 2001077 y 2001965, los cuales fueron contactados mediante radicado 138 de 2024 correspondiente de la Interventoría OFC-COP-383-027-18-2024, por lo cual se requiere comunicación y colaboración de ENEL.	Alcalda Chapero	09 - Marzo 14 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de cañales y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Observación FOL-23 de mayo de 2024: PENDIENTE RESPUESTA OFC-COP-383-027-2024, radicado 81118181 del 23/05/2024. Solicitud de verificación en campo TRILADO DE POSTE - ACTIVO QUE PERTENECE A LA COMUNIDAD, se reportó a la zona para su verificación.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	32	Se indica que respecto del contrato 263 de 2023, que tiene que ver con alumbrado público, ya se envió respuesta a la UAEV, donde se general la identificación de puntos de intervención, pero se presentaban por espacio para que esta Entidad pueda efectuar las recolecciones y validaciones correspondientes, y se verifica el fin de necesidad de realizar nuevas licencias, considerando que el alcance del contrato corresponde a infraestructura vial, pero no a espacio público peatonal.	Alcalda Chapero	09 - Marzo 14 de 2024	UAEV	Ysa Beltrán	ATENDIDO	26 - Julio 18 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de cañales y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	En sesión 17, que Ysa Beltrán informó que se realizó reunión de verificación del alumbrado público en la zona, aunque que se está dando cumplimiento al reglamento técnico. No obstante, se envió aludición del edificio vial, por lo cual se verificó que en varios puntos se necesitan coincidir con la Interventoría Distrito de Andenes para autorizar la poda del operador de área Peatonal.	07. Julio-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	33	Para ETB, el contrato FOLCH-142 de 2018 se encuentra en proceso de liquidación, teniendo dentro de su meta crítica el contrato de "gas y calor" de esta ESP, para el caso de ETB, se realizó un informe de validación de datos por el valor acumulado de 500 millones de pesos, donde menciona algunas obstrucciones. Algunas obstrucciones fueron atribuibles al contrato 142, sin embargo, la interventoría presentó un informe con reportes y justificaciones de como estaban las redes existentes al momento de iniciar la intervención, y cuando fueron los incrementos de los profesionales de ETB, la información se radica y socializó ayer con el ingeniero Juan Jiménez en la Alcaldía Local, por lo que se solicita que ETB pueda revisar prontamente estos costos por concepto de datos.	Alcalda Chapero	09 - Marzo 14 de 2024	ETB	Carmen Rodó López	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de cañales y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Se informa gestión al respecto, se reunió diligido de ETB e interventoría del contrato de obra, efectuando reunión sobre argumentos vales intervenciones, se definen puntos que deben ser respondidos. Observación FOL-23 de mayo de 2024: Se realizó comunicación en campo para los valores acumulados por los profesionales designados por ETB. Continúa el seguimiento de los datos.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	34	El CIV 104519, CL 124 entre carrera 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado "diarios luz", se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continúa o se puede levantar, en caso de haber afectado ya actividades, se solicita indicar si IDU levantamiento de la reserva.	Alcalda Usaquén	09 - Marzo 14 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	4. Proponer porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en la medida de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genere a la ciudad la rotura de cañales y/o andenes.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Mediante radicado IDU 202326207722 del 28 de noviembre de 2023, se solicitó levantamiento de reserva.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	35	El CIV 1007294, se una empresa donde se interrumpe el anterior segmento vial KR 20 con calle 134, respecto del proyecto asociado aparece reserva a cargo de ENEL, para desarrollo del proyecto "diarios luz", también con reporte desde el año 2018, se solicita informe estado de la reserva.	Alcalda Usaquén	09 - Marzo 14 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	4. Proponer porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en la medida de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genere a la ciudad la rotura de cañales y/o andenes.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Mediante radicado IDU 202326207722 del 28 de noviembre de 2023, se solicitó levantamiento de reserva.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	36	En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EABB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "reconstrucción del sector", por lo cual se solicita informe estado de la reserva. Observación FOL -26 de mayo: Conexión de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio público colado norte.	Alcalda Usaquén	09 - Marzo 14 de 2024	EABB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	4. Proponer porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en la medida de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genere a la ciudad la rotura de cañales y/o andenes.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494 https://photos.state.gov/libraries/colombia/249494	Pendiente	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITU	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRORCIONAZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	37	Se reportó al Chif el día de hoy 14/03/2024 un caso relacionado con hundimiento en calzada que al pasar tiene su origen en filaciones o fallas en infraestructura de la EABM, se aboca en la Calle 53 por Carrera 87. Para el mismo considerandose se solicita verificación y acciones que se requieran por parte de zona 2.	IDU	09- Marzo 14 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	15- Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Esta solicitud se atendió con trabajos de reparación de 2 conexiones domiciliarias frente al predio de la Calle 83 No. 5-40 solucionando el problema del hundimiento que se presentaba en el sitio. Entre trabajos se realizaron el día 25 de marzo de 2024.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	38	Se reportó a la EABM - Zona 4, fuga fallante en pozo de alcantarillado en el sector de la Avenida Caracas con calle 81 sur - Barrio La Andina - Localidad de Usme.	IDU	09- Marzo 14 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	09- Marzo 14 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Ingeniero Juan Carlos López informa que se repuso fuga	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	39	Se reportó al Chif el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EABM - Zona 2.	IDU	09- Marzo 14 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Acta 19, Wilson Porras informa que se realizó el tema con el equipo de Coordinación Interinstitucional, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se reportó al área correspondiente en analítico o administrado según sea el caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan las actividades. Al día de hoy, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	40	Para el contrato de consultoría COR-242 de 2022, se solicita certificado de "gas y sales" de la empresa de servicio público VANTU, se realizó requerimiento mediante radiado 000716047, se pide pronta respuesta.	Alcaldía Santa Fe	10- Marzo 21 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Inausary	ATENDIDO	17- Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caladas y embases sobre las vías principales y colectores de la mala red de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 12- Mario Inausary solicita ampliación de la información por parte de la Alcaldía de Santa Fe, por lo que no se encuentra referencia a radiado 000716047, se solicita información de contacto de funcionario del FCL. En sesión 17, se solicita cierre de caso, teniendo en cuenta que desde el FCL no se recibió información para dar seguimiento y gestión.	06. Mayo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	41	En la calle 32 por carrera 17, se reporta daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por infiltraciones o por daños en infraestructura de la EABM-Zona 3, se solicita realizar verificación y realizar reparación correspondiente.	IDU	10- Marzo 21 de 2024	EABM - Zona 3	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	16- Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Se efectuó verificación en el sitio determinando que no existe daño en la infraestructura de redes de la EABM. Adicionalmente los puntos donde se presenta deterioro de la vía no concuerdan con el alineamiento de las redes de alcantarillado existentes allí.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	42	Se informa que el FCL Usme tiene en desarrollo el proyecto de construcción de un salón comunal del barrio Villa Aremosa - Sector 1, contrato 659 de 2023, sobre el mismo se va a expedir la correspondiente licencia, por lo cual se han un contrato de consultoría, ahora bien, se está solicitando la disponibilidad de servicio de alcantarillado y desahogado. No obstante, en el año 2023 la EABM informó que para expedir la disponibilidad requería que se contactó con la oficina de construcción, por lo cual se requiere que se confirme esta información o si realmente se requiere en la información correspondiente a la fase de construcción.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	20- Junio 06 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Observación FCL - 26 de mayo: Se han mesa de trabajo con la EABM Zona 4 donde se discuten la disponibilidad de cobertura para aplicación de el proyecto confor con licencia de urbanismo, por lo tanto, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, la EABM presentó lo requerido para realizar el proceso de disponibilidad.	06. Junio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	43	Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Aremosa - Sector 1, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEC Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2023 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Sesión 11 - ENEL - Mauricio Arenas: Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberá volver a solicitar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días. Observación FCL - 26 de mayo: Se están adelantando los gestos y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	44	Para EABM - Zona 4, se presenta situación respecto de vías frente al nuevo Hospital de Usme, en la referencia a red de alcantarillado y no conexión, ya que por esa sector pasa una red que alimenta a casi 3 localidades. Se hace la sugerencia con el ingeniero Cesar Nolasco para la revisión de la conexión y realizar los ajustes, para se invita a que se realice visita de campo y se cierre la conexiones para terminar la intervención de este contrato.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	20- Junio 06 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Observación FCL - 26 de mayo: Dentro de la ejecución del contrato 591 de 2021, se realizaron las mesas de trabajo pertinentes con la EABM, por lo cual se adelantaron todas las acciones pertinentes y a la fecha todo el sistema de suministro de agua se encuentra funcionando sin novedad.	06. Junio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	45	Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comentó que por el cambio de gobierno no se estarían expediendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	SDA	Naren Delgado	ATENDIDO	27- Julio 25 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Observación FCL - 26 de mayo: Se tramitó en el mes de abril un oficio a la SDA, con el fin de ultimar detalles. Ya se adelantó las mesas técnicas y se está atento a la respuesta por parte de la SDA con los requisitos finales para la expedición de los permisos de ocupación.	07. Julio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	46	Del contrato 362 de 2022, el contratista solicitó certificado de "gas y sales" para cerrar la licitación, se efectuó radiación el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radiado 00070708	Alcaldía Turguito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	12- Abril 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	ENEL remitió certificación, se encuentra adjunta al acta 11.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL, realizó vía como eléctrico en julio de 2023 comunicando indicando que se habían requerido de instalar el barrido necesario para la energización del parque los puntos como el contratista terminara la obra civil, tiene ya un tiempo ya se confirió a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se previene que la obra civil termine hace aproximadamente un año.	Alcaldía Turguito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 21, se reitera el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL CODINIA, donde se requiere instalación del barrido necesario para la energización del parque en el cual ya se encuentran terminadas las obras civiles y se invita a ENEL la instalación para poder liquidar el pago ya que este no es posible sin que el parque tenga la verificación verificada. Ya se ha notificado a ENEL desde agosto del 2023, pero no han obtenido respuesta. Información: ENEL CODINIA - Mauricio Arenas: Mauricio.Arenas@enel.com.co	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	48	Del 336 de 2023, también se requiere certificado de "gas y sales" por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 22 de marzo, y se requiere adelantar la liquidación.	Alcaldía Turguito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	25- Julio 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	El correo con la información fue remitido el 14 de julio.	07. Julio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas tuberías, pero a la que no se realizó y se tiene identificado que el contratista corresponde a un problema de la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo realizando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la EDP.	Alcaldía Turguito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 21, se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzú el parque ha tenido un problema con algunas tuberías, en donde se tenía identificado que el problema era un tema con el medidor. Respuesta ENEL CODINIA - Mauricio Arenas: Se solicita de igual manera revisar el tema a las 2:00 pm.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	50	Se tiene en ejecución el contrato 316 de 2023, el cual consiste en la construcción de mala vía, uno de los tramos de este contrato corresponde a la calle de San Benito, en este corredor se encuentra un pozo de media tensión hacia el acceso a la Avenida Boyacá, se le verificado adelantado traslado del mismo sin respuesta concreta por parte de ENEL Colombia.	Alcaldía Turguito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	25- Julio 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 21, se reitera el estado del caso 50 referente al traslado de un pozo ubicado en la calle de San Benito. Indica que hubo demora en la realización del pago pero que se va a efectuar. Respuesta ENEL CODINIA - Mauricio Arenas: Indica que recientemente recibieron el pago y que los tiempos de ejecución de la obra son 45 días normativizado pero que ya se está recomendando para que se realice lo más pronto posible.	07. Julio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	51	Para EABM-Zona 4, se solicita visita a uno de los segmentos viales que se están ejecutando en el contrato 337 de 2023, por lo cual se reitera invitación al ingeniero Jorge Barja a realizar recorrido de campo antes de avanzar con las actividades de validación de concreto.	Alcaldía Turguito	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	19- Mayo 30 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En reporte realizado por SDO con delegados de Alcaldías Locales se reporta resultado.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	52	Se solicita a la EABM-Zona 2, realizar revisión y reparación de daño sobre estructura de pavimento registrada en la calle 33 entre carreras 17 y 18.	IDU	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	12- Abril 11 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	EABM-Zona 2 - Wilson Porras informa en sesión 12: La semana pasada se hizo la reparación de la red que estaba afectada y a día de hoy se adelantó la recuperación de espacio público, por lo dimensión y características fue prioritaria.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	53	Para la EABM-Zona 2, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se desahogan afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N° 46-48 sur, cada vez que llueve se desahoga el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EABM para efectuar visita campo y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	ETB	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 12 - Zona 2 - EABM - Wilson Porras: se va a realizar confor con visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de mantenimiento por temas de mantenimiento de agua, entonces durante el día se efectuó el recorrido para agendar el requerimiento. Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona del área de ETB, para lo cual se va a realizar una reunión por parte de ETB para atender la inspección. En sesión 32, se recibió informe presentado por Argem Carlos López A.Carlos.Lopez@enel.com.co	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	54	Para EABM-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 59B, en razón, a unas obras que adelantó la EABM mediante contrato 1-01-2010-1559 de 2021 - Contrato Cuernavaca, al parecer la EABM en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del anteparedón de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a petición. Se adjunta documento.	ETB	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informó que el supervisor se encuentra haciendo acompañamiento con el contratista para que de las especificaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadanía.	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTION	MES REPORTE DE CASO	N.º DE CASO	SOLICITU	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	N.º SERÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N.º SERÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTION ASOCIADO	PRIORIZACION	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	55	Para ENEL, se solicita retirar y reposición de tapa de Enel en la Calle 13 con Avenida Boyacá sobre la glorieta costado occidental.	MOVISTAR	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catálogos como de "emergencia".	Alta	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	Atendido, se reporta mediante chat de WhatsApp el 03 de mayo de 2024.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	56	Para ENEL, se solicita retirar y reposiciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.	MOVISTAR	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	30 - Agosto 15 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catálogos como de "emergencia".	Alta	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	Atendido	01. Agosto-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	57	Para mostrar, se relaciona con un acción de tutela de un edificio denominado "Esperanza" localizado en el barrio D Recoarado, cerca a Chorrera, la dirección es carrera 36 #28-50, en el que solicitan la instalación de fibra a una oficina, por lo que en calidad de obra, una vez realizada la obra se evidencia que la infraestructura correspondiente a Movistar (la tapa), por lo cual se adjunta documento de tal y se solicita a un profesional de Movistar realizar la obra para emitir respuesta correspondiente.	CLARO	11 - Abril 4 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catálogos como de "emergencia".	Alta	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	En sesión 12 Julián Peña de Movistar informa que una vez realizada visita técnica, la tapa corresponde a ETB por lo cual se solicita reanudar caso. En sesión 15, Carmen Rocío López comunica que se realizó visita y se observa que, la torre red de ETB, no obstante, la tapa no cumple con las especificaciones de la ESP, por lo cual el caso se remite al área de construcción para que se haga los correctivos y se proceda a la instalación de fibra. En sesión 16, ETB - Carmen Rocío solicita cliente, el caso fue atendido. Se remite al cliente para que se realice el pago correspondiente. En sesión 15, ETB - Carmen Rocío informa que se ha avanzado con visita por parte de la EAB - Zona 4, y se espera respuesta por Reger a construcciones respecto de la intervención.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	58	Para Zona 4 EAB, en la calle 308 Sur con carrera SC Este - Barrio Ramalá, la UMY interviene esta vía, la profundidad mínima de excavación fueron 23 cm. Se están presentando filtraciones en la red de alcantarillado la EAB, se le ha ordenado hacerle un hueco a la red de alcantarillado que el ingeniero Vega del autor del CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la Empresa. Se solicita a la EAB de sus vellos y acostumbrado colaboración ante la situación que se presenta.	LMV	11 - Abril 4 de 2024	EAB# - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	23 - Junio 27 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	Intervención EAB# - Zona 4 - Juan Carlos López: El ingeniero Santiago Vilar informa que en la inspección por CCTV se observaron fisuras en la tubería y se va a realizar manga para remediar el problema de redes en el área, se tiene programada la actividad para dentro de dos semanas.	01. Junio-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	59	Para EAB# - Zona 4, el 10 de abril se efectuó inspección vía correo electrónico para verificar disponibilidad de tubería y accesos, si es posible que la EAB apoye al FCL con el suministro.	Alcaldia Bosa	12 - Abril 11 de 2024	EAB# - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	12 - Abril 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	Intervención EAB# - Zona 5 - Javier Patiño: Se informa que se leyó el correo electrónico mencionado, y se verificó la disponibilidad ya que se encuentra material, no obstante, la medida que se va a seguir, esperando los trámites y una vez se realice el material, en aras de priorizar. Por lo anterior, se respondió al correo en las mismas condiciones y para que se tenga una respuesta por parte de la EAB.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	60	Para ETB, el contrato S08 de 2021 se encuentra en etapa de liquidación y se requiere apoyo para generar certificado de "paz y salvo" de ETB, se recomienda con el ingeniero Benjerrín, pero no se ha dado respuesta. El ingeniero Benjerrín se comunicó con el personal de la Alcaldía, e indica que se han hecho varias visitas de obra, en una de las partes se observó un daño que se atribuye al contratista, el contratista en aras de obtener certificado de "paz y salvo" con prontitud realizó el pago, pero a la fecha no se ha generado recibo por parte de ETB.	Alcaldia Bosa	12 - Abril 11 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	Se remite certificado de "paz y salvo" de acuerdo con lo indicado en acta 14.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	61	Para EAB# - Red Matiz, se reporta en la Diagonal 1008 Sur con Carrera 48 dado sobre espacio público desde su aboca hacia de vitrina, se solicita reposición.	IOU	12 - Abril 11 de 2024	EAB# - Red Matiz	Natlia Riario	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catálogos como de "emergencia".	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	Red matiz informó el 25 de abril que la situación había sido atendida.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	62	Para UAPERF, se reporta en frente a grado TV 1A No. 54A-78 encontrando sobre vía pública, se solicita retirar.	IOU	12 - Abril 11 de 2024	LMV	Humberto Ramírez Gómez	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catálogos como de "emergencia".	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	UMV informa en sesión 13 que, una vez revisada la base de datos de la UAPERF, no se encontró caso sector, y se informa que la UAPERF nunca dejó encontrarse sobre vía, se solicita reanudar. Se solicita verificación por parte de la EAB, cuando se realice visita al mismo para el CCTV de mayor se informe que no hay encontrarse en la ubicación indicada, se remite registro fotográfico vía chat.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	63	Para EAB#-Zona 1, se reporta en la VR 45A entre CL 15A y CL 13AD dando sobre estructura de pavimento, posiblemente por redos, se solicita verificar y realizar la recuperación del espacio público.	IOU	12 - Abril 11 de 2024	EAB# - Zona 1	Mauricio Mahache	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catálogos como de "emergencia".	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	Se informa que el pavimento ya se encuentra recuperado.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	64	Para UAPERF, se reporta hundimiento en la CL 85 entre KR 12 y KR 13, dato sobre estructura de pavimento, fue verificado por EAB# indicando que no corresponde a daños por redes, por lo cual se solicita su recuperación.	IOU	12 - Abril 11 de 2024	LMV	Humberto Ramírez Gómez	ATENDIDO	13 - Abril 18 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catálogos como de "emergencia".	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	UAPERF informa en acta 18 que no se ha podido intervenir, a la fecha la UAPERF se encuentra también en PMP para agendar labores en el segmento vial.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	65	Para EAB# - Zona 3, se solicita el contrato FDL-COP-370-2023 que tiene por objeto "Realizar las obras de conservación de la malta viay repaso espacial existente en la localidad de Fontibón, Bogotá, D.C. a través del sistema de precios unitarios fijo y a medida aplicada" la respuesta al radicado E-2024-05092 correspondiente a redes sobre y CL 19 con KR 1048.	Alcaldia Fontibón	13 - Abril 18 de 2024	EAB# - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	En sesión 16, Luis Francisco informa que se cuenta con respuesta mediante oficio E-2024-13714, con esta comunicación se emitió respuesta a la Alcaldía Local de Fontibón.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	66	Para EAB# - Zona 2, se solicita respuesta a certificado de "paz y salvo" radicado mediante número E-2024-02296 del 04 de marzo de 2024, que se relaciona con áreas dentro de espacios arbóreos.	Alcaldia Engativá	13 - Abril 18 de 2024	EAB# - Zona 2	Wilson Javier Ponce	ATENDIDO	19 - Mayo 30 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	En sesión 19 se informa que el radicado se encuentra en proceso por parte de la División Servicios Asesorados de la Zona 2, efectuando la validación de la información o de de datos en el área de influencia del proyecto. Una vez se cuente con esta validación se procederá a la expedición del certificado de "paz y salvo" solicitado. FOL com que fue ATENDIDO: la ESP mediante radicado 3230003-5-2024, 128993 del 30 de abril 2024 presenta "Paz y Salvo" al contratista, el cual remite al FCL en el radicado 3230003-5-2024, 128993 del 30 de abril 2024.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	67	Para VANTI, el contrato de obra pública FCL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere apoderar al radicado 01523CRO010445 del 05 de diciembre de 2023.	Alcaldia Engativá	13 - Abril 18 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Iturrary	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	En sesión 17, VANTI informa que se emitió respuesta de FCL, se anexa soporte a dicha acta.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	68	Para ETB, el contrato de obra pública FCL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 011263 del 31 de octubre de 2023 y 011502 del 31 de enero de 2024.	Alcaldia Engativá	13 - Abril 18 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	En sesión 18, ETB solicita cliente, toda vez que se requirió información adicional al ingeniero Iván, representante del contratista y a la fecha no se ha recibido respuesta.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconformidad en el barrio La Chispa, CL 40 sur con KR 700, se tiene tratando desde finales de 2023 con Movistar en el cual se está encontrando la red reservada por un contratista del FCL Kennedy, al mismo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por fundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere presentarle al Alcalde Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con permisos y pólizas, antes de que la EAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presente problema en redes.	EAB# - Zona 4	13 - Abril 18 de 2024	Alcaldía Kennedy	Delegado	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	Pendiente	
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	70	Se indica que la Alcaldía Local de Suba ejecutó contrato de mantenimiento de parques durante el año 2023, en el cual se realizaron una serie de reuniones con la Empresa de Asesorías y Asesorías de Bogotá - EAB, allí se abordaron algunas intervenciones y decisiones importantes sobre la ejecución. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita firma y cierre de las actas involucradas, ya que se han enviado vía correo electrónico a los ingenieros Mauricio Mahache y Germán López, sin embargo, no se han recibido diligencias. Se solicita emitir documento para que responda en el expediente del contrato.	Alcaldia Suba	14 - Abril 25 de 2024	EAB# - Zona 1	Mauricio Mahache	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	Atendido durante comité, se cuenta con registro fotográfico de documento enviado en acta 14.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	71	Para Jardín Botánico de Bogotá, dentro de las facturas pendientes que se le solicitó al contratista que ofreciera dentro de su propuesta económica para la adjudicación del contrato, una vez realizada la entrega de algunos expedientes de trámite en cada una de las empresas que atiende a través del contrato de mantenimiento de 2023 (Contrato 484 de 2023), no obstante, no se tiene respuesta de fondo por parte del Jardín Botánico de Bogotá y se requiere para cumplir con el factor de sostenibilidad antes mencionado. Se informa que el FCL está desarrollando un proceso de rehabilitación de 19 segmentos viales, pero se tiene un inconveniente con 4 de estos tramos, CVR 1202887, 1202774, 1202873, 1202880. Se requiere una mesa de trabajo con Empresa Metró, ya que se debe abordar una situación en torno al contrato 360 de 2022, al respecto los siguientes representantes se desahogaron estadios y diálogos de lo correspondiente a mesa del tema, con ciertos cuestionamientos que permiten la intervención por parte del FCL. Si el que val buena auto tráfico, no se ejecutará.	Alcaldia Bosa	14 - Abril 25 de 2024	SDA	Karen Bejarano	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	Se actúa que como delegada hace parte del área de manejo del RCD y no, no obstante, se prioriza en contacto con la subdirección de subestructura de la SDA para ayudar a gestionar solicitud. JBB no asiste a esta instancia de coordinación.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	72	Se requiere una mesa de trabajo con Empresa Metró, ya que se debe abordar una situación en torno al contrato 360 de 2022, al respecto los siguientes representantes se desahogaron estadios y diálogos de lo correspondiente a mesa del tema, con ciertos cuestionamientos que permiten la intervención por parte del FCL. Si el que val buena auto tráfico, no se ejecutará.	Alcaldia Barrios Unidos	14 - Abril 25 de 2024	SDM	Marta Helena Silva	ATENDIDO	19 - Mayo 30 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://expediente.cctv.gov.co/consultas/ver_documento.asp?n_documento=1347447&n_seccion_documento=1347447&n_valor_documento=1347447&n_valor_documento=1347447	SDO informa mediante revisión de casos que se realizó oficio radicado FCL/BO No 202402200331 el 19 de Abril de 2024 a Empresa Metró solicitando información sobre datos por proyecto Metró en zona de interés, se recibe respuesta el 8 de mayo de 2024 por parte de Empresa Metró, en el que indica que por el momento en estos segmentos no se tiene proceso interactivo como dentro la zona de interés, por lo tanto continúa el proceso sobre estos segmentos de interés para su intervención.	05. Mayo-2024

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

	TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N° DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	N° SEÑAL PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N° SEÑÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
	I TRIMESTRE	04. Abril-2024	73	Para EASB-Zona 3, se reporta fuga que presenta daño y consecuente riesgo para los transeúntes en la Cta 7 #17-76.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EASB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	18 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus comités presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	EASB - Zona 3 - Luis Francisco informa en sesión 16 que ya fue atendido el requerimiento.	05. Mayo-2024
	II TRIMESTRE	04. Abril-2024	74	Para ENEL, se reporta fallas de tapa en la calle 147 al occidente de la carrera 8 en calzada norte.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus comités presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	Se reporta reparación de tapa en la calle 147 con carrera 8. Se solicita libere del caso expuesto por Claudia Segura.	04. Abril-2024
	II TRIMESTRE	04. Abril-2024	75	Para EASB-Zona 1, se reporta intervención realizada en la carrera 5 con calle 141, donde se requiere reposición de pavimento.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EASB - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus comités presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	En sesión 14 informa EASB - Zona 1 - Mauricio Mahecha: Le consulto via correo electrónico para la información efectivamente las de la EASB, y que está pendiente la recuperación de espacio público, la cual se encuentra a cargo de un contratista externo que tiene programada la actividad para el 24 de abril de 2024. En Sesión 17 se informa que, con el reporte realizado por el Ingeniero Mauricio Mahecha, el caso queda cerrado.	05. Mayo-2024
	II TRIMESTRE	04. Abril-2024	76	Para EASB – Zona 5, se reporta sucesión en la calle 26 con carrera 788, se solicita verificar y atender situación de emergencia.	EADU	14 - Abril 25 de 2024	EASB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	21 - Junio 13 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus comités presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	En sesión 21, EASB – Zona 5 - Javier Patiño informa que sobre la calle 26 sur con carrera 788 no se encontraron afectaciones, no obstante, se han verificado de forma aleatoria evidenciando que en la zona de la EASB, ya se efectuó reposición del pavimento el 18 de abril. Por lo anterior, se resuelve del caso expuesto.	06. Junio-2024
	II TRIMESTRE	04. Abril-2024	77	Para EASB - Zona 1, se envió dentro del periodo el 19 de abril de 2024, donde se dio traslado por sucesión en la calle 167 con carrera 30 en el barrio Florida, quedando se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Tránsito. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniería Angélica Tatiana López Higueras se resalta caso a la Alcaldía Local de Suba.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	Alcaldía Suba	Dalegado	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus comités presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	En sesión 18, IDU indica que no se reporta estado el respecto. En sesión 17, el IDU informa que T. 1, la EASB mediante oficio 3130000 - 2024-K000 de 16 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba. El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la Gerencia General Asesoramiento Zona 1, de la Empresa de Aseguramiento de Bogotá EAB-EAP, contrato de verificación, a la dirección de la EASB. Nada Roldán informa en sesión 16: Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la primera semana se tiene programado realizar los respectivos arrendos. SEÑON 28: ETB-Carmon Rico López Informa: El Ingeniero Juan Fernando Solís acordó económicamente el comité, teniendo en cuenta que no ha sido posible agendar una reunión con la Ingeniería Nidia Riquelme, ya que se ha enviado correo de fecha 28 de 35 de abril, sin embargo, no se ha recibido respuesta, se le pide continuar con la gestión.	
	II TRIMESTRE	04. Abril-2024	78	Para EASB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 88, se observa cámara de ETB afectada por cortante epistático por la EASB con N°. ITG50003165 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se están realizando en este sector se afectó infraestructura de ETB, después la placa superior dependiente ya se puede desmontar. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	ETB	14 - Abril 25 de 2024	EASB – Red Matriz	Nidia Rario	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus comités.	Alta	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf		
	II TRIMESTRE	04. Abril-2024	79	Para EASB - Zona 3, se requiere de mermas urgentes, apiques y reparación de canalización de Telefonía, que fue afectada en intervención realizada por la EASB para realización de la feria.	MOVISTAR	14 - Abril 25 de 2024	EASB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus comités.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	Pendiente	
	II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	80	Se relacione con el oficio DU 20240300540771, correspondiente a derecho de petición que fue trasladado por una tasa fallante en una cámara localizada en la carrera 39 IV, GZ-40, una vez recibida la visita se observa que la infraestructura no es de ETB, sino de la EASB.	ETB	15 - Mayo 02 de 2024	EASB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus comités presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	En esta Etapa EASB Zona 4 informe que, realizó la investigación de la caja de inspección que requiere lista, se observó que no se presentó la EASB, y yo tiene infraestructura de la empresa. Por lo tanto, se emite el contrato por el usuario, y como tal deberá realizar el debido mantenimiento, se verifica que desde la dependencia de la EASB que tiene asignada la petición se envíe respuesta y/o informe de fondo.	05. Mayo-2024
	II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	81	Para LMV, se informó desde el área de conservación que luego comunicaron desde se indica que la UGRBM había realizado restauración de camponero de obra firme y establecimiento de megalina pesajera frente al CVI 1002548 - PK 91037360, en la calle entre carreras 103A y carrera 104, lo que coincide con el segmento está recién intervenido por el contrato de conservación 1792 de 2021, y se menciona que se ha hizo coordinación.	IDU	15 - Mayo 02 de 2024	LMV	Humberto Ramirez Gómez	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malva vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	En esta Etapa Humberto Ramirez indica que para saber si la UGRBM realizó restauración de la calzada, por lo cual debe ir la Inspección una carga sobre el segmento.	05. Mayo-2024
	II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	82	Para VANTI, se recibió información que sobre esta mismo corridor (AC 80) entre carrera 103 y carrera 104A, en el cordado existe tubería de gas natural afectando también zona intervenida por contrato de conservación 1792 de 2021.	IDU	15 - Mayo 02 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insauty	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malva vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	En esta Etapa VANTI - Mario Insauty: El caso 82 se gestiona a través del ingeniero Maurizio del área de mantenimiento, se informa que hubo reposición del espacio público, se realizó registro fotográfico. En esta Etapa IDU informa que se remitió respuesta por delegados de área de conservación, a la fecha no se cuente con pronunciamiento por parte de esta dependencia.	
	II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	83	Para IDU se ha visto informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayaquene con calle 10 (contrato 1540 de 2016) que las sandrias construidas tienen algunas dificultades en su operación. Entre ellas que colapsan, ancho se presentan un accidente por esta causa. Se requiere pronunciarse por parte del IDU, se entiende que la falta está relacionada constructiva, pero por lo se ha recibido por parte de la EADU y se requiere su atención sobre estos aspectos.	EASB - Zona 5	15 - Mayo 02 de 2024	IDU	Cristalia Segura	ATENDIDO	29 - Agosto 08 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus comités.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	La Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, por medio del memorando 2024030023723 de respuesta, adelantando la elucidación actual en la Av. Guayaquene con respecto al accidente, se anexa memorando y se solicita cerrar el caso.	08. Agosto-2024
	II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	84	Para IDA, se solicita cierre de pozo ambiental N°. 27190 del contrato de obra 270 de 2022	Alcaldía Antonio Narño	16 - Mayo 09 de 2024	IDA	Karen Bujano	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malva vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	Karen Bujano: Informa que se realizó verificación del pozo, encontrando que fue hecho el 12 de noviembre de 2022, al cual se an adjuntan las disposiciones de la Resolución Nacional 1237 de 2021. Por otro lado, se observa que no hay nada de información cargada a sede pin, por lo cual la solicitud de cierre no es posible, se deberá cargar los certificados de disposición final y aprovechamiento de acuerdo con el anexo 1 de la resolución mencionada previamente. Finalmente, de acuerdo con el informe registrado de la finalización del contrato se adjunta 19, la fecha no coincide con la fecha de finalización del contrato, por lo tanto se emite el contrato por el usuario, y como tal deberá realizar el debido mantenimiento, se verifica que desde la dependencia de la EASB que tiene asignada la petición se envíe respuesta y/o informe de fondo.	05. Mayo-2024
	II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	85	Para EASB - Zona 2, se solicita en la carrera 24 delgado el caso 45 (N. 6) verificación de redes que pueden estar generando daño sobre estructura de pavimento.	IDU	16 - Mayo 09 de 2024	EASB - Zona 2	Wilson Javier Poma	ATENDIDO	16 - Mayo 23 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus comités.	Alta	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	En sesión 16, EASB - Zona 2 - Wilson Javier Poma informó que esta semana se han realizado los trabajos de instalación accidental, se verificó la conexión del suministro de la red de agua fría en la tubería, las cámaras reportan en perfectas condiciones, sin cambios. De acuerdo con la mermada, se descarta que el funcionamiento que está fuera del suministro se encuentra asociado a alguna falta de la infraestructura de la red de desflujo, exclusivamente de la conexión accidentalmente. En sesión 16, IDU - Jaime Bermudez: indica que la información sobre la visita realizada se realizó en el año 2011, fue un contrato que gestionó el IDU con personal de Colombia Humana (recurso), los apiques la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del contrato de mantenimiento del FCNE, en el cual se encuentra adherido un fenómeno de inestabilidad. En el contrato se ejecutó en el año 2011 y culmine su término de garantías por adelantado en el año 2013, considero en el contrato mencionado, se anexa el contrato mencionado.	05. Mayo-2024
	II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	87	Para EASB - Zona 4, corresponde a derecho de petición que fue presentado por parte de un operador de BTP, se requiere verificación de tramo vial Avenida Primero de Mayo con carrera 71P en el cual se presume existencia de sucesión por daño en red.	IDU	17 - Mayo 16 de 2024	EASB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	22 - Junio 27 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus comités presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	En sesión 18, EASB - Zona 4 - Juan Carlos López informa que el caso 87 lo está atendiendo el área operativa, mediante mantenimiento. En sesión 22: Se reporta atendido por EASB-Zona 4, pero en su cuenta con registro fotográfico de la recuperación. En sesión 23: Se reporta solucionado, se envió oficio con registro fotográfico de atención del caso.	06. Junio-2024
	II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	88	Se solicita al IDU respuesta a requerimiento enviado vía correo electrónico sobre trámite de PRT de la Industria Copel, quien como cliente de VANTI requiere prestación de servicio mediante derecho de petición debido a que no ha hecho solicitud de PRT, pero no ha tenido registro por respuesta de IDU. En varias ocasiones se ha requerido comunicación con ingeniería de IDU para solicitar mermas de trabajo, pero no ha sido posible.	VANTI GAS NATURAL	17 - Mayo 16 de 2024	IDU	Áscar Riquelme	ATENDIDO	28 - Agosto 01 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malva vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	En sesión 28 - IDU: Apoyados en COOS 28 del 30 de mayo de 2024.	08. Agosto-2024
	II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	89	Para ENEL, se solicita aprobación de parte de comisión radializada consecutiva 1020476372 del 10 de abril. Se precisa que se otorga facultad, pero que se espera aprobación de diseño para continuar con el trámite de aprobación integral del proyecto ante el IDU.	Alcaldía La Candelaria	17 - Mayo 16 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	25 - Junio 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con las licencias para construcción o instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/documento/1477?sequence=1&view_type=pdf	Observación FCL - 26 de mayo: Año no se ha obtenido concepto de aprobación del diseño de licencias. Respuesta ENEL - Sesión 25: el diseño tarda 6 y está aprobado con el radicado 10200476372 del 4 de junio.	07. Junio-2024
	II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	90	Para IDA, relacionado con un requerimiento de manejo ambiental, durante el mes de abril se recibió mediante memorando 202404011											

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	127	Para EAB-Zona 1, se relaciona una solicitud en la calle 19 entre carreras 4 y 55, donde se evidencia un posible daño de rodam, se solicita realizar visita conjunta.	UAV	23 - Junio 27 de 2024	EABZ - Zona 1	Mauricio Machuca	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	128	Para ETB, se solicita atender caso presentado por Alcaldía Mayor sobre el sector de la carrera 4 entre calles 61 y 62 (costado oriental) donde se observan postes sin tipo, generando alto riesgo para transeúntes.	IDU	23 - Junio 27 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	30 - Agosto 16 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Acta 23 - Respuesta ETB - Benjamin Chuluy. Se informa que respecto al caso 128, si correspondiera a labores de ETB, se procesa a realizar reporte a la Gerencia de Servicios Maiores para que se efectúe la correspondiente reposición, así mismo se remita registro fotográfico para evidenciar el cumplimiento de la actividad.	06. Agosto-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	129	Para IDU, se han realizado dos solicitudes respecto a las actividades que puede desarrollar el FDL en puentes vehiculares como peatonales que se encuentran sobre cuerpos de agua, esto teniendo en cuenta que, dentro de las metas del plan de desarrollo, se deben atender 500 m² de obra infraestructura. Se agradece la pronta respuesta del IDU (último radicado: 20246220016871 del 23 de enero), teniendo en cuenta que en el FDL, se cuentan con recursos limitados, y no se tiene personal especializado para emitir dictámenes sobre este tipo de infraestructura.	Alcaldía Barríos Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermúdez	ATENDIDO	25 - Agosto 01 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Acta 26 - Frente al radicado IDU 2024026119780, la OTIN respondió a la Alcaldía Local por medio del oficio 20240000778751.	06. Agosto-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	130	Para IDU, se tiene algunas dudas sobre la intención de segmentos que la comunidad solicita atender, pero que cuentan con reserva por parte de esta entidad, en este caso el SDM, donde se programan parques en vía, al respecto ¿hay alguna directriz o tratamiento sobre las actividades que podría llegar a realizar el FDL?, en algún momento SDM indica al IDU que se le beneficiaría esas reservas pero que se podría realizar intervenciones frente a mejoramiento de infraestructura, por lo anterior se solicita conocer si hay alguna orientación en este sentido.	Alcaldía Barríos Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermúdez	ATENDIDO	27 - Julio 29 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Acta 24 - Intervención IDU - Ing. Jaime Augusto Bermúdez: El tema de recursos efectivamente se maneja al interior del IDU, por lo cual después la OOT se podrá gestionar una reunión entre la Dirección Técnica de Ingeniería de Regeneración e Innovación y los delegados de la Alcaldía Local para aclarar las acciones dentro de la ingeniería. Por lo anterior, se solicita remitir información de contacto para buscar un espacio y realizar mesa de trabajo.	07. Julio-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	131	Para IDU, se informa que labora como reportero técnico para la supervisión de contratos de malta val, por lo cual radicado solicitud el día 20 de junio mediante radicado 20240220191691, solicitando actualización de la plataforma SIGOED entre otras segundas sales, de los cuales se cuenta con oficio de reserva, pero no aparecen reflejados en la plataforma (radicado: 202305079451).	Alcaldía Barríos Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermúdez	ATENDIDO	28 - Julio 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Acta 24 - Intervención IDU - Bertha Liliana Torres Moreno: Se solicita remitir los oficios mencionados, a fin de verificar de manera interna con la Dirección Técnica de Ingeniería de Regeneración e Innovación a cargo de la Dra. Bely Magaña Rojas Berrío. Se recomienda aclarar los nombres de radicado de ingresos al IDU y no los consecuentes del FDL, por lo cual se sugiere a la Ingeniería Soma verificar dicha información.	07. Julio-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	132	Para IDU, se tienen algunas inquietudes respecto al Decreto 625 de 2023 - "Por medio del cual se reglamenta el artículo 132 del Decreto Distal 555 de 2021 "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C." y se dictan otras disposiciones", ya que en el artículo 13 se manifiesta que mediante nuncio acto administrativo se adoptarán los manuales o instructivos que se emiten periódicos, por lo cual se requiere este documento para iniciar programación de mantenimiento de andenes en la localidad.	Alcaldía Barríos Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermúdez	ATENDIDO	30 - Agosto 15 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Atendido	06. Agosto-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	133	Para ENEL, respecto del contrato de construcción de malta val 460 de 2023, se tiene referencia de un poste con alta inclinación en el barrio Salda. La comunidad, el contratista y la interventoría han solicitado varias veces informes, sin embargo, la respuesta de ENEL es que no existe riesgo, ya que la infraestructura se encuentra dentro de los parámetros.	Alcaldía Suba	24 - Julio 04 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	28 - Julio 11 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Acta 24 - Respuesta ENEL - Jorge Mauricio Arenas: Se solicita número de radicado para verificar respuesta a la comunidad y mantenerse cercano técnico con soporte fotográfico, puesto que esta infraestructura recibe o permite mantener unos niveles de inclinación que generan afectación para las personas a entorno.	07. Julio-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	134	Para EABZ, respecto del contrato de construcción de malta val 460 de 2023, hay unas ojales en algunos tramos donde se está ejecutando que requieren intervención, por lo cual se solicita acompañamiento técnico de EABZ, al momento se ha iniciado realizar contacto con el Ingeniero Mauricio Machuca sin que se haya logrado gestiones, se han programado visitas sin llegar a realizarse.	Alcaldía Suba	24 - Julio 04 de 2024	EABZ - Zona 1	Mauricio Machuca	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	135	Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malta val 460 de 2023, se presenta infraestructura de fibra óptica en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	Alcaldía Suba	24 - Julio 04 de 2024	MOVISTAR	Jhónny Augusto Peña	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	136	Por otro lado, se presenta caso para EABZ-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perfilar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero eso no es la solución. Como se comentó previamente, se hallaron de estos casos con el Ingeniero Yareni, y se indicó que posiblemente hoy se realice la visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con esta tema.	IDU	24 - Julio 04 de 2024	EABZ - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	137	Para EABZ-Zona 3, se reporta en la carrera 13A N° 23-81 anovación en la vía, falta de la capota auxiliar y estructura de soporte, debido a posibles fallas de colector de aguas residuales, se evidencia pérdida de material en dicha estructura.	IDU	24 - Julio 04 de 2024	EABZ - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	UAEINRV - Humberto Rentería - Sesión 26: Para EABZ-Zona 3, se solicita atención de la carrera 13A con calle 23, se relaciona con requerimiento ciudadano para atender hueco generado sobre calzada, una vez realizada la visita se evalúa que pueda relacionarse con la falta sobre rodam de alcantarillado, por lo cual se verifica y el personal EABZ interno, no obstante, aún se requiere recuperación de calzada.	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	138	Para EABZ-Zona 1, se presenta asociación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 15, costado sur, en el área donde se observa poco del sistema de alcantarillado, se pospone que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección y de ser el caso, la debida atención de la EABZ.	IDU	25 - Julio 11 de 2024	EABZ - Zona 1	Mauricio Machuca	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	139	Para EABZ-Zona 3, la situación fue reportada a través de redes sociales, se localiza en la calle 22 con carrera 14 (cruce Candelaria), en donde se puede visualizar a través del registro fotográfico, falla en la estructura de pavimento posiblemente por asociación, se solicita visita de campo de la EABZ para verificar, y para que con el diagnóstico completo de la situación se tomen las decisiones pertinentes en aras de garantizar la seguridad vial en el sector.	IDU	25 - Julio 11 de 2024	EABZ - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	140	Para EABZ-Zona 1, respecto de la intervención realizada por la EABZ en la calle 13A con carrera 19, se realizó reparación de red sanitaria, no obstante, aún se requiere recuperación de espacio público, solicita la debida gestión.	IDU	25 - Julio 11 de 2024	EABZ - Zona 1	Mauricio Machuca	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	141	De media solicitud de la Alcaldía de Chaparrón, respecto de requerimiento que se efectuó al Secretario Distal de Ambiente para la aprobación de permisos silviculturales, los cuales tienen radicaos 2024ER6489 del 26 de marzo y 2024ER10085 del 14 de mayo de 2024 (Bogotá le escuche No. 260150204), y no se cuenta con procesamiento de esta Entidad.	SDG	25 - Julio 11 de 2024	SDA	Sara Jiliana Delgado	ATENDIDO	26 - Julio 18 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Sesión 26 - SDA Informa: en atención al Caso 141 por el cual se recibe solicitud de la Alcaldía de Chaparrón respecto a procesamiento de una solicitud que se efectuó al Secretario Distal de Ambiente para la aprobación de permisos silviculturales, con radicaos SDA 2024ER6489 del 26 de marzo y 204ER10085 del 14 de mayo de 2024 se informa que se dio respuesta mediante radicaos SDA 2024ER14853 del 2024-07-05 y radicaos SDA No. 2024EE11259 2024-05-27 correspondientemente.	07. Julio-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	142	Para VANT, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 1600474 del barrio San Francisco.	Alcaldía Puente Aranda	26 - Julio 18 de 2024	VANT GAS NATURAL	Alexandra Rojas	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Acta 26: Alexandra Rojas solicita indicar si se ha entidad comunicado formal a VANT, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	143	Para EABZ-Zona 3, se solicita apoyo para alineación de colarillo de cubre en el CIV 1600474 del barrio San Francisco. Así mismo, se afirma que el Ingeniero Francisco siempre ha sido muy presto en apoyar y atender a los llamados del Fondo de Desarrollo Local.	Alcaldía Puente Aranda	26 - Julio 18 de 2024	EABZ - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	144	Para ENEL, se reporta falta fallante en un KR7 con CL 41, se solicita reposición por generar un alto riesgo de accidente para transeúntes y vehículos.	IDU	26 - Julio 18 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	29 - Agosto 08 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://repositorio.alcaldia.gov.co/handle/document/13204200191691?sequence=1	Respuesta ENEL - Mauricio Arenas en sesión 26: Respecto del caso de la calle 41, se informa que las reportes a unidad operativa, y se están realizando las gestiones pertinentes para adelantar reposición de tapa.	06. Agosto-2024

COMITE OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB
Código Postal 110311 Bogotá Colombia
gestioncorrespondencia@etb.com.co

2024- 303 -ECC-EIGC NI51652- 52025

AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE CONSECUTIVO

Bogotá

27 FEB. 2024

CECO:VT041

Señor:

IVAN ALONSO PARDO AVILA

Representante Legal

CONSORCIO VIAS EDC 2022

Av. calle 24 No. 51-40 ofi 316

Telefono: 4672735

Bogotá

CORRESPONDENCIA ETB

27 FEB 2024 11:09:50

Asunto: PAZ Y SALVO DE DANOS CONTRATO COP-492-2022

contrato No. CONTRATO COP-492-2022 Contratar por precios unitarios y a monto agotable las obras necesarias para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de andenes, zonas peatonales y malla vial de la localidad De Engativa.

Ref. C-CVIASEDC22-OBRA492-143-2024

Respetado señor Pardo:

En atención a la comunicación indicada en la referencia y con el fin de proceder con las consultas internas y suscripción del acta de verificación final, de manera atenta se requiere la remisión de la siguiente información:

1. Planos de los CIV objeto de intervención.
2. Certificación de la interventoria donde indique el recibo a satisfacción de obras al contratista especificando la relación de los CIV con tipo de intervención, tipo de trabajo, fecha inicial y final de cada CIV intervenido.
3. Remitir la siguiente información:

CONTRATO: [REDACTED]
OBJETO: [REDACTED]
CONSTRUCTOR: [REDACTED]
NIT: [REDACTED]
INTERVENTORIA: [REDACTED]
FECHA DE INICIO: [REDACTED]
FECHA DE TERMINACIÓN: [REDACTED]
AREA DE INFLUENCIA: [REDACTED]

El ingeniero [REDACTED] actuando en representación de [REDACTED] **CONTRATISTA**, quien en adelante se llamará [REDACTED], la ingenierX [REDACTED] actuando en representación de [REDACTED] quien en adelante se llamará **LA INTERVENTORÍA**, la Arquitecta [REDACTED], delegada para el contrato en representación de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP y la ingeniera

_____, como Apoyo a la supervisión de la Alcaldía Local de _____; suscriben la presente acta de verificación de infraestructura de ETB donde se certifica la propiedad y conservación de la infraestructura por las obras civiles adelantadas en el área de influencia Localidad de _____ a nombre de _____

POR CONSTRUCTOR:

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma: _____
Ing
Nombre firma contratista

Firma: _____
Ing.
nombre firma interventora

POR ALCALDÍA LOCAL DE _____:

Firma: _____
ING.
Apoyo a la Supervisión Alcaldía de _____

De otra parte, se requiere anexar la

Cordialmente,



CARMEN ROCÍO LÓPEZ LÓPEZ
Equipo Construcción y Gestión Convenios
Gerencia Planta Externa

Anexo: N/A
Elaboró: Carmen Rocío López López- Equipo Obras de Infraestructura
Revisó: N/A
Archivo: Alcaldía de Engativá Cto 492-2022.

Comité Operativo OISPDC: CASO 122: reporte de avance para cierre

CARMEN ROCIO LOPEZ LOPEZ <carmlopl@etb.com.co>

Jue 08/08/2024 9:02

Para: Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

CC: jaime.bermudez <jaime.bermudez@idu.gov.co>

 1 archivos adjuntos (289 KB)

20240228140915834.pdf;

Paola, buenos días:

En atención al caso 122 registrado en el seguimiento así: [Para ETB, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 012826 del 31 de octubre de 2023 y 015527 del 31 de enero de 2024, donde se requiere certificado de "paz y salvo", de manera atenta se adjunta copia del oficio 2024- 303 -ECC-EIGC NI51652-52025 rad. 16510 del 24 febrero/24, mediante el cual, se envió respuesta al señor Ivan Pardo Avila, representante Legal del Consorcio Vías EDC 2022](#)

Lo anterior, con el fin de cerrar este pendiente en el registro de casos.

Cordialmente,

CARMEN ROCIO LOPEZ LOPEZ

PROFESIONAL I

EQUIPO CONSTRUCCION Y GESTION CONVENIOS

VP TECNOLOGÍAS

 6012422762 |  3057001932

 Salitre, Cra 52 44C-55 | Piso 2 | Bogotá - Colombia



Los correos recibidos no implican respuesta inmediata si son enviados fuera de la jornada laboral, en cumplimiento con la Ley 2191 de desconexión laboral

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de ETB. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridad_informatica@etb.com.co y bórralo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information ETB. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply. If you have received this e-mail transmission in error, please inform us at seguridad_informatica@etb.com.co and erase it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

CASO 132

Liliana Torres Moreno <liliana.torres@idu.gov.co>

Mar 13/08/2024 9:44

Para: Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>; ing.paolagamez <ing.paolagamez@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (103 KB)

respuesta AL barrios unidos.pdf;

Paola buenos dias!

Respecto al caso 132 "Para IDU, se tienen algunas inquietudes respecto al Decreto 625 de 2023 – "Por medio del cual se reglamenta el artículo 132 del Decreto Distrital 555 de 2021 "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C." y se dictan otras disposiciones", ya que en su artículo 13 se manifiesta que mediante nuevo acto administrativo se adoptarán los manuales e instructivos que se estimen pertinentes, por lo cual, se requiere este documento para iniciar programación de mantenimiento de andenes en la localidad" remitimos el memorando 202423500237263 desde la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación dando respuesta a la solicitud de la Alcaldía Local y dado por cerrado el caso!

muchas gracias por tu atencion

--

Cordialmente,

Liliana Torres Moreno

Profesional Especializado

Oficina de Coordinación Interinstitucional - Dirección General

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Teléfono: (57) (1) 3445000 PBX 3386660 ext. 1379

cel: 3153151605

liliana.torres@idu.gov.co



MEMORANDO



DTINI

202423500237263

Información Pública
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., AGOSTO 09 de 2024

PARA: **JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ**
Jefe Oficina de Coordinación Interinstitucional

DE: Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación

REFERENCIA: Envío Respuesta Al Radicado Número 202416500228913

Cordial saludo,

En atención al memorando de la OCIT 202416500228913 "*Solicitud Alcaldía Local de Barrios Unidos*", se permite dar respuesta a su petición en los siguientes términos sobre el particular, que el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU conforme a las funciones generales del Instituto expedidas por el Consejo Directivo en el Acuerdo N° 006 de 2021 "*Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones*". Con relación al Artículo 14 del Acuerdo 006 de 2021, se encuentra entre otras la de "*Administrar, actualizar y mantener el sistema de información de precios unitarios, de especificaciones técnicas y las bases de datos y proyecciones de los costos de construcción y mantenimiento de la infraestructura de los Sistema de Movilidad y de Espacio Público Construido*".

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el IDU, a través de la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación (DTINI), pone a disposición las Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción. Estas especificaciones constituyen un conjunto de lineamientos técnicos que abarcan los siguientes aspectos mínimos para la ejecución de proyectos de construcción o conservación de infraestructura vial y espacio público: Alcance del proyecto, Materiales requeridos, Diseños de mezclas y fórmula de trabajo, Equipos necesarios, Requerimientos para la ejecución de los trabajos, Condiciones de entrega para la recepción de los trabajos, Medición y forma de pago, Ítems de pago aplicables.

Para el caso de la última versión de especificaciones técnicas que fue adoptado mediante la Resolución 010910 de 2019, se disponen los siguientes documentos para la conformación del sistema de espacio público:



MEMORANDO



DTINI

202423500237263

Información Pública

Al responder cite este número

Capítulo 5 - Subbases y Bases Granulares

- 512-18 Subbase granular para vías peatonales y CicloRutas con agregados naturales.
- 513-18 Subbase granular para vías peatonales y CicloRutas con agregados reciclados obtenidos de residuos de construcción y demolición RCD
- 514-18 Base y subbase granular para vías vehiculares, peatonales y CicloRutas con MBR.

Capítulo 8 Concreto Hidráulico

- 800-18 Pavimento de concreto hidráulico
- 801-18 Instalación de concreto estampado para superficies de tránsito peatonal y vehicular

Capítulo 10 Espacio Público

- 1000-18 Generalidades para el espacio público
- 1010-18 Procedimiento constructivo para losetas prefabricadas en concreto sobre superficies de tránsito peatonal
- 1020-18 Procedimiento constructivo de adoquines de arcilla y concreto sobre superficies de tránsito peatonal y vehicular
- 1030-18 Actividades de conservación para espacio público
- 1040-18 Reductores de velocidad - Tipo Pompeyanos
- 1050-18 Protección de superficies con recubrimiento Anti_Grafiti

Capítulo 11 Ciclorrutas

- 1100-18 Procedimientos constructivos y control de calidad para Ciclorrutas

Capítulo 12 Obras Varias Para Estructuras de Puentes Vehiculares y Peatonales

- 1200-18 Reposición de pisos de escaleras por material sintético en puente peatonal prototipo para Bogotá
- 1201-18 Construcción e instalación de pisos de concreto pretensado en puente peatonal prototipo para Bogotá



MEMORANDO



DTINI

202423500237263

Información Pública

Al responder cite este número

- 1202-18 Construcción e instalación de pisos de aluminio en puente peatonal prototipo para Bogotá

Estos documentos están disponibles para consulta a través del enlace

<https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales>

Asimismo, como parte del proceso constante y dinámicas de actualización de las especificaciones técnicas, se relacionan a continuación sus diferentes versiones:

Versión	Acto administrativo	Descripción de modificación	Vigencia
1.0	Resolución 1959 de 18/05/2006	Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá D.C - IDU ET 2005	Proyectos estructurados a partir del 1 de junio de 2006.
2.0	Resolución 4880 del 05/12/2011	Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá D.C – IDU ET 2011	Proyectos estructurados a partir de la entrada en vigencia de la Resolución 4880.
3.0	Resolución 3243 del 18/12/2013 (*)	Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá D.C – IDU ET 2011 - Versión 3.0	Proyectos estructurados a partir de la entrada en vigencia de la Resolución 3243.
4.0	Resolución 010910 del 06/12/2019	Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá D.C IDU ET-IC-01	A todos los proyectos que se inicien desde prefactibilidad y los que se estructuren para conservación a partir del 01/01/2020.

(*) Aplicable para las secciones actualizadas 101-2013, 500-2013, 503-2013, 504-2013, 506-2013 e inclusión de especificaciones 571-13 y 720-13

De este modo, las especificaciones técnicas del IDU atienden la implementación del Manual de Espacio Público de la Secretaría Distrital de Planeación, así como lo descrito en el artículo 10 del Decreto Distrital 263 de 2023.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el IDU se encuentra comprometido con la constante investigación y seguimiento de nuevas alternativas



MEMORANDO



DTINI

202423500237263


Información Pública

Al responder cite este número

de materiales y procesos constructivos, que fortalezcan la información actualmente disponible.

Con la información anterior, esperamos haber dado respuesta a su solicitud. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional relacionada con el tema.

Cordialmente,



SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA

Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación

Firma mecánica generada el 09-08-2024 05:32:51 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Revisó: IVÁN ALBERTO CAAMAÑO MURILLO - Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación

Elaboró: YULY CATERIN DIAZ JIMENEZ-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación

Cumplimiento de compromisos - Secretaría Distrital de Planeación - Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos

Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

Mié 21/08/2024 8:54

Para: Jorge Enrique Abreo Reyes <Jorge.Abreo@gobiernobogota.gov.co>

CC: Jacqueline.Villa <Jacqueline.Villa@gobiernobogota.gov.co>; liliana.torres@idu.gov.co <liliana.torres@idu.gov.co>; Nelson Humberto Gamboa Baracaldo <ngamboa@sdp.gov.co>; Anamaria Solano Monroy <asolano@sdp.gov.co>

 2 archivos adjuntos (613 KB)

1-2024-43341.pdf; 3-2024-28144.pdf;

Buen día Ingeniero Jorge,

Reciba un cordial saludo

Respecto de las solicitudes realizadas en la sesión N°. 29 realizada el 08 de agosto de 2024 del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos a la Secretaría Distrital de Planeación, me permito informar:

- **Caso 152:** Para SDP, se realizó solicitud de declaratoria de espacio público para el CIV 2001250, teniendo en cuenta que se encuentra en inventario IDU, pero no en el de espacio público del DADEP. Al respecto se efectuó investigación con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, donde se reportaron los documentos que especifican la cartografía en formato Shape con los lotes, las construcciones y manzanas catastrales del sector, siendo parte de la información que requiere la Secretaría Distrital de Planeación de acuerdo con radicado 2-2024-42632. Esta información inicial se está organizando con la topografía actual, en adición, se esta programando mesa de trabajo con las personas que representan estos predios, y en ese orden de ideas, se solicita a la SDP-Subdirección de Centro Ampliado acompañamiento para proceso de socialización.

Gestión: Se remitió memorando 3-2024-28144 del 12 de agosto de 2024 a la Subdirección de Planeamiento Local del Centro Ampliado, para que efectúe la delegación de funcionario a mesas de trabajo a citar por FDL.

Actualmente se encuentra en trámite de revisión la respuesta que fue proyectada por el profesional Alfonso Pinaud (apinaud@sdp.gov.co).

Buscar documentos

Forest > Buscador

1

# Rad	Fecha	Tr&y;mite	Clase documental	Tipo documental	Proceso	# Proceso	Entidad	Actividad	Dependencia	Usuario	Fecha Término	Estado	Ref. Externa / Asunto
3-2024-28144	2024-08-12 11:28:14 AM	Comité Técnico Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital (11400240)	Interno	Memorandos (18)	Procedimiento de Correspondencia (Externa e Interna) V.5	2400886	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP	ACTIVIDAD FINAL	Subdirección de Planes Maestros	SISTEMA	2024-09-24 11:28:14	Finalizado	Solicitud Fondo de Desarrollo Local de Chapinero en la instancia de coordinación denominada Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos.
3-2024-28144	2024-08-12 11:28:14 AM	Comité Técnico Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital (11400240)	Interno	Memorandos (18)	Procedimiento de Correspondencia (Externa e Interna) V.5	2401952	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP	Revisar Borrador	Subdirección de Planeamiento Local del Centro Ampliado	Martha Milena Avila De la Hoz	2024-09-24 11:28:14	Consulta	Solicitud Fondo de Desarrollo Local de Chapinero en la instancia de coordinación denominada Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos.

Nueva búsqueda

Cerrar

- Requerimiento respecto a soterramiento de redes, se radicó correo electrónico remitido el 12 de agosto de 2024 con consecutivo 1-2024-43341.

Gestión: Se proyectó respuesta formal de acuerdo con lo indicado en comité, donde se solicitó emitir información al respecto vía oficio, por lo cual se dio respuesta con radicado de salida 2-2024-48315.

Agradeciendo su amable atención,

Ing. Paola Andrea Gámez Tabimba
Profesional de la Subdirección de Planes Maestros
Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales





SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 2
Anexos:
No. Radicación: 3-2024-28144 No. Radicado Inicial:
XXXXXXXXXX
No. Proceso: 2400866 Fecha: 2024-08-12 11:28
Tercero: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP
Dep. Radicadora: XSubdirección de Planes Maestros
Clase Doc: Interno Tipo Doc: Memorandos Consec:

MEMORANDO

Para: MARTHA MILENA AVILA DE LA HOZ
Subdirección de Planeamiento Local del Centro Ampliado

De: NELSON HUMBERTO GAMBOA BARACALDO
Subdirección de Planes Maestros

Fecha: 09 de agosto de 2024

Radicado: N/A.

Asunto: Solicitud Fondo de Desarrollo Local de Chapinero en la instancia de coordinación denominada Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos.

Estimada Arquitecta Martha Milena,

El Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. es una instancia de coordinación distrital creada mediante el Decreto Distrital 550 de 1998 «*Por el cual se crea el Comité Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones*», modificada por el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 307 de 1999, así como por el Decreto 286 de 2002 y 327 de 2019.

En el Decreto 327 de 2019, se señala que la Secretaría Técnica del «*Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital*», está a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, y de acuerdo con la Resolución SDP 1489 de 2023 se encuentra delegada a la Subdirección de Planes Maestros.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, nos permitimos informar que en la sesión N°. 29 realizada el 08 de agosto de 2024, el Ingeniero Jorge Abreo Reyes de la Alcaldía Local de Chapinero efectuó solicitud a la Secretaría Distrital de Planeación para delegar un funcionario de la Subdirección de Planeamiento Local del Centro Ampliado a las reuniones que se citarán en torno a la declaratoria de espacio público para el segmento con código de identificación vial - CIV: 2001250. Al respecto, es importante mencionar que se presentó como antecedente la comunicación expedida con radicado 2-2024-42632 del 18 de julio de 2024.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.*



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 2
Anexos:
No. Radicación: 3-2024-28144 No. Radicado Inicial:
XXXXXXXXXX
No. Proceso: 2400866 Fecha: 2024-08-12 11:28
Tercero: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP
Dep. Radicadora: XSubdirección de Planes Maestros
Clase Doc: Interno Tipo Doc: Memorandos Consec:

Teniendo en cuenta lo indicado, se solicita delegar un profesional de su subdirección para efectuar acompañamiento a las mesas de trabajo que sean programadas por la Alcaldía Local.

Finalmente, se remiten datos de contacto de los funcionarios del Fondo:

- Jorge Enrique Abreo Reyes.
- Correo electrónico: jorge.abreo@gobiernobogota.gov.co
- Celular de contacto: 322 9453218.
- Jaime Hernando Prieto Pérez.
- Correo electrónico: jaime.prieto@gobiernobogota.gov.co
- Celular de contacto: 314 2830611.

Cordialmente,

Nelson Humberto Gamboa Baracaldo
Subdirección de Planes Maestros

Proyectó: Paola Andrea Gámez T.

Subserie 2131-2.14

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.*
