

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 32 de 2024**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 29 de agosto de 2024**

**HORA: 07:30 am a 8:30 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Liliana Chaparro	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Bertha Liliana Torres M.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sandra Palacios Sanabria	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sara Juliana Delgado	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Yira Bolaños Enríquez	Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E)	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-26014

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nicolás Andrade Duque	Profesional Claro Colombia	Claro Colombia	X		
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416
Alexandra Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Mauricio García	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Diego Armando Jiménez Bayona	Profesional FDL de Bosa	Alcaldía Local de Bosa	X		

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Frank Jamir Cuadros Guataquira	Profesional FDL de Kennedy	Alcaldía Local de Kennedy		X	

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

### **ORDEN DEL DÍA:**

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (31 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

### **DESARROLLO:**

#### **1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión N°. 32 de 2024.

#### **2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión treinta y dos (32) del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

#### **3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES**

Se programó con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Bosa y Kennedy, a continuación, se inicia su participación:

##### **3.1 Alcaldía de Bosa – Diego Armando Jiménez Bayona:**

Se solicita un enlace con IDPC para adelantar gestión de intervención de andenes que son considerados patrimonio y no ha sido posible avanzar al respecto, por lo cual han tenido que ser excluidos de varios contratos de obra.

**Respuesta IDU – Liliana Torres:** Se informa que el IDPC no hace parte del Comité, no obstante, desde el Instituto de Desarrollo Urbano con la Oficina de Gestión Ambiental se buscará un contacto para que realice comunicación con FDL.

**Intervención IDU – Jaime Bermúdez:** Se realizará la gestión expuesta por la profesional Liliana Torres, no obstante, se recomienda que como en cualquier etapa del ciclo de vida de un proyecto, se solicite formalmente (por escrito) un delegado para la situación expuesta por el FDL de Bosa.

### 3.2 Alcaldía de Kennedy – Frank Jamir Cuadros Guataquira:

Se solicita intervención de Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, sin que se presente delegado.

## 4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (31 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 22 de agosto de 2024, correspondiente a la sesión número 31 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se presentaron observaciones.

También se menciona, que **el acta 27** se encuentra publicada en la página Web de la Secretaría Distrital de Planeación, mientras que **las actas 28, 29 y 30** se encuentran en trámite de firma en el IDU. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
3	01/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
4	08/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
5	15/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
6	22/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
7	29/02/2024	X	X	X	X	3-2024-11328	21/03/2024	Publicado en página web.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
8	07/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
9	14/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
10	21/03/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
11	04/04/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
12	11/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
13	18/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
14	25/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16391	8/5/2024	Publicado en página web.
15	02/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18159	27/5/2024	Publicado en página web.
16	09/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18601	06/06/2024	Publicado en página web.
17	16/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
18	23/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
19	30/05/2024	X	X	X	X	3-2024-20615	20/6/2024	Publicado en página web.
20	06/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21201	28/6/2024	Publicado en página web.
21	13/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21311	28/6/2024	Publicado en página web.
22	20/06/2024	X	X	X	X	3-2024-22571	10/7/2024	Publicado en página web.
23	27/6/2024	X	X	X	X	3-2024-23136	10/7/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE II	X	X	X	X	3-2024-26366	2/8/2024	Publicado en página web.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
24	04/07/2024	X	X	X	X	3-2024-24411	22/7/2024	Publicado en página web.
25	11/07/2024	X	X	X	X	3-2024-26764	2/8/2024	Publicado en página web.
26	18/07/2024	X	X	X	X	3-2024-27253	2/8/2024	Publicado en página web.
27	25/07/2024	X	X	X	X	3-2024-28146	15/8/2024	Publicado en página web.
28	01/08/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En proceso de firma en el IDU.
29	08/08/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En proceso de firma en el IDU.
30	15/08/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En proceso de firma en el IDU.

## 5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la ingeniera Bertha Liliana hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

### 5.1 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se revisaron los temas sobre los cuales se tenía seguimiento, por lo cual se informa:

- **Caso 39:** Se solicita información respecto a avances realizados.

**Respuesta EAAB-Zona 2 – Wilson Porras:** Se está realizando reparación de equipo CCTV para avanzar con verificación de la red de la KR 4 con CL 55, y tomar decisiones pertinentes sobre intervención.

- **Caso 95:** Se solicita información al respecto de la verificación con CCTV.

**Respuesta EAAB-Zona 1 – Mauricio Mahecha:** Se informa que continua pendiente verificación con CCTV.

- **Caso 108:** Se informa que fue atendido, por lo cual se solicita cierre.

### 5.2 SDP – Paola Andrea Gámez Tabimba:

- **Caso 169 (nuevo):** Para ENEL, se solicita mesa de trabajo para revisar áreas de cesión de la Avenida Laureano Gómez a la altura de la Avenida Polo, donde se ubica el Plan Parcial 13 – Codensa en el Plan Zonal del Norte – Ciudad Lagos de Torca, ya que es necesario consolidar perfiles viales, teniendo en cuenta el desarrollo de proyectos de

infraestructura sobre el sector donde hoy se localiza la SE Torca.

- **Caso 170 (nuevo):** Para ENEL, se solicita realizar mesa de trabajo para consolidar un Shape con información geográfica de los proyectos Bogotá Región 2030, a razón de que sean incorporados en una geodata base de la SDP, en la cual se pueda realizar identificación de los proyectos planteados en el sistema de servicios públicos de la estructura funcional y del cuidado, por lo cual es importante contar con la información geográfica de los proyectos que desarrolle ENEL.

### 5.3 EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López

Se indica que en el barrio Santa Ana se encuentra presente una reserva sobre un tramo que es necesario que sea intervenido por la EAAB, por lo que no ha sido posible acceder a la vía. Por lo anterior, se solicita apoyo del IDU para resolver la situación de la Entidad que tiene a cargo dicho segmento.

**Intervención IDU – Liliana Torres:** Se revisará el tema con la dependencia de la Doctora Sully Magalis Rojas para verificar el tema de reservas.

#### NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:

De acuerdo con reporte realizado en chat de WhatsApp de la instancia de coordinación, se realiza cierre del **caso 140**.

## 6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4	Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz "Silencio – Casablanca" de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	EAAB – Red Matriz	<b>IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6:</b> Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	<b>Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6:</b> Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	<b>ENEL – Mauricio Arenas en acta 06:</b> Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.
23	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.	IDU	<b>Intervención IDU – Angélica López en acta 06:</b> Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.
25	Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	EAAB - Zona 1	<b>Pendiente</b>
26	Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	<b>Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07:</b> Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB. IDU- Onisalba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU, que la EAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como desvío la misma Avenida y que en ese sentido los huecos, posiblemente se han generado por esos desvíos sin que sean exactamente intervenciones como tal para las obras que se adelantan.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
28	<p>Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros.</p> <p>Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.</p>	MOVISTAR	Pendiente
29	<p>Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.</p>	EAAB - Zona 1	Pendiente
36	<p>En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva.</p> <p><b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Corrección de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio público costado norte.</p>	EAAB - Zona 1	<b>Pendiente</b>
39	<p>Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.</p>	EAAB - Zona 2	<p><b>Acta 22, EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:</b> Para dar continuidad al caso 39 se debe realizar inspección con CCTV, desafortunadamente en este momento el equipo se encuentra fuera de servicio, actualmente se está a la espera de los repuestos para su reparación, y continuar con las actividades programadas en este sector. Se remite el 24/06/2024 registro fotográfico de sectores sobre carrera 4 que ya tuvieron recuperación de espacio público.</p>
43	<p>Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.</p>	ENEL COLOMBIA	<p><b>Sesión 11 - ENEL – Mauricio Arenas:</b> Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días.</p> <p><b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Se están adelantando las gestiones y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.</p>

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.	ENEL COLOMBIA	<p><b>En sesión 21</b>, se reitera el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL CODENSA, donde se requiere instalación del barraje necesario para la energización del parque en el cual ya se encuentran terminadas las obras requeridas y solicitan a ENEL la instalación para poder liquidar el contrato ya que este no es posible sin que el parque tenga la iluminación verificada. Ya se ha notificado a ENEL desde agosto del 2023, pero no han obtenido respuesta.</p> <p><b>Intervención ENEL CODENSA – Mauricio Arenas:</b> Respecto a la energización del parque, indica que ENEL fue a hacer la revisión de la obra encontrando que las cámaras tienen las tapas soldadas por lo que no fue posible la inspección de la ductería, ni realizar las respectivas validaciones que la compañía debe hacer, se solicitó al área encargada si es posible desoldar para hacer la revisión y realizar la energización lo más pronto posible. Indica que la energización se realiza de una subestación localizada en un conjunto residencial pero que en los documentos aportados no llegó la carta de autorización para obtener el ingreso al conjunto para poder hacer la revisión y la energización cuando corresponda.</p>
49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.	ENEL COLOMBIA	<p><b>En sesión 21</b>, se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzú el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, en donde se había identificado que el problema era un tema con el medidor.</p> <p><b>Respuesta ENEL CODENSA – Mauricio Arenas:</b> Se solicita de igual manera revisar el tema a las 2:00 pm.</p>
53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	<p><b>En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras:</b> Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento.</p> <p><b>Wilson Porras informa en sesión 16:</b> Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección.</p> <p><b>En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq. Carmen Rocío López a Juan Carlos López.</b></p>
54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	EAAB - Zona 2	<p><b>Wilson Porras informa en sesión 16:</b> Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.</p>

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
69	<p>Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales.</p> <p>Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.</p>	Alcaldía Kennedy	<b>Pendiente</b>
77	<p>Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad.</p> <p><b>De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.</b></p>	Alcaldía Suba	<b>En sesión 19 IDU indica</b> , se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.
78	<p>Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.</p>	EAAB – Red Matriz	<p>Caso reportado desde 2023.</p> <p><b>Nubia Riaño informa en sesión 14:</b> Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos.</p> <p><b>SESIÓN 28:</b></p> <p><b>ETB - Carmen Rocío López informa:</b> El Ingeniero Juan Fernando solicita escalonamiento al comité, teniendo en cuenta que no ha sido posible agendar una reunión con la Ingeniera Nubia Riaño, ya que se han enviado correos de fecha 18 y 25 de junio para retomar la reparación de la cámara del sector de la calle 26 con avenida carrera 68, sin respuesta alguna.</p> <p><b>Intervención EAAB – Red Matriz – Nubia Riaño:</b> Se está reprogramando la visita con el área de mantenimiento, en el transcurso de esta semana se comunicará agendamiento. Se toma nota del número de celular del ingeniero de ETB para realizar contacto.</p>
79	<p>Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.</p>	EAAB - Zona 3	<b>Pendiente</b>
91	<p>Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.</p>	ENEL COLOMBIA	<b>Pendiente</b>
92	<p>Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).</p>	VANTI GAS NATURAL	<b>Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García:</b> Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
95	Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	<b>En acta 19, IDU señala</b> que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.
97	Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.	MOVISTAR	<b>En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña:</b> Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.
98	Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
111	Para Movistar, se solicita respuesta de la petición con radicado 20240419105915900 del 24 de abril de 2024.	MOVISTAR	Pendiente
112	Para IDU, presenta situación pendiente relacionada con la construcción del cable aéreo San Cristóbal del contrato IDU 1167 de 2023, para su ejecución se tuvieron que demoler en cada estación 2 manzanas, las estaciones objeto de consulta son “La Victoria” y “Altamira”, donde se demolieron predios, pero el IDU no ha generado cierre de las cuentas contrato, de las mismas se está contabilizando consumo. Por lo anterior, se solicita al IDU pronunciamiento, y que como se ha requerido realice los cierres de las cuentas.	IDU	Durante el día 06 de junio de 2024, el Ingeniero Álvaro Reinoso remite correo electrónico a la Dirección Técnica de Predios informando la situación presentada sobre el sector, para realizar la debida suspensión del servicio. <b>Acta 23 - EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:</b> Se solicita información al IDU respecto de la petición de suspensión de servicio sobre manzanas que fueron adquiridas mediante compra de predios para construcción de proyecto de cable aéreo. <b>Acta 23 - IDU – Álvaro Reinoso:</b> Se remitió correo informando el caso el 06 de junio, no obstante, se continuará gestión con profesional Mateo Grajales, a su vez Lilibian Torres puede generar un apoyo escalando tema a interior del IDU.
114	Para EAAB-Red Matriz, se solicita visita técnica de la EAAB en la Avenida Ciudad de Villavicencio con calle 65 sur (se requiere verificar dirección) teniendo en cuenta que se presentan empozamientos posiblemente por causa de las redes, y este corredor vial fue intervenido hace poco mediante contrato de conservación IDU.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
115	Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.	EAAB - Zona 2	<b>Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras</b> informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
116	Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	EAAB – Red Matriz	<b>En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño:</b> Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.
123	Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de "paz y salvo".	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
124	Para ENEL, se solicita reposición de tapas de cajas de inspección, las cuales fueron reportadas a la ESP mediante consecutivo 657851 del 23 de noviembre de 2023	ENEL COLOMBIA	<b>Acta 23 - ENEL – Jorge Mauricio Arenas:</b> Se toma nota del número de radicado y se verificará internamente, ya que la reposición de tapas es un tema de atención urgente por la generación de posibles accidentes. Se remite vía chat información de contacto para comunicarse directamente con profesional del Fondo de Desarrollo Local.
127	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una solicitud en la calle 162 entre carrera 54 y 55, donde se evidencia un posible daño de redes, se solicita realizar visita conjunta.	EAAB - Zona 1	Pendiente
134	Para EAAB, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, hay unas cajas en algunos tramos donde se está ejecutando que requieren intervención, por lo cual se solicita acompañamiento técnico de la ESP, al momento se ha intentado realizar contacto con el Ingeniero Mauricio Mahecha sin que se haya logrado gestionar, se han programado visitas sin llegar a realizarse.	EAAB - Zona 1	Pendiente
135	Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	MOVISTAR	Pendiente
136	Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.	EAAB - Zona 2	Pendiente
138	Para EAAB-Zona 1, se presenta socavación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 12, costado sur, en el área aferente se observa pozo del sistema de alcantarillado, es posible que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección y de ser el caso, la debida atención de la EAAB.	EAAB - Zona 1	Pendiente
142	Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.	VANTI GAS NATURAL	<b>Acta 26: Alexandra Rojas</b> solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
145	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender hundimiento reportado en la AC 3 frente a placa 51A-10.	EAAB - Zona 3	Pendiente
146	Para EAAB-red matriz, se reporta daño en la carrera 70C (Avenida Ciudad de Villavicencio) con calle 63 sur, se solicita verificar estado de redes.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
147	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.	EAAB - Zona 3	Pendiente
148	Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y generar las medidas pertinentes para atender daño.	EAAB - Zona 2	<b>Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras:</b> Se realiza verificación frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado lateral occidente, en línea con red. Se verifica pozo aguas abajo en la KR 16A con calle 79 y se encuentra drenando con normalidad, se verifica pozo aguas arriba en la KR 16A con calle 78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad.
149	Para UAERMV, caso reportado en el chat de WhatsApp del comité el día 29 de julio de 2024, se relaciona con hueco en la calle 8B N°. 80C-09, barrio Castilla, el cual presenta alto riesgo para la comunidad, se solicita su atención.	IDU	<b>Acta 28 - EAAB – Zona 5 – Javier Patiño:</b> Se informa que, verificado el sector, no hay daño de redes asociado a deterioro de calzada. <b>Acta 29 - 5.2 UAERMV – Humberto Ramírez:</b> La UAERMV hizo visita, en la misma se verificó que dicho sector fue intervenido por el IDU en enero 16 de 2023, por lo cual se requiere verificar garantías, se solicita reasignar caso.
151	Para SDA, corresponde a un permiso silvicultural, a pesar de que algunas intervenciones son sobre calzada, y son de conservación, se requirió este trámite en marzo, contando con respuesta hasta julio. A la fecha se subsanó lo requerido y se está a la espera de la expedición del permiso para dar apertura a los frentes de obra. Se relacionan los siguientes radicados: 2024ER66489, 2024ER102985 (BTE 2601262024) y 2024ER152450.	SDA	<b>Acta 29 - Intervención SDA – Sandra Palacios:</b> Se verificó en el sistema, encontrando que la solicitud se encuentra en trámite, por tanto, se gestionará internamente con la subdirección de silvicultura.
153	Para ENEL Colombia, el contratista hizo una solicitud de traslado de dos postes ubicados en la mitad de la calzada, en el sector Mariscal Sucre, teniendo en cuenta que el límite de la intervención corresponde a los CIV 2001977 y 2001969, por lo cual se requiere comunicación y colaboración de ENEL, teniendo en cuenta que ya se pagó la factura desde el 18 de junio, pero no se ha programado la maniobra. Se relacionan los siguientes consecutivos: 00731057, 00816096 y 611181811.	ENEL COLOMBIA	<b>Acta 29 - Intervención ENEL – Mauricio Arenas:</b> Se solicita confirmar número de oferta y remitir soporte a correo electrónico para realizar seguimiento y gestionar al interior de la ESP. Se remite vía chat de la reunión, la dirección de e-mail para recibir información correspondiente.
155	Para IDU, respecto de la demolición de predios en proyectos IDU, se requiere avanzar con el cierre de las cuentas contrato, previamente se había expuesto en el caso 112, no obstante, no es exclusivo de cable aéreo San Cristóbal, sino de otros dos proyectos (Transmilenio AK 68 – Avenida Congreso Eucarístico y, sobre la Avenida Caracas). Para el caso 112, algunos avances se han dado, pero no ha sido posible gestionar con otros proyectos, por lo anterior, se solicita realizar mesa de trabajo entre EAAB (Dirección Comercial) e IDU (Dirección Técnica de Predios).	IDU	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
156	Se informa que se tienen pendientes cierre de pines con la Secretaría Distrital de Ambiente, por lo cual remitirá al correo de la profesional Sandra Palacios la información pertinente para que apoye la gestión al respecto. Se adjunta correo al acta. Número de pines: 24605, 24327, 22362, 23130, 23082 y 24596.	SDA	Se remitió correo el 08 de agosto de 2024 con archivo que relaciona pines ambientales y su estado.
157	Se trae a la mesa de trabajo un proyecto del barrio "Nueva Gloria" que se encuentra relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue reservado por el IDU para intervención del tipo reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para atención prioritaria por emergencia, petición que fue aprobada. El segmento efectivamente fue intervenido con maquinaria amarilla en la zona más crítica, sin embargo, teniendo en cuenta que el IDU va a excluir el segmento, y este se encuentra bastante afectado en su totalidad y es bastante largo. La Alcaldía Local propone intervenir el segmento completamente, pero se solicita que el IDU entregue los estudios y diseños que se hicieron para el tramo vial, o se informe si los diseños iban a ser ejecutados por el contratista. De esta manera se incluirá dentro del contrato de conservación que se está formulando, y que próximamente se publicará para contratación. Se estarán enviando las reservas viales al IDU de este próximo proyecto, por lo cual se solicita también información de contacto, para agilizar y hacer seguimiento a este proceso.	IDU	<b>Intervención sesión 30 IDU – Liliana Torres:</b> Se revisará el tema al interior del Instituto, se dará respuesta de manera pertinente a la Alcaldía Local. En adición, se envía al chat de Google Meet la información de contacto para hacer seguimiento al tema de las reservas cuando sea radicado por el Fondo.
158	Para ENEL, en la Av. Ciudad de Cali con calle 69B sur, se observa como unos cables ingresan a pozo de alcantarillado y los mandan por la red, se solicita verificar, para que se proceda a su retiro. Es importante mencionar, que al pozo no se le puede poner tapa porque los cables impiden asegurar la tapa, generando un riesgo.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
159	Para ENEL, se remite reporte de tapa en mal estado en la calle 15 # 9-23 coordenadas 4.602832,-74.075433. Se solicita recuperación de infraestructura.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
160	Para SDA, se tiene pendiente cierre de cuatro pines ambientales correspondientes a cuatro contratos de obra que ya se encuentran terminados y se están liquidando: - Pin ambiental 24590 correspondiente al contrato 336/2023 - número Forest 2024ER113704 del 28/05/2024. - Pin ambiental 18452 correspondiente al contrato 173/2019 - número Forest 2024ER125091 del 13/06/2024. - Pin ambiental 22632 correspondiente al contrato 255/2022 - número Forest 2024ER127558 del 17/06/2024. - Pin ambiental 22779 correspondiente al contrato 262/2022 - número Forest 2024ER144691 del 10/07/2024.	SDA	Pendiente
161	Para ENEL, se tiene pendiente la instalación de un barraje para la energización del Parque El Tunal II, el contratista de obra terminó las intervenciones que vería hacer, se han realizado varias visitas con el Ingeniero Arenas, pero no se ha concretado la instalación del barraje. Actualmente el contratista está requiriendo la liquidación inmediata del contrato ya que los retrasos no son atribuibles a su gestión, y ya se tienen varios derechos de petición radicados al FDL.	ENEL COLOMBIA	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
162	Para ENEL, se solicita el traslado de postes del contrato 316 de 2023, el contratista identificó el traslado de cinco monopolos, ya se efectuó la cotización en 2023 pero no se ha podido adelantar gestión, entonces se solicita actualizar dicho documento, adicionalmente se ha requerido traslado de otra infraestructura, por lo cual se radicó documento con consecutivo 20245620113591 (Radicado ENEL 000545731). Se requiere respuesta y gestión al respecto.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
163	Para EAAB-Zona 5, se está ejecutando el contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal en el barrio Villa. Alemania, por lo cual se solicitó el servicio provisional de obra, la EAAB respondió el 16 de julio indicando que se haría visita al predio, y que después de la visita se debería enviar la documentación correspondiente. Por lo cual, se solicita agilizar visita. El radicado de la EAAB es E-2024-068896. Peticiones 3431003- S-2024-222290, visita con aviso 8062450430.	EAAB - Zona 4	Pendiente
164	Para EAAB-Zona 5, se ejecutó en el año 2016 la construcción del salón comunal del barrio Boulevard del sur, por lo que fue requerido durante la actual vigencia al presidente de la junta de acción comunal tramitar la acometida definitiva, se solicita indicar el procedimiento a seguir desde la Alcaldía Local para atender dicho requerimiento.	EAAB - Zona 4	Pendiente
166	Para EAAB-Zona 4, se solicita atender peticiones realizadas desde el contrato de obra 608 de 2023 relacionado con la ejecución de malla vial, ya que se han presentado algunas situaciones que requieren gestión con la ESP. Radicados: E-2024-10029396, E-2024-10047781, E-2024-10048788.	EAAB - Zona 4	Pendiente
167	Para ENEL, se solicita respuesta a requerimiento para traslado de postes en obra del barrio El Virrey. Enel Radicado Número 20245520362661 del 21-08-2024.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
168	Para EAAB – Zona 1, se solicita recuperación de espacio público en la carrera 7 con calle 100, calzada oriental.	EAAB - Zona 1	Pendiente
169	Para ENEL, se solicita mesa de trabajo para revisar áreas de cesión de la Avenida Laureano Gómez a la altura de la Avenida Polo, donde se ubica el Plan Parcial 13 – Codensa en el Plan Zonal del Norte – Ciudad Lagos de Torca, ya que es necesario consolidar perfiles viales, teniendo en cuenta el desarrollo de proyectos de infraestructura sobre el sector donde hoy se localiza la SE Torca.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
170	Para ENEL, se solicita realizar mesa de trabajo para consolidar un Shape con información geográfica de los proyectos Bogotá Región 2030, a razón de que sean incorporados en una geodata base de la SDP, en la cual se pueda realizar identificación de los proyectos planteados en el sistema de servicios públicos de la estructura funcional y del cuidado, por lo cual es importante contar con la información geográfica de los proyectos que desarrolle ENEL.	ENEL COLOMBIA	Pendiente

### 6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
-Casos presentados	170	100,00%

Vigencia	2024	Balance
-Casos resueltos al corte	109	64,12%
-Casos pendientes al corte	61	35,88%

## 7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

### 7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver dos (02) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 108 y 140, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

### 7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p><b>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b></p>
<p><b>Síntesis:</b> Se lograron resolver dos (02) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 108 y 140, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.</p>	

Icono	Decisión
	<p><b>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</b></p>
<p><b>Síntesis:</b> Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, especialmente ENEL, EAAB – Zona 1 y EAAB – Red Matriz.</p>	

## 8 COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 05 de septiembre de 2024
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 05 de septiembre de 2024
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 05 de septiembre de 2024

## 9 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número treinta y dos (**32**) del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 05 de septiembre de 2024 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,

  
**JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ**  
**PRESIDENTE**

  
**PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA**  
**SECRETARIA**

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba– SDP.

Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.

William Fernando Chávez – IDU.

Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.


Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 32 de 2024.

2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 32 de 2024.


Subserie 2131-2.14

Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO


## Número de casos registrados por mes



## Número de casos resueltos por mes

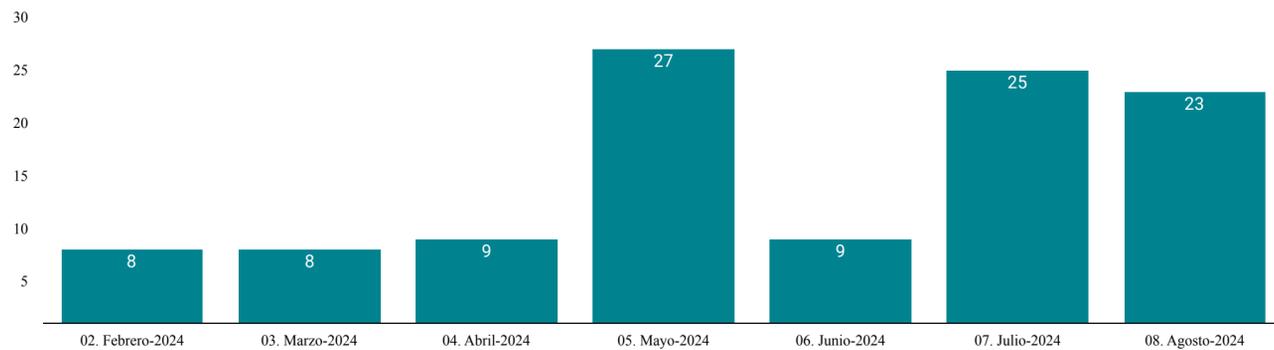

## Número de casos pendientes por mes

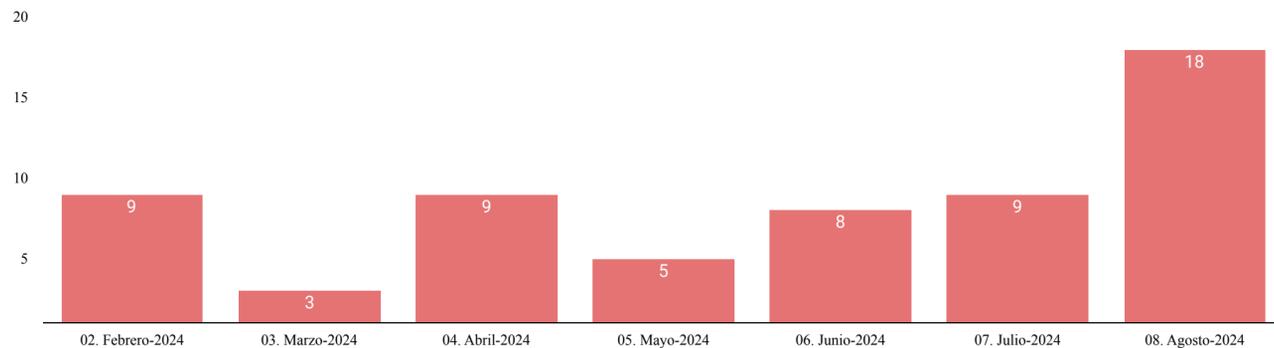

## Recuento de casos

Nº. DE CASO	MES REP...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	ESTADO DEL CASO
1	01. Enero-2...	Para ENEL, se solicita que se revis...	ENEL COLOMBIA	Alta	ATENDIDO
2	01. Enero-2...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
3	02. Febrero-...	Se informa sobre las afectaciones ...	IDU	Normal	ATENDIDO
4	02. Febrero-...	Para la EAAB – Red Matriz, se ex...	EAAB – Red Matriz	Alta	PENDIENTE
5	02. Febrero-...	Para la EAAB, en la CL 28 con K...	IDU	Alta	ATENDIDO
6	02. Febrero-...	Para el IDU, solicita reunión para t...	IDU	Normal	ATENDIDO
7	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, En Carrera ...	EAAB - Zona 5	Normal	ATENDIDO
8	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
9	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
10	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo...	EAAB - Zona 4	Normal	ATENDIDO
11	02. Febrero-...	Para ENEL, en la calle 13 por Carr...	ENEL COLOMBIA	Normal	PENDIENTE
12	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
13	02. Febrero-...	Para Alcaldía de Puente Aranda, se...	Alcaldía Puente Aranda	Normal	ATENDIDO
14	02. Febrero-...	Se solicita realizar revisión con un...	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
15	02. Febrero-...	Para ETB, en la calle 47 con carrer...	ETB	Alta	ATENDIDO
16	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero...	EAAB - Zona 3	Normal	ATENDIDO

Casos registrados

170



Nº. Casos Resueltos

109



Nº. Casos Pendientes

61




Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

## Porcentaje de avance

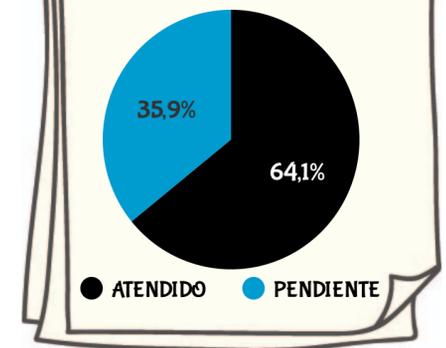

## TOP – Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	37
2. IDU	20
3. EAAB - Zona 1	15
<b>Total</b>	<b>169</b>


## TOP – Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	21
2. IDU	14
3. EAAB - Zona 2	9
<b>Total</b>	<b>108</b>


## TOP – Entidades con casos pendientes

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	16
2. EAAB - Zona 1	8
3. EAAB - Red Matriz	7
<b>Total</b>	<b>61</b>

### Número de casos registrados por mes

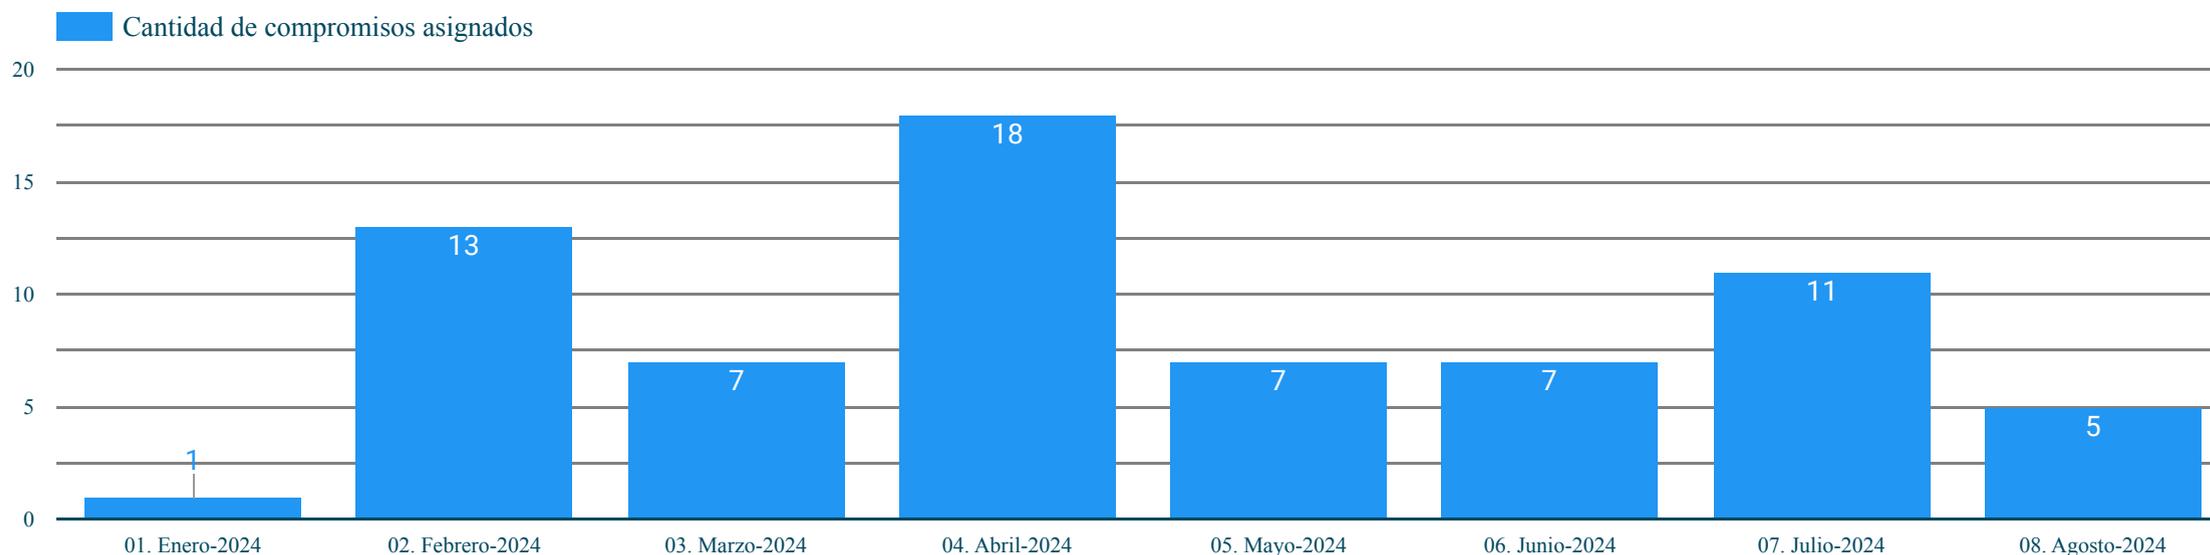

### Número de casos por zona o área pendientes

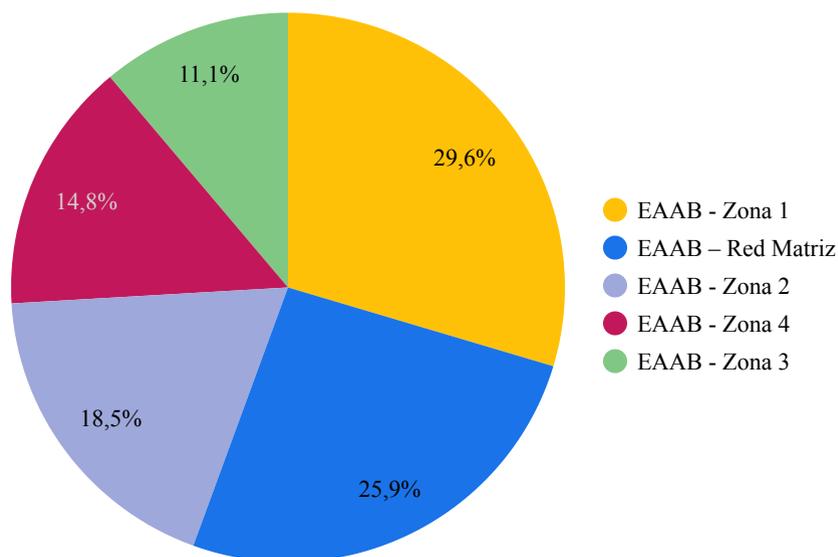

ESTADO DEL...	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.
ATENDIDO	18	Para EAAB - Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?
ATENDIDO	106	Para EAAB - Zona 2, sobre la calle 85 con carrera 15 se solicita recuperación de espacio público.
ATENDIDO	12	Para EAAB - Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.



# Casos: Enel Colombia SA ESP


COMPROMISOS ASIGNADOS

37

COMPROMISOS ATENDIDOS

21


## Número de casos registrados por mes

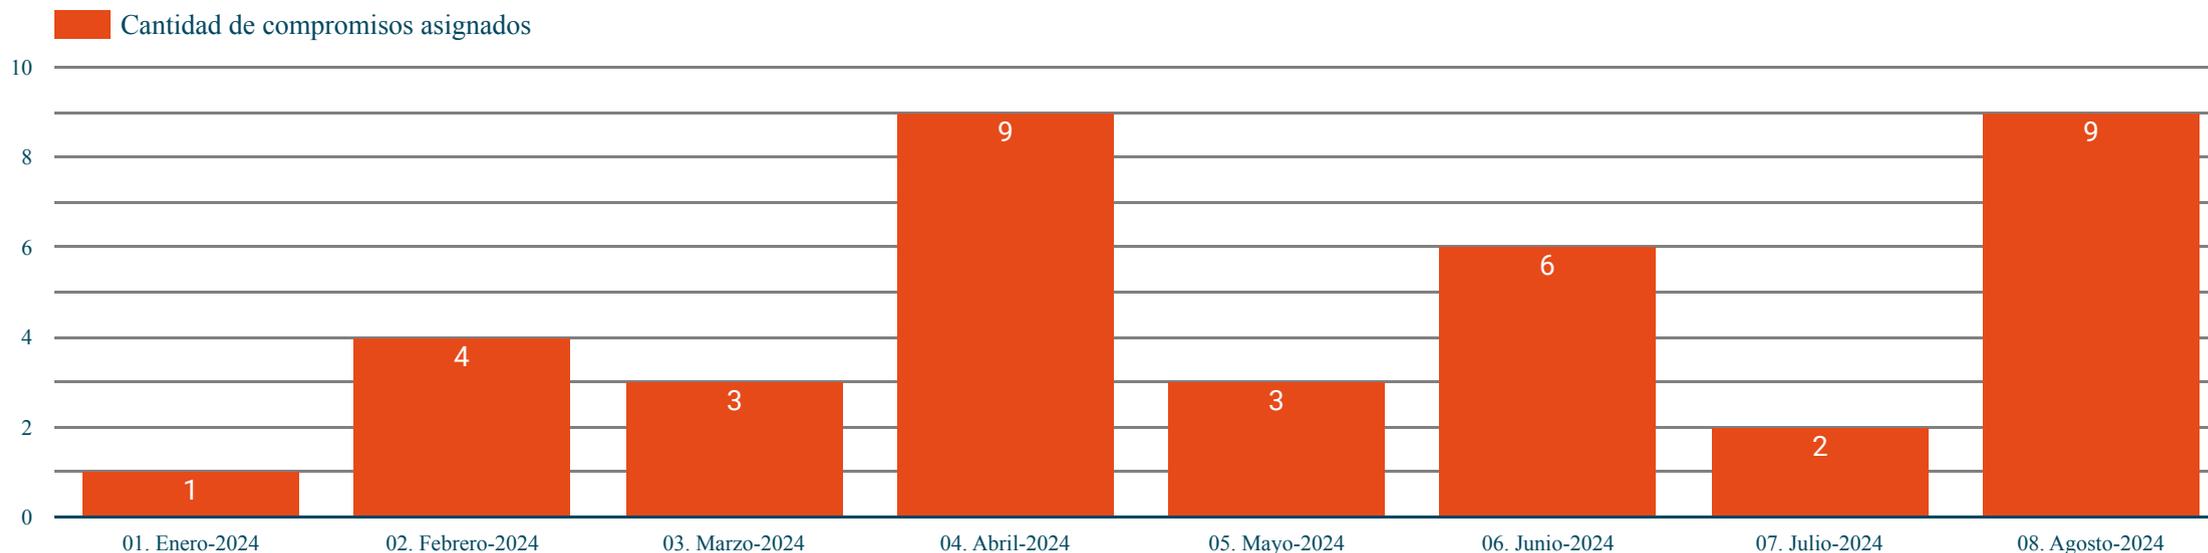

ESTADO DEL CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	120	Se informa afectación sobre la Calle 80 N°. 69H-20, que de acuerdo con reporte recibido se ubica infraestructura de la ESP – Enel Colombia SA ESP, por lo cual, se solicita recuperación de calzada y realizar acciones pertinentes.
ATENDIDO	46	Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de “paz y salvo” para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700708.
ATENDIDO	133	Para ENEL, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se tiene referencia de un poste con alta inclinación en el barrio Salitre. La comunidad, el contratista y la interventoría han solicitado varias visitas técnicas, sin embargo, la respuesta de ENEL es que no existe riesgo, ya que la infraestructura se encuentra dentro de los parámetros.
ATENDIDO	34	El CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado “diseño local”, se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continua o se puede levantar, en caso de haber ejecutado ya actividades, se solicita indicar a IDU levantamiento de la reserva.
ATENDIDO	35	El CIV 1007204, es una esquina donde se intercepta el anterior segmento vial KR 20 con calle 124, respecto del espacio público asociado aparece reserva a cargo de ENEL para desarrollo del proyecto “diseño local”, también con reporte del año 2018, se solicita informar estado



**Número de casos registrados por mes**

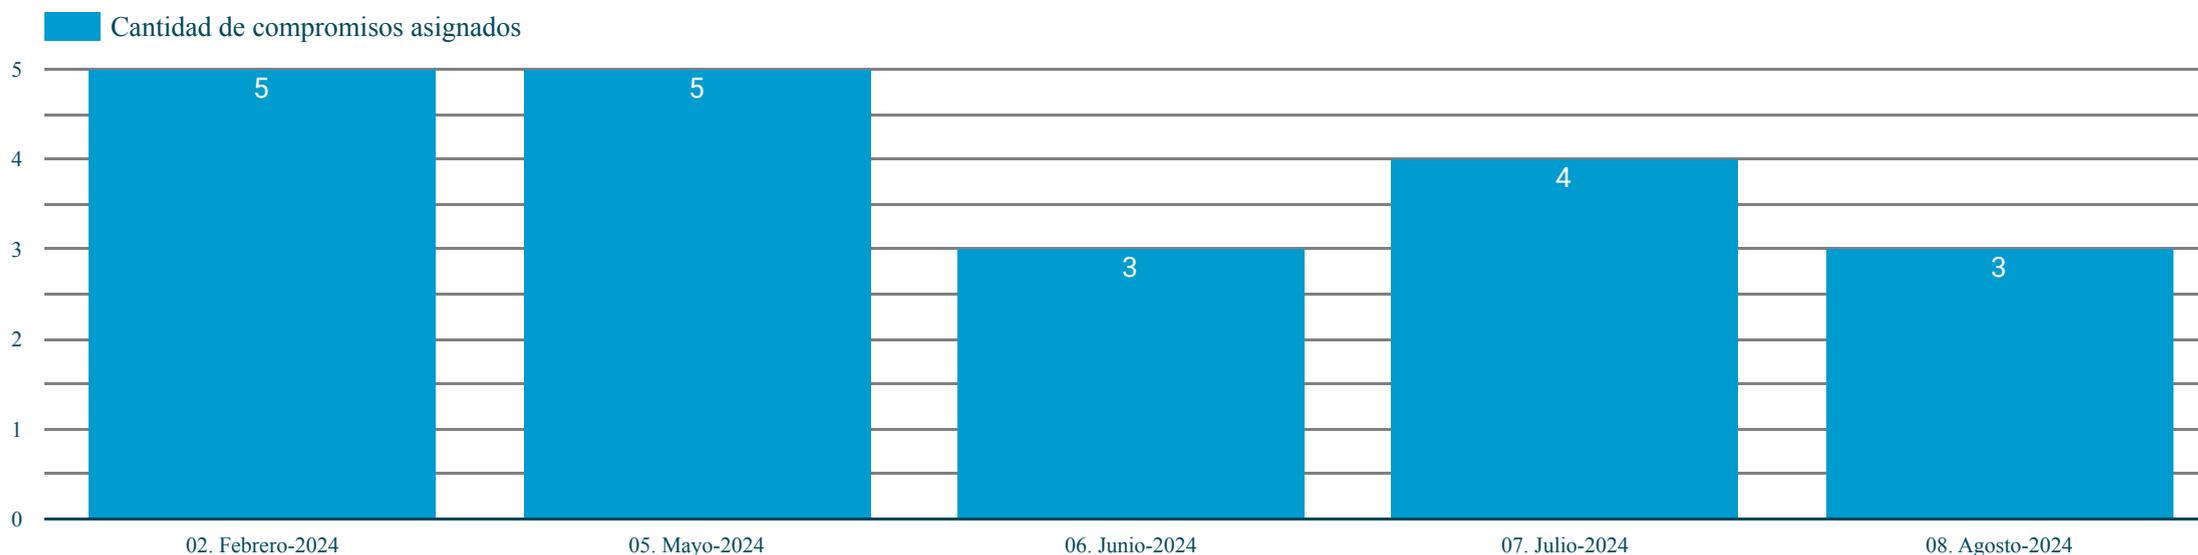

ESTADO DEL CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.
ATENDIDO	3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad.  Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.
ATENDIDO	83	Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.
ATENDIDO	86	Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio "El Paraíso", que por remodelación se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al

## COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N.º DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉ PRESENTÓ EL CASO?	N.º SESIÓN PRESENTACION DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N.º SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	1	Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NCS con calle 92, se presenta un inconveniente respecto al estado de la vía, se está afectando la movilidad y se requiere un mantenimiento. A su vez, se solicita que se realice la limpieza de la Malla Diagonal de Moravia, y en lo que se obtiene respuesta, por lo cual se hace la actualización de coordinación, por lo cual, se solicita a Oscar Escobar (delegado de ENEL) que emita reportes y realice los gestiones pertinentes para solucionar este caso.	IDU	02 - Enero 25 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	11 - Abril 4 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-0001.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-0002.jpg</a>	Pendiente desde 2023. ENEL Colombia envía informe en sesión 10. En el momento de la cámara de la NCS, se está a la espera todavía que se sepa el permiso por parte de la entidad de movilidad, pero que hasta el momento, el fotograma sigue considerando para darle inicio a las obras, el 27 de marzo de 2024.	04. Abril-2024
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	2	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 418 sur 74.65 en el barrio Timiza - 9 sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía total/delimitado problemático por problemas de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelantaran las acciones pertinentes.	IDU	02 - Enero 25 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Padilla	ATENDIDO	08 - Marzo 07 de 2024	8. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-0003.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-0004.jpg</a>	Ingeniero Javier Padilla informa en sesión 08: Se efectuó inspección de CCTV en el sector, no se encontraron problemas estructurales en redes, por lo cual, se concluye que se encuentran trabajos en condiciones normales. Por lo tanto, se descarta hardware producido del sistema de alertamiento. Por lo cual, se recomienda que el programa sea intervenido por parte de una Entidad, como AUSA o UAERNAV, se sigue video de CCTV a su disposición.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETE, teniendo en cuenta que las áreas del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando videos cortados por el alto nivel de inestabilidad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se realice mediante coordinación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para mitigar la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la vía de inestabilidad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, recomendando de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.	ETB	03 - Febrero 14 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	ATENDIDO	25 - Julio 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de cables y andares sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0001.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0002.jpg</a>	Alvaro Roldán en sesión 03 informa: Se efectuó a solicitud de ETE inspección a cables en las obras IDU, se halló la causa y el estado de la línea de Coordinación Interentidad indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETE que informe en calidad orden y que dicho se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETE para darle respuesta. Carmen Roldán López en sesión 3 indica: Se hace la aclaración respecto al tema del dicho sobre las redes expuestas en el comité pasado, refiriendo que el comportamiento de las redes expuestas en el IDU como a nivel de gestión como AUSA.	07. Julio-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	4	Para la EAAB – Red Matiz, se expone un daño grave en la Av. Villavieja entre CL 628 y CL 52C cabada derecha, además a Rotación al peaje en una cámara de la red matriz – Caballero, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N.º 1657 de 2002 pero por los daños de Rotación en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructura. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la LAMV o el IDU reparen el sector.	LMV	03 - Febrero 14 de 2024	EAAB - Red Matiz	Nidia Riano	PENDIENTE	PENDIENTE	8. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0003.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0004.jpg</a>	IDU - Angélica Tatiana López Figueroa en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la CAAS-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Consejo de Bogotá, por lo cual, se solicita intervención oportuna en la Asesoría Villavieja entre CL 628 y CL 52C.	07. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	5	Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la cabada, la cual quedó sin reparar. Se solicita pronta actuación.	LMV	03 - Febrero 14 de 2024	IDU	Orisabá Segura	ATENDIDO	28 - Agosto 01 de 2024	8. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0005.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0006.jpg</a>	Acta 04-2024: EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Al mismo tiempo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin ninguna evidencia de fuga de agua, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERNAV o IDU.	06. Agosto-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	6	Para el IDU, solicita revisión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	EAAB - Zona 4	03 - Febrero 14 de 2024	IDU	Álvaro Roldán	ATENDIDO	28 - Agosto 01 de 2024	8. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0007.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0008.jpg</a>	Acta 04-2024: EAAB informa que remitió la información al Ingeniero Wilmar Rodríguez. Acta 5-2024: Se informa que el 05 de febrero de 2024 envió al Ingeniero Juan Carlos, el estado de los contratos de acuerdo con el acuerdo con solicitud realizada.	06. Agosto-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	7	Para EAAB – Zona 5, En Carrera 79 (Av Primera de Mayo) por Calle 53 sur CV 800450, peaje de la EAAB con daño en el mismo y convertido en depósito de basuras afectando la movilidad. Registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Padilla	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	8. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0009.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0010.jpg</a>	Acta 6 - 2024 - Respuesta EAAB - Zona 5 - Javier Padilla: Para el Caso 7 de Avenida Primera de Mayo, se efectuó la verificación en terreno y se observó personal de ETE trabajando, se solicita hacer el respectivo direccionamiento a esta Entidad.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	8	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 por Carrera 55D, se observa hongo en pavimento al peaje originado en alto nivel de inestabilidad que presenta la infraestructura de la ESP, registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Malheira	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	8. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0011.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0012.jpg</a>	EAAB Zona 1 reportó mediante el chat de WhatsApp atención del caso 08, por lo cual se da cierre en sesión 17.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	9	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 entre calles 139C y 138 hubo intervención de la EAAB encontrándose pendiente la recuperación de la carpeta asfáltica, registro fotográfico enviado al chat el lunes 5 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Malheira	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	8. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0013.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0014.jpg</a>	Se informa atendido.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Popoy Quimbaya, TV 27 con CL 40 Sur, barrio La Chusca, localidad de Kennedy, se presenta hongo de alta profundidad en el pavimento que por lo bautado en audio de noticia RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta evidente peligro de un hundimiento de mayor proporción.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	08 - Febrero 29 de 2024	8. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0015.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0016.jpg</a>	Pendiente. IDU informa: Que el ingeniero Juan Carlos López remitió registro fotográfico donde se realizó atención de la situación presentada sobre la vía Popoy Quimbaya. EAAB solicita apoyo a la UAERNAV para que se efectúe mejoramiento del pavimento. UAERNAV - Humberto Ramirez indica en sesión 6: Se expone cronología y se realiza una serie de comentarios en torno a la situación que se presentó en el sector, actualmente la UAERNAV se encuentra efectuando las evaluaciones correspondientes en materia de estudios de ingeniería de la conservación de las carreteras.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 88D estructura caja de redes seaca con afectación obstruye el paso en avión afectando peaje a los transientes, enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Corredoramente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantarse las acciones pertinentes.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	8. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0017.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0018.jpg</a>	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	12	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 418 sur 74.65 en el barrio Timiza - 9 sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía total/delimitado problemático por problemas de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelantaran las acciones pertinentes.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Padilla	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	8. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0019.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0020.jpg</a>	El pasado lunes 4 de marzo, se realizó la inspección de CCTV (Acto 201785418) solicitada a través del contrato 1492-2023 solicitado de la Calle 41 Sur desde la Transversal 74 C hasta la Transversal 74 B. A encontrarse la bacteria de 10" en gran sector C6, sin presencia de infiltración de material, únicamente una derivación situada a los 15 metros del punto informado del trazo indicado en el esquema anexo por el Ing. Fanny. Esto nos conduce que las conexiones que se ven sobre la vía RCN son afectadas a la red de alcantarillado.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	13	Para Alcaldía de Puente Aranda, se encontró afectación de la infraestructura de ETE en la Avenida Calle 6 entre las carreras 12 y 40, estado normal, se observa en el sector cableado eléctrico, hay obras, pero no tienen vallado. Se solicita contactar con el fondo de desarrollo local para conocer el número del contrato que generó los daños.	ETB	04 - Febrero 8 de 2024	Alcaldía Puente Aranda	Delgado	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0021.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0022.jpg</a>	Acta 04-2024: IDU indica que se remitió situación vía correo electrónico a delegado de la Alcaldía de Puente Aranda de acuerdo con base de datos de la vigencia 2023. Acta 05-2024: Se solicita dar cierre, toda vez que no hay delegado en la materia por parte de IDU y que ETE realizará la gestión directamente con la Alcaldía Local.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	EAAB	04 - Febrero 8 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0023.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0024.jpg</a>	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	15	Para ETE, en la calle 47 con carrera 7 se reporta fallante de tapa, lo cual puede generar accidentes.	IDU	05 - Febrero 15 de 2024	ETB	Carmen Roldán López	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	8. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0025.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0026.jpg</a>	Se informa atendido, se remitió registro fotográfico vía chat.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	16	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero Juan Rivera indica que en la Avenida Caracas con Calle 3 Sur, se solicita apoyo de la UAERNAV para recuperación del sector intervenciones por la ESP. Por lo cual, se solicita a la EAAB el siguiente: tramitar la liberación de la reserva que tiene el fondo de desarrollo local de Antonio Narino, y tramitar el PNT.	LMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	06 - Febrero 22 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0027.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0028.jpg</a>	UAERNAV - Humberto Ramirez informa que se había recibido solicitud de Juan Rivera de la EAAB, para recuperar espacio público a raíz de una emergencia, la UAERNAV solicitó levantamiento de reserva y PNT aprobado, pero verificado en sitio, se observa que el tiempo ya ha pasado.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	17	Para EAAB – Zona 2, en la calle 60 con Avenida Ciudad de Cali, se presentó daño en estación de Transmisión, el ingeniero Diego Moreno - Gerente del Sistema Masivo solicitó apoyo para recuperación de la cabada. Por lo anterior, se solicita a la EAAB: se libere permiso con Transmisión, y PNT.	LMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0029.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0030.jpg</a>	La redada fue recuperada el lunes 12 de febrero de 2024 a través del contrato de Recuperación de Espacio Público de la Zona 2. Esta información se compartió en el chat del Comité el día 15 de febrero de 2024.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	18	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detuvo operación en cabada, al respecto se pregunta (¿Hay alguna información adicional?)	LMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	08 - Marzo 07 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	<a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0031.jpg</a> <a href="#">https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/02/02/20240202-0032.jpg</a>	Atendido por Ingeniero Francisco Rodríguez	03. Marzo-2024

















