

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2019

Localidad de
Kennedy

Secretaría Distrital de Planeación

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local

CONTENIDO

1.	MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL	1
2.	INTRODUCCIÓN	2
3.	BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL	3
3.1	EJECUCIÓN POR METAS	9
4.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	13
5.	PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PDL	17
5.1	TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN	28
6.	DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS	46
7.	ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019	49

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL

En el orden social, económico y de seguridad de la comunidad de Kennedy, las necesidades que tienen sus habitantes en los diferentes sectores de la localidad, han sido atendidas a través de diferentes estrategias de participación ciudadana y gestión institucional, que han permitido reconocer las diferentes dimensiones de la realidad y actuar de manera coordinada con el orden centralizado para que las inversiones y las decisiones resulten eficientes.

Es así que, con la presencia y el trabajo interinstitucional en territorio, las acciones permanentes con las comunidades a través de las instancias de participación, han permitido ahondar y conocer directamente las problemáticas; reconociendo aquellos actores que inciden y/o aportan en cada contexto específico, impactando en la calidad de vida de la población y construyendo gobernabilidad en los territorios.

De otra parte, el histórico rezago presupuestal en la inversión de recursos locales significa un desafío importante para la Administración, a fin de reducir la brecha entre los indicadores formales y reales de ejecución del Plan de Desarrollo Local.

Es por ello, que una vez superada la etapa de fijación de criterios por parte de los sectores y de la formulación de proyectos por parte de la Administración Local, se establecen metas en la dinámica institucional que permitan mejorar la oportunidad en las inversiones y por lo tanto la satisfacción de las comunidades.

El trabajo logrado por la gestión local es reconocido por las acciones insistentes para el beneficio de las diferentes poblaciones de la localidad de Kennedy; desde el ejercicio de los Derechos Humanos se logra la realización de más y mejores actividades, el fortalecimiento del trabajo comunitario y el apoyo en la formación académica, cultural, artística y social de las comunidades, impactando las instancias de participación, organizaciones, colectivos y demás grupos organizados, tales como la población afrodescendiente, LGBTI, niños, niñas adolescentes, las víctimas del conflicto armado, prevención de la violencia contra las mujeres, el Buen Trato, la defensa del espacio público; como evidencia de dicha gestión, bien vale la pena resaltarla creación del Centro Filarmónico Local de Kennedy y la restauración del Monumento de Las Banderas que tras la gestión distrital y local.

Finalmente, con base en las competencias locales, el impacto de las acciones e inversiones frente a la complejidad del territorio y el compromiso de la administración, se ve fortalecido con el acercamiento permanente a la comunidad, lo que revierte en soluciones que impactan la calidad de vida de la población de Kennedy desde los ámbitos planeados en los planes de desarrollo distrital y local.

LEONARDO ALEXANDER RODRÍGUEZ LÓPEZ
Alcalde Local de Kennedy



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Ley 489 de 1998, la cual regula el ejercicio de la función administrativa y busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes en concordancia con los lineamientos técnicos y metodológicos de la Secretaría Distrital de Planeación, la Alcaldía Local de Kennedy tiene el interés y el compromiso de presentar, a continuación, los resultados, indicadores y logros de la gestión correspondiente a la vigencia fiscal 2019, con base en lo previsto en el Plan de Desarrollo Local 2017-2020, “Bogotá Mejor para Todos. Kennedy localidad Ejemplo para Todos”. Este es, pues, el tercer año de ejecución del Plan de Desarrollo Local y mediante este informe se exponen los resultados físicos y financieros evaluando el avance en el cumplimiento de las metas planteadas para el cuatrienio y la inversión de los recursos asignados en el año 2019.

Este informe es un compromiso ético de responsabilidad y transparencia, que además es una herramienta de gestión institucional que coadyuva y motiva el ejercicio ciudadano para estar informado, consciente, propositivo y corresponsable para ejercer la participación ciudadana y el control social; más allá de un requisito de tipo legal, es un placer para esta entidad el evaluar y difundir los resultados de la gestión, obtenidos con una correcta utilización de los recursos públicos. Durante el año 2019 se continuó con las directrices establecidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá en cuanto a la Directiva 005 de 2016, referente a la destinación de la mayor parte de los recursos de inversión a proyectos de infraestructura física, tales como malla vial intermedia y local, parques vecinales y de bolsillo y adecuación de jardines infantiles, por cuanto esto responde a una de las necesidades más sentidas de la ciudad y de la localidad bajo las orientaciones técnicas de los correspondientes sectores, como lo son el de movilidad y el ambiental.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL

AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL

El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión.

Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Kennedy a 31 de diciembre de 2019 presentó un avance acumulado contratado¹ del PDL del 80,2%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados² a esa fecha, el plan presentó un avance del 48,2%, lo que indica que el 60.2% de lo contratado fue entregado.

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.

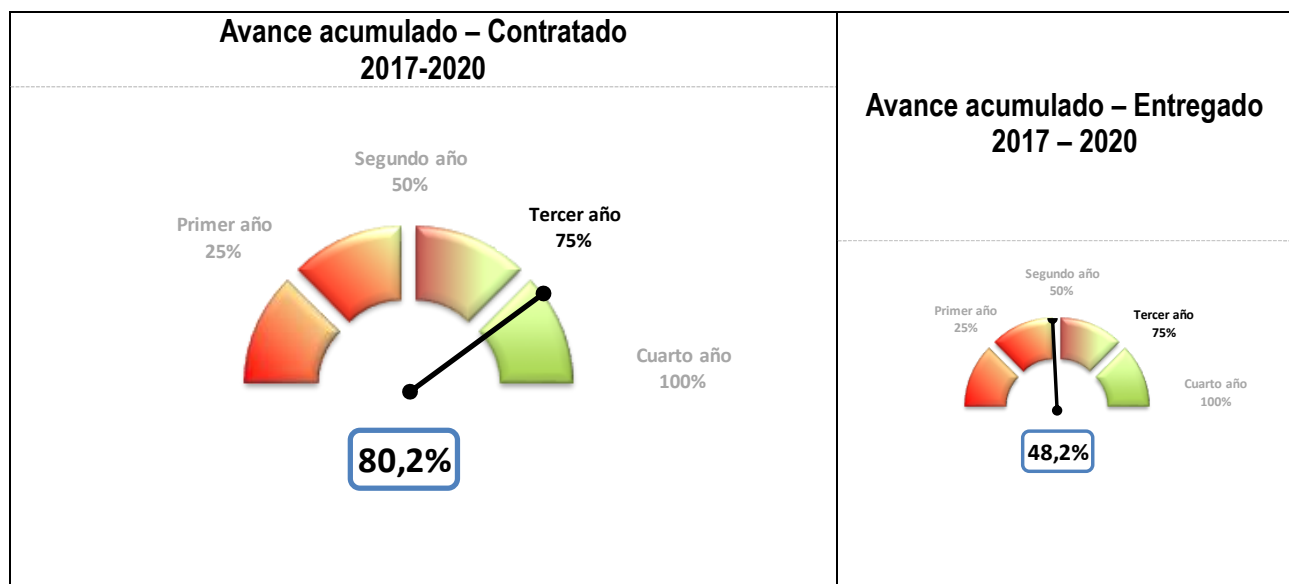

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

¹ La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se espera entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.


² La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Frente a la ejecución anual del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento porcentual en la vigencia 2018 con un 35,1% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes y servicios entregados se presenta en la vigencia 2019 con un incremento del 30,6%.


Gráfica No. 2. Evolución del porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.

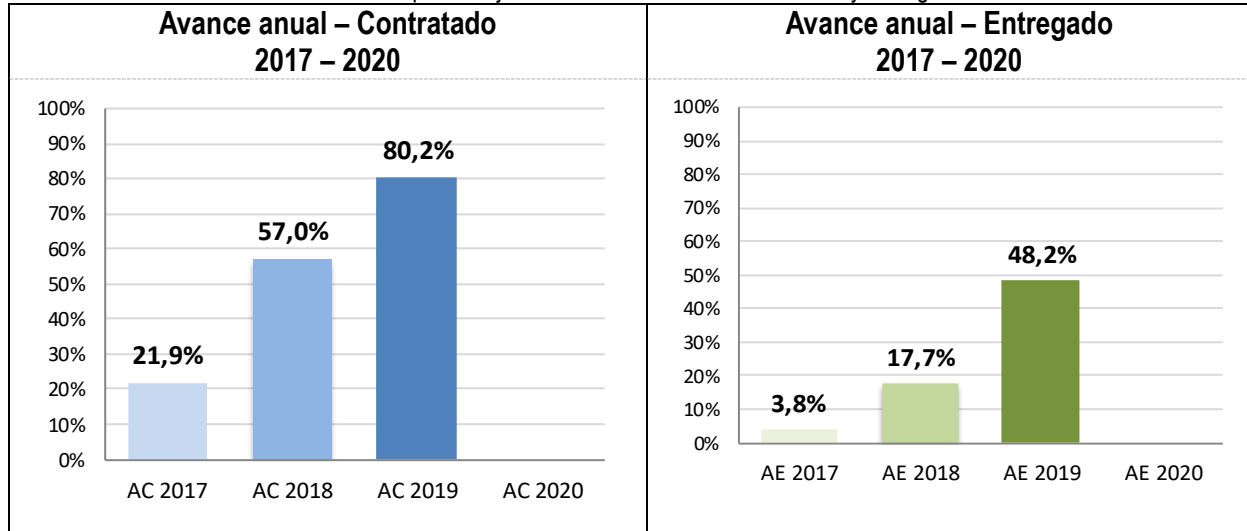

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

A corte del 31 de diciembre de 2019 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado contratado de su PDL igual a 79,9%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Kennedy ocupa el décimo primer lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el promedio se sitúa en 58,8% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en el rezago presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto décimo séptimo.

Gráfica No. 3. Ranking de avance PDL por localidad.

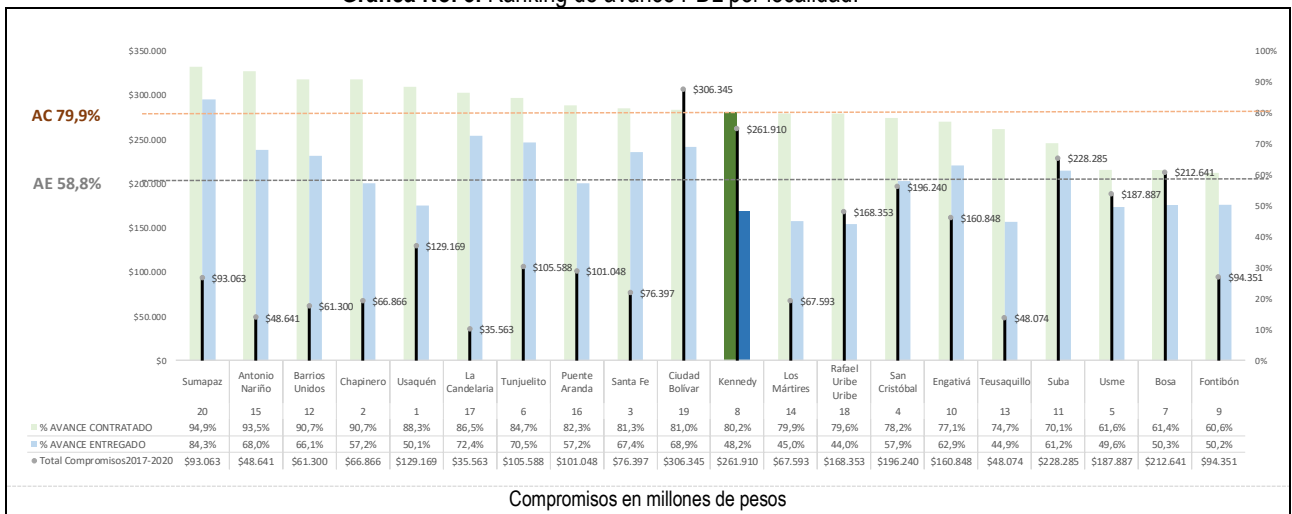

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN

En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado contratado lo presentó el eje Sostenibilidad ambiental (93,1%), que incluye los temas relacionados con acciones de arborización, re naturalización y coberturas verdes. En segundo lugar, está el pilar Democracia urbana (84,2%) que incluye los temas relacionados con malla vial, parques y demandas de titulación. En tercer lugar, el pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana, (83,6%) que incluye los temas relacionados con seguridad, convivencia y víctimas. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana (84,9%).

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje.

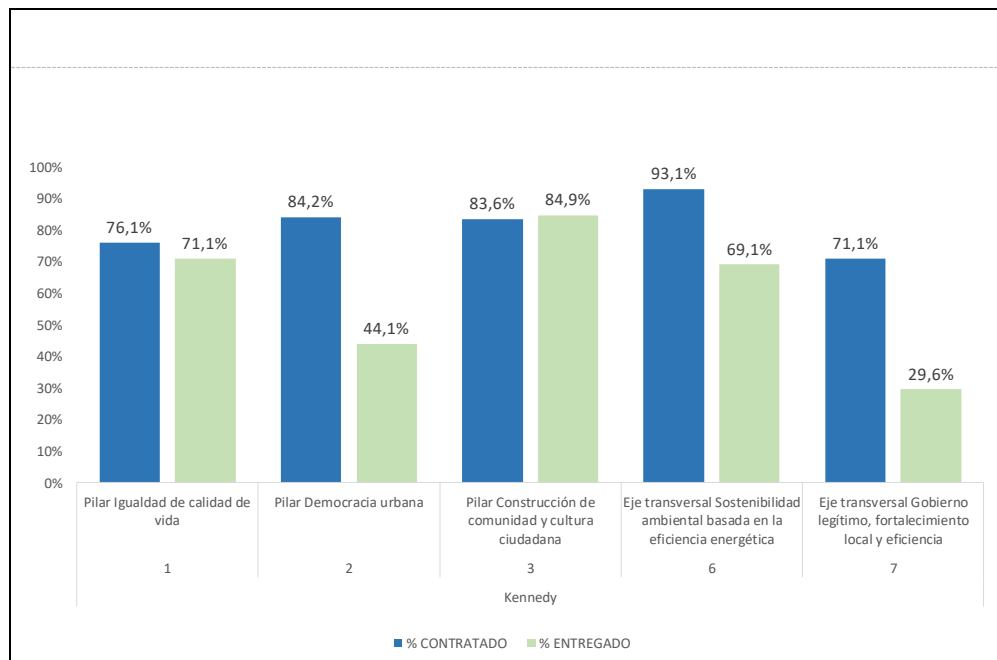

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Kennedy cuenta con 11 programas. De los cuales sobresalen en el avance contratado, Bogotá mejor para las víctimas la paz y la reconciliación, con 100%, Inclusión educativa para la equidad (100%) y Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia (93,6%). El programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 2019 fue Mejor movilidad para todos con \$39.194 millones.

Gráfica No. 5. Avance programas.

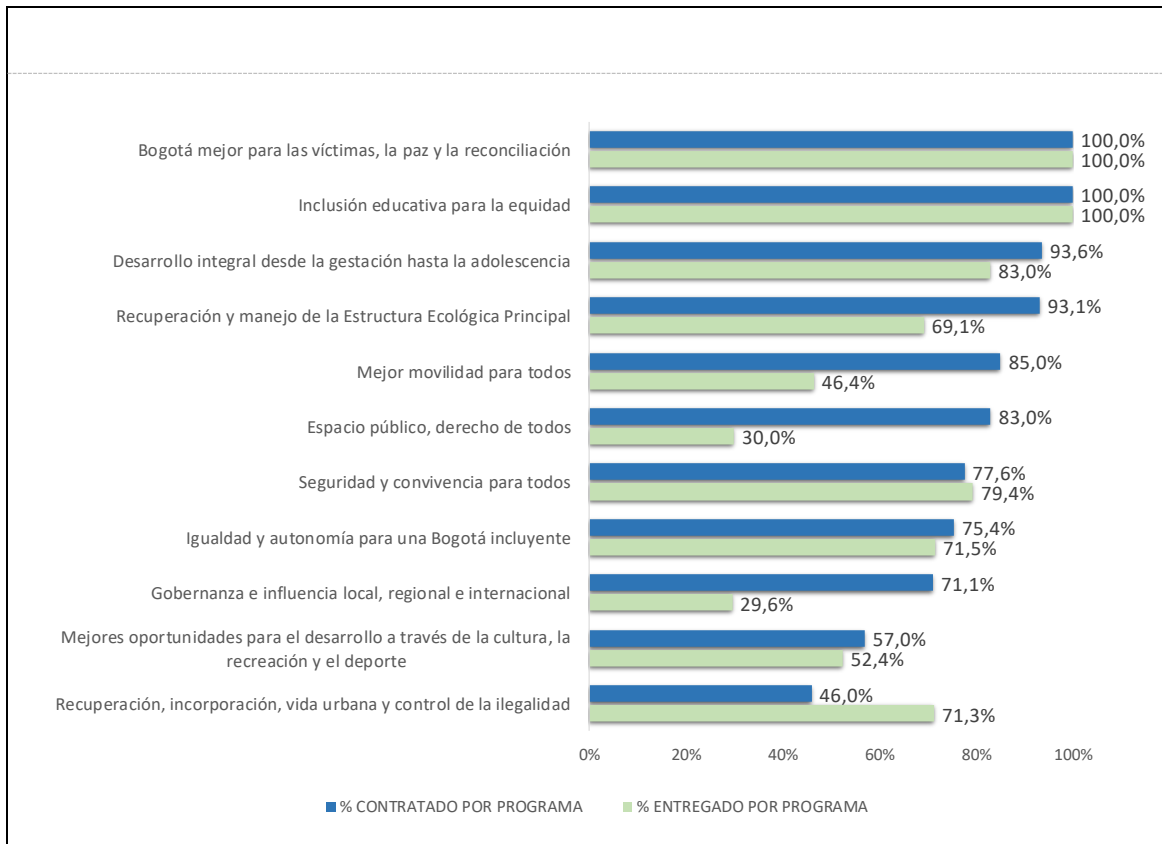

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL

Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Kennedy, la Alcaldía Local ha ejecutado recursos en 13 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado de cada uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia.

Tabla No. 1. Avance por proyecto de inversión.

Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Total Compromisos 2017 2020
3-3-1-15-01-02-1365-00	Fortalecimiento pedagógico y estructural a jardines infantiles y prevención de violencia infantil y promoción del	93,6%	\$2.653	\$2.339	\$2.713	\$7.705
3-3-1-15-01-03-1373-00	Fortalecimiento al mejoramiento de la calidad de vida	78,4%	\$878	\$900	\$989	\$2.767
3-3-1-15-01-03-1378-00	Igualdad y autonomía para una Kennedy incluyente	75,0%	\$6.149	\$5.802	\$6.401	\$18.352
3-3-1-15-01-07-1360-00	Fortalecimiento de las instituciones educativas distritales, para una inclusión educativa	100,0%	\$824	\$770	\$993	\$2.586
3-3-1-15-01-11-1362-00	Promoción y desarrollo local de la cultura, la recreación y el deporte	57,0%	\$2.996	\$1.741	\$3.015	\$7.752
3-3-1-15-02-15-1380-00	Mi casa me pertenece	46,0%	\$42	\$304	\$590	\$937
3-3-1-15-02-17-1369-00	Recreación y deporte para todos	83,0%	\$12.300	\$3.413	\$7.600	\$23.313
3-3-1-15-02-18-1367-00	Recuperación de la malla vial local	85,0%	\$41.011	\$33.517	\$39.194	\$113.723
3-3-1-15-03-19-1376-00	Fortalecimiento de seguridad e iniciativa de convivencia en la localidad de Kennedy	77,6%	\$3.710	\$3.695	\$3.888	\$11.293
3-3-1-15-03-23-1381-00	Kennedy mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	100,0%	-	\$1.000	\$1.257	\$2.257
3-3-1-15-06-38-1361-00	Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	93,1%	\$566	\$1.000	\$460	\$2.026
3-3-1-15-07-45-1363-00	Fortalecimiento de la gestión local y de las acciones de vigilancia y control	73,2%	\$8.644	\$35.738	\$21.264	\$65.646
3-3-1-15-07-45-1371-00	Fortalecimiento de la participación	45,6%	\$1.252	\$1.103	\$1.200	\$3.555

Cifras en millones pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

NIVEL DE AVANCE POR METAS

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que tiene avance acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%.

Para la localidad de Kennedy, existe un total de 30 metas en el PDL. Del total de metas, 3 presentan un nivel de avance contratado bajo, 4 un nivel medio y 23 un nivel alto. En este sentido, el 90% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto.

Gráfica No. 6. Nivel de avance de metas según lo contratado.

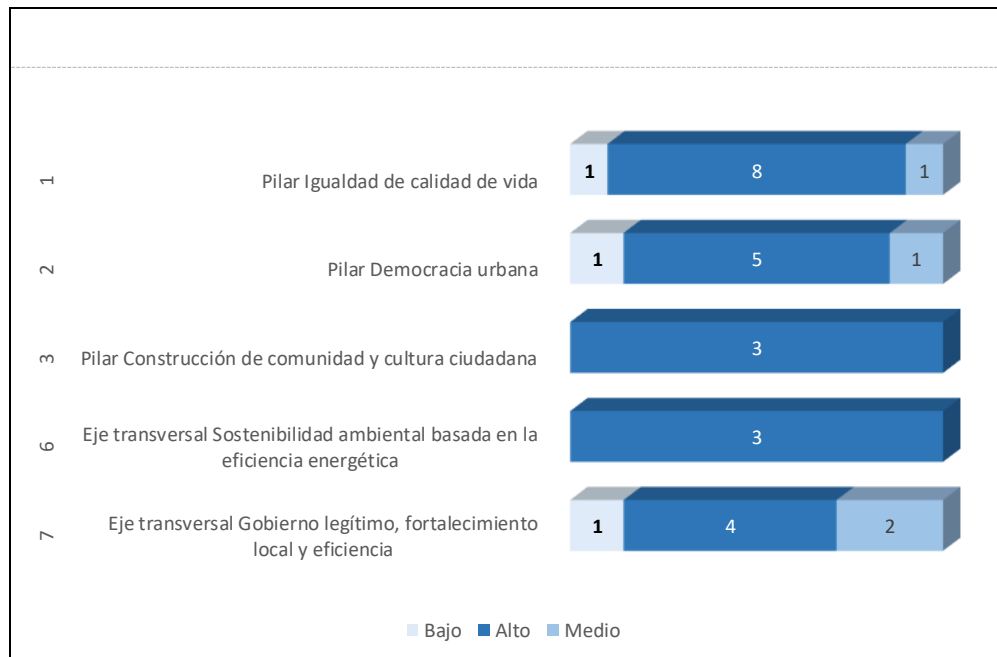

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3.1 EJECUCIÓN POR METAS

EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2019

Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2019, teniendo en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Kennedy, en 2019 se programaron 29 metas, de las cuales, (96,6) presentaron avance en la contratación. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2019.

Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Igualdad de calidad de vida.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Dotar 60 jardines infantiles de la localidad	10,0	36,0	360,0%
Adecuar 16 jardines infantiles de la localidad	7,0	5,0	71,4%
Vincular 2000 personas en programas de promoción del buen trato a los niños, niñas y adolescentes	200,0	2.900,0	1450,0%
Beneficiar 1500 personas en situación de discapacidad con servicios de ayudas técnicas no POS	390,0	436,0	111,8%
Beneficiar 3884 personas mayores con subsidio tipo c	3.884,0	3.884,0	100,0%
Dotar 42 Instituciones educativas distritales de la localidad	12,0	33,0	275,0%
Realizar 40 eventos artísticos y culturales en la localidad	10,0	10,0	100,0%
Realizar 40 eventos recreodeportivos en la localidad	10,0	10,0	100,0%
Vincular 2000 personas a los procesos de formación artística y cultural	500,0	500,0	100,0%
Vincular 2000 personas a los procesos de formación deportiva	500,0	500,0	100,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Pilar 2. Democracia urbana.

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Democracia urbana.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Presentar 1000 demandas de titulación predial	250,0	250,0	100,0%
Intervenir 100 parques Vecinales y/o de bolsillo	25,0	28,0	112,0%
Construir 5 km/carril de malla vial local para mejorar la movilidad	2,5	2,5	98,0%
Mantener 60 km/carril de malla vial local para mejorar la movilidad	10,0	13,4	134,0%
Construir 8000 m2 de espacio público en la localidad	2.000,0	7.674,0	383,7%
Mantener 15000 m2 de espacio público	1.875,0	6.279,0	334,9%
Intervenir 2 puentes peatonales y/o vehiculares de escala local sobre cuerpos de agua	1,0	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Pilar 3. Construcción de comunidad.

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Construcción de comunidad.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Realizar 4 dotaciones para mejorar la seguridad en la localidad	1,0	1,0	100,0%
Vincular 2000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana	500,0	666,0	133,2%
Vincular 8000 personas a procesos integrales en materia de paz y reconciliación	2.000,0	41,0	2,1%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Sembrar y/o intervenir 1000 árboles Para mejorar las condiciones ambientales locales	250,0	400,0	● 160,0%
Intervenir 2 hectáreas De espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	0,5	0,7	● 140,0%
Intervenir 8000 m2 De espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	2.000,0	500,0	● 25,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Tabla No. 6. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional	1,0	1,0	● 100,0%
Realizar 4 acciones de IVC	1,0	1,0	● 100,0%
Adecuar 1 sede administrativa local	0,3	0,2	● 80,0%
Fortalecer 100 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación local	25,0	25,0	● 100,0%
Vincular 2000 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social	500,0	500,0	● 100,0%
Acondicionar 1 casa de Participación Ciudadana local	1,0	0,7	● 70,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN DE METAS ACUMULADA 2017-2020

La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance contratado y entregado acumulado.

Tabla No. 7. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador.

Cód	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de anualización	Magnitud Programada 2017-2020	Magnitud Contratada 2017-2020	Magnitud Entregada 2017-2020	% Avance Acumulado contratado 2017-2020	% Avance Acumulado Entregado 2017-2020
1	Malla vial, espacio público y peatonal	Km/carril de malla vial local construido	Suma	5	4	3	73,0%	67,0%
0		Km/carril de malla vial local mantenido	Suma	60	55	23	91,7%	37,7%
0		m2 de espacio público construidos	Suma	8.000	9.674	7.651	120,9%	95,6%
0		m2 de espacio público mantenidos	Suma	15.000	27.575	15.686	183,8%	104,6%
0		Puentes vehiculares y/o peatonales, de escala local sobre cuerpos de agua	Suma	2	-	-	-	-
2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	Suma	100	83	30	83,0%	30,0%
3	Seguridad y convivencia	Dotaciones para seguridad realizadas	Suma	4	3	3	75,0%	70,0%
0		Personas vinculadas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2.000	1.666	2.421	83,3%	121,1%
4	Inspección, vigilancia y control - IVC	Acciones de inspección, vigilancia y control realizadas	Suma	4	3	3	75,0%	75,0%
0		Demandas de titulación predial presentadas	Suma	1.000	460	713	46,0%	71,3%
5	Atención a población vulnerable_Subsidio C	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	Constante	3.884	2.913	2.909	75,0%	74,9%
6	Gestión pública local	Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas	Constante	1	1	1	75,0%	75,0%
7	Atención a población vulnerable	Personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS	Suma	1.500	1.176	718	78,4%	47,9%
0		Personas vinculadas a acciones de promoción del buen trato infantil	Suma	2.000	8.200	6.084	410,0%	304,2%
8	Dotación	IED dotados con material pedagógico	Suma	42	69	69	164,3%	164,3%
0		Jardines infantiles adecuados	Suma	16	13	8	81,3%	50,0%
0		Jardines infantiles dotados	Suma	60	109	109	181,7%	181,7%
10	Procesos de formación artística, cultural y deportiva	Personas vinculadas a procesos de formación artística y cultural	Suma	2.000	1.500	1.171	75,0%	58,6%
0		Personas vinculadas a procesos de formación deportiva	Suma	2.000	500	-	25,0%	-
11	Eventos artísticos, culturales y deportivos	Eventos artísticos y culturales realizados	Suma	40	30	85	75,0%	212,5%
0		Eventos de recreación y deporte realizados	Suma	40	20	18	50,0%	45,0%
12	Protección y recuperación de los recursos ambientales	Arboles sembrados o intervenidos	Suma	1.000	1.250	1.000	125,0%	100,0%
0		Hectáreas de espacio público intervenidas con acciones de	Suma	2	2	-	85,0%	-
0		m2 de espacio público intervenidos con acciones de jardinería, muros	Suma	8.000	7.550	8.000	94,4%	100,0%
13	Participación	Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas	Suma	100	50	49	50,0%	49,0%
0		Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana y/o control	Suma	2.000	1.150	1.168	57,5%	58,4%
15	Proyecto estratégico	Casas de la participación ciudadana local acondicionadas	Constante	1	0	-	17,5%	-
0		Personas vinculadas a procesos integrales en materia de paz y	Suma	8.000	8.041	12.128	100,5%	151,6%
16	Proyecto estratégico (Sede administrativa)	Sede administrativa local adecuada	Suma	1	1	-	70,0%	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018 y 2019 se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda.

La Alcaldía Local de Kennedy ha comprometido un presupuesto acumulado de \$261.910 millones en las vigencias 2017, 2018 y 2019, de los cuales la mayor proporción se comprometió en la vigencia 2018 con un valor de \$91.322 (97%). Así mismo la mayor proporción de giros dentro de la misma vigencia se realizó en el año 2018, los cuales fueron por valor de \$41.416 (44%).

Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la cual se comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron comprometidos se constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar.

Gráfica No. 7. Porcentaje de ejecución presupuestal por vigencia del PDL

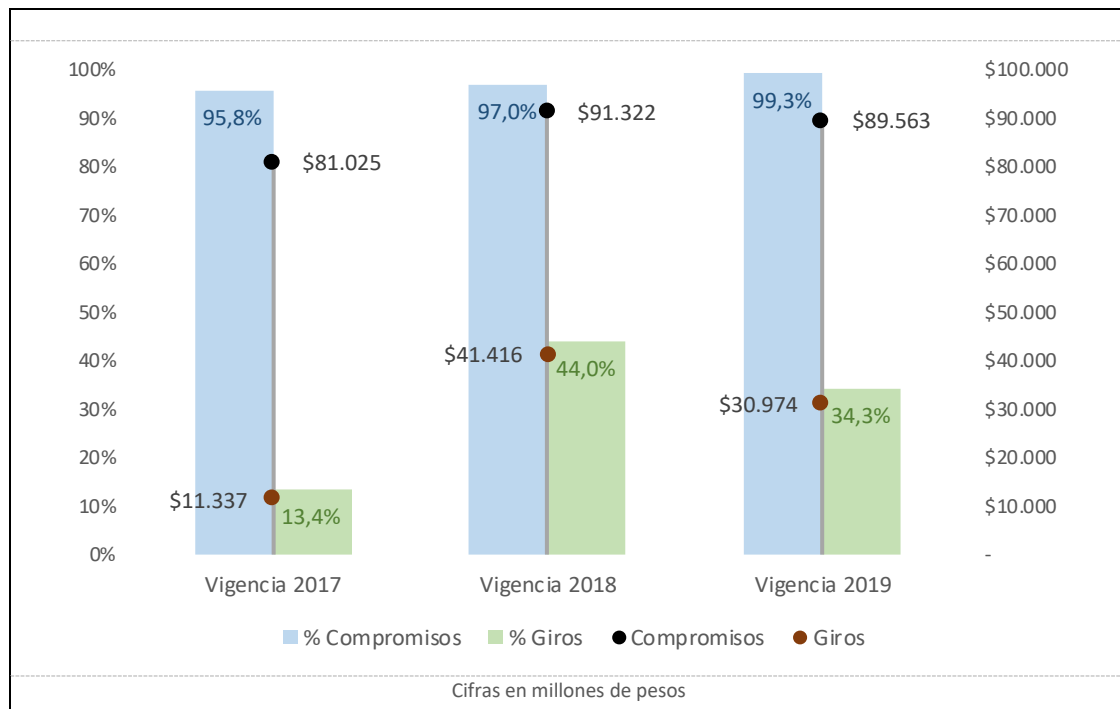

Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018 y 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR

El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018 y 2019 son Movilidad \$113.723 millones que representa el (43,4%) del total del presupuesto de inversión, Gobierno con \$69.200 millones (26,4%) y Cultura, recreación y deporte \$31.065 millones (11,9%).

Tabla No. 8. Ejecución Presupuestal por sector. Diciembre 2019.

SECTOR	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Total. Compromisos 2017-2020	% Compromisos 2017-2020
Sector Movilidad	\$41.011	\$33.517	\$39.194	\$113.723	43,4%
Sector Gobierno	\$9.895	\$36.841	\$22.464	\$69.200	26,4%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$15.296	\$5.154	\$10.615	\$31.065	11,9%
Sector Integración social	\$8.802	\$8.141	\$9.113	\$26.056	9,9%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$3.710	\$3.695	\$3.888	\$11.293	4,3%
Sector Salud	\$878	\$900	\$989	\$2.767	1,1%
Sector Educación	\$824	\$770	\$993	\$2.586	1,0%
Sector Gestión pública	-	\$1.000	\$1.257	\$2.257	0,9%
Sector Ambiente	\$566	\$1.000	\$460	\$2.026	0,8%
Sector Hábitat	\$42	\$304	\$590	\$937	0,4%
TOTALES	\$81.025	\$91.322	\$89.563	\$261.910	100,0%

Cifras en millones de pesos

Fuente: PREDIS vigencia 2019

EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL

Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los FDL y, por ende, se convierten en el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato.

A continuación se presenta el porcentaje de presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 9. Porcentaje de presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	% POAI 2017	% Compromisos 2017	% POAI 2018	% Compromisos 2018	% POAI 2019	% Compromisos 2019
Anexo 1 (85%)	84,0%	85,2%	85,5%	86,8%	88,8%	89,2%
Atención a población vulnerable_Subsidio C	7,0%	3,7%	8,2%	8,4%	9,0%	9,2%
Gestión pública local	9,0%	8,7%	9,1%	11,6%	11,3%	10,9%
Inspección, vigilancia y control - IVC	4,0%	0,5%	4,0%	1,9%	4,0%	3,7%
Malla vial, espacio público y peatonal	49,0%	52,6%	50,0%	50,3%	48,7%	49,7%
Parques	10,0%	10,5%	9,0%	9,6%	10,0%	10,1%
Seguridad y convivencia	5,0%	9,2%	5,2%	5,0%	5,8%	5,5%
Anexo 2 (15%)	16,0%	14,8%	14,5%	13,2%	11,2%	10,8%
Atención a población vulnerable	2,0%	0,6%	3,5%	3,7%	2,1%	2,1%
Dotación	1,4%	1,6%	1,2%	1,7%	1,3%	1,2%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	4,3%	4,3%	3,0%	2,3%	3,7%	3,5%
Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo	1,5%	1,8%	1,1%	1,2%	0,5%	0,4%
Participación	2,3%	2,0%	1,7%	1,8%	1,9%	1,6%
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	1,1%	0,9%	1,1%	0,4%	1,1%	1,2%
Protección y recuperación de los recursos ambientales	3,1%	3,6%	3,0%	2,0%	0,6%	0,7%
Proyecto estratégico	0,4%	-	-	-	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para las líneas de inversión local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 2017-2020, señaló que el 85% de la inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, espacio público y peatonal; 10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población vulnerable; 5% Seguridad y Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC.

En los temas estratégicos del Plan de Desarrollo Local de Kennedy, los mayores recursos comprometidos del PDL en las líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018 y 2019 fueron: “Malla vial, espacio público y peatonal” con un monto de \$113.723 millones, “Parques” con \$23.313 millones y “Atención a población vulnerable_Subsidio C” con \$18.352 millones.

Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más recursos durante el periodo del PDL son: “Dotación” con un monto de \$8.329 millones, “Eventos artísticos, culturales y deportivos” con \$6.067 millones y “Atención a población vulnerable” con \$4.729 millones.

A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 10. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	POAI 2017	Compromisos 2017	POAI 2018	Compromisos 2018	POAI 2019	Compromisos 2019	Total Compromisos 2017_2020
Anexo 1 (85%)	\$61.344	\$69.877	\$55.939	\$54.970	\$67.922	\$67.586	\$192.432
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$6.550	\$6.149	\$6.190	\$5.802	\$6.300	\$6.401	\$18.352
Gestión pública local	\$2.820	\$3.759	\$5.869	\$5.551	\$7.600	\$5.898	\$15.208
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$2.885	\$2.947	\$3.150	\$2.991	\$3.150	\$4.606	\$10.544
Malla vial, espacio público y peatonal	\$37.179	\$41.011	\$33.600	\$33.517	\$39.372	\$39.194	\$113.723
Parques	\$8.300	\$12.300	\$3.420	\$3.413	\$7.600	\$7.600	\$23.313
Seguridad y convivencia	\$3.610	\$3.710	\$3.710	\$3.695	\$3.900	\$3.888	\$11.293
Anexo 2 (15%)	\$10.825	\$9.168	\$10.740	\$8.853	\$10.960	\$10.626	\$28.647
Atención a población vulnerable	\$1.600	\$1.531	\$1.600	\$1.553	\$1.700	\$1.645	\$4.729
Dotación	\$2.900	\$2.824	\$2.500	\$2.456	\$3.200	\$3.049	\$8.329
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$1.460	\$2.876	\$1.600	\$932	\$2.000	\$2.259	\$6.067
Participación	\$930	\$1.252	\$1.040	\$903	\$1.000	\$1.000	\$3.155
Procesos de formación artística, cultural y depor	\$1.300	\$120	\$1.500	\$809	\$1.100	\$755	\$1.685
Protección y recuperación de los recursos ambie	\$1.080	\$566	\$1.000	\$1.000	\$460	\$460	\$2.026
Proyecto estratégico	\$1.555	-	\$1.500	\$1.200	\$1.500	\$1.457	\$2.656
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	\$10.000	\$1.980	\$27.500	\$27.500	\$11.350	\$11.350	\$40.830
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	\$10.000	\$1.980	\$27.500	\$27.500	\$11.350	\$11.350	\$40.830

Cifras en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PDL

Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

Jardines Infantiles

Meta plan: adecuar 16 jardines infantiles de la localidad; se realizó la visita a siete jardines infantiles de la SDIS de la localidad, de los cuales y con base a sus necesidades se priorizaron cinco: La cometa, Nietos del trueno, Pio XII, Metro y Visión de Colombia; para el proceso de adecuación de las plantas físicas. Teniendo en cuenta que se debe promover y potenciar el desarrollo integral de la población Infantil de la localidad iniciando por el ámbito educativo, el proyecto lograra mejorar las condiciones de Infraestructura de los Jardines Infantiles La Cometa que atiende un total de 193 niños y niñas, Metro con una cobertura de atención de 196 niños y niñas, Los Nietos del Trueno con una cobertura de atención de 69 niños y niñas, Visión de Colombia que atiende 112 niños y niñas y Pio XII que atiende 83 niños y niñas, los cuales tendrán una mejora en sus condiciones educativas, mejorando el bienestar y la seguridad de los niños.

Meta Plan: Dotar 60 jardines infantiles de la localidad, se realizó la selección de 21 elementos de dotación pedagógica para entregar a los 36 jardines de la Secretaría de Integración Social en esta vigencia. Se suministró dotación pedagógica y audiovisual a estos servicios, beneficiando a 4484 niños y niñas menores de 5 años de la localidad.

Meta Plan: Vincular 2000 personas en programas de promoción del buen trato a los niños, niñas y adolescentes; se realizó la construcción de jornadas locales de buen trato con diferentes sectores e instancias de participación, para vincular a la estrategia de entornos protectores, generando una mayor oferta frente al componente de atención y asesoría, mejorando los tiempos de atención de casos y disminuyendo la congestión en las comisarías de familia, y logrando un mayor acercamiento a más personas frente a la prevención de violencias y la prevención de maternidad temprana.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Subsidio Tipo C

En el marco del Proyecto de Inversión Social “Igualdad y autonomía para una Kennedy Incluyente”, del cual se deriva la atención y orientación a la población mayor bajo el modelo de subsidio y basado en el lineamiento establecido en el convenio de asociación No 4002 del 19 de diciembre de 2011, celebrado entre los Fondos de Desarrollo Local, la Secretaría de Integración Social y la Caja de Compensación Familiar, en la vigencia 2019:

- Se atendieron 5.545 Personas mayores, en los puntos de información ubicados en Centro de Desarrollo Comunitario Bella Vista y en la Alcaldía local de Kennedy.
- Se adelantaron 2.662 Visitas domiciliarias de seguimiento a las personas mayores para verificar su situación psicosocial.
- Se ofreció atención a 1098 personas mayores a través de talleres de desarrollo humano, en las doce UPZ de la localidad.
- Y se ingresaron 583 Nuevas personas a la atención del proyecto, mediante el suministro del apoyo económico tipo C.



Ayudas Técnicas

- Durante el 2019 se realizaron 410 visitas a los-as candidatos-as para el otorgamiento de ayudas técnicas, dentro de las cuales 349 fueron efectivas y 61 visitas fallidas.
- Se evidenció prevalencia en el sexo femenino con 196 usuarias, equivalente al 56% de los beneficiarios y 153 personas del sexo masculino, equivalentes al 44% restante, por lo que se observa que la discapacidad y la necesidad de hacer uso de una ayuda técnica para mejorar su calidad de vida, es prevalente en un 12% adicional en las mujeres.
- Se evidencia que el mayor número de beneficiados se encuentra en la etapa de vejez (mayores de 60 años), con 141 usuarios (40%), seguido de 118 usuarios en etapa de adultez (34%), 44 usuarios en la adolescencia (13%), 27 usuarios joven (18 a 25 años) (8%) y de 19 niños y niñas (5%).
- Se evidencia que el régimen en salud prevalente de los usuarios que estuvieron en el proceso, es el contributivo, con 192 personas en condición de discapacidad (55%), seguido por 153 participantes en el régimen subsidiado (44%).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

- De las visitas a personas en condiciones de vulnerabilidad, se abarcó en su mayoría población de la UPZ 82 Patio Bonito con 87 usuarios (25%), seguida de la UPZ 47 Kennedy Central con 51 usuarios (15%), le continua la UPZ 48 Timiza con 43 beneficiarios (12%). Le sigue la UPZ 81 Gran Britalia con 41 beneficiarios (12%), la UPZ 45 Carvajal con 40 personas visitadas (11%), la UPZ 46 Castilla con 24 usuarios (7%), la UPZ 79 Calandaima con 19 beneficiarios (5%), la UPZ 80 Corabastos con 17 usuarios (5%), la UPZ 44 Américas con 16 personas visitadas (5%), la UPZ 83 Las Margaritas con 6 usuarios (2%), y finalmente la UPZ 113 Bavaria con 4 beneficiarios y la UPZ 78 Tintal con 1 usuario (1%).
- De los seguimientos realizados, 70 pertenecen a la clase de ayudas de protección personal (cama hospitalaria, colchón anti escaras, cojín anti escaras y colchoneta Antiescaras entre otras), es decir el 56% de la totalidad, seguido de 55 ayudas de movilidad (silla de ruedas convencional, silla neurológica, silla semideportiva entre otras) es decir el 44% de la totalidad.
- Se hizo un total de 50 Asesorías de Cuidado y Manejo de piel. Encontramos una mayor prevalencia del género femenino con 54% de la población, es decir 27 usuarias y en menor representación se encuentran 23 usuarios del género masculino, con el 46% de la población total.
- Para la Vigencia 2018 ejecutada en el 2019, se evidencia que el 81% de los beneficiarios del convenio, es población Nueva (nunca había recibido una ayuda técnica a través de los convenios del FDL), Por lo tanto, se logra una convocatoria y divulgación del convenio efectiva la cual se hace extensa a diferentes puntos de la Localidad tanto en espacios comunitarios como institucionales lo cual favoreció el proceso, llegando a las diferentes familias con personas con discapacidad.
- Se evidencia que el otorgamiento de las ayudas técnicas no solo beneficia a la persona con discapacidad, sino también a sus cuidadores y/o familia, encontrado así beneficiarios indirectos dentro del convenio, y abordando a un total de 645 personas.

Educación, Dotaciones de Colegios

Se realizó una fuerte contribución al mejoramiento de la calidad de la educación en una de sus aristas, como lo es la disposición de herramientas informáticas útiles para hacer de la experimentación una forma de aprender, con la destinación de recursos del Fondo de Desarrollo Local para la dotación de 33 sedes educativas distritales ubicadas en la localidad, con computadores de escritorio y portátiles que, además de permitir la proyección de contenidos de una manera dinámica, promueve la interacción entre los y las estudiantes, el docente y la tecnología de punta, facilitando el proceso de aprendizaje. La inversión total realizada fue de \$1,758,058,948, mediante un convenio interadministrativo suscrito con la Secretaría de Educación Distrital.

De otra parte, se realizó el foro educativo local, al cual se invitaron 70 colegios, tanto distritales como privados y donde la temática central fue la inclusión educativa y el Bicentenario. Allí se entregaron, a los participantes, 1.120 libros, una colección de 12 libros de inclusión y 4 libros de la conmemoración del Bicentenario con destino a las bibliotecas escolares, con el fin de mejorar el material didáctico de las comunidades educativas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Cultura y deporte

Dentro de los logros más importantes de la administración Local para la Vigencia 2019 se encuentran:

La realización de 52 eventos artísticos y culturales, donde se beneficiaron más de 37.944 habitantes de la localidad de Kennedy, entre los cuales se cuentan niños, niñas, adolescentes, jóvenes adultos, personas en condición de discapacidad, personas LGTBI, Mujeres, niños y niñas, víctimas del conflicto armado, población Room, indígenas, población afro raizal y palanquera y personas mayores mejorando su la calidad de vida y el aprovechando el tiempo libre.

Dentro del proceso de las escuelas de formación artística, se beneficiaron 516 habitantes de la localidad de Kennedy, entre los cuales se cuentan niños y niñas, adolescentes, jóvenes adultos, personas en condición de discapacidad, personas LGTBI, mujeres, niños y niñas víctimas del conflicto armado, población room, indígenas, población afro - raizal y palanquera y personas mayores.

Las acciones adelantadas, en ejecución de los proyectos de inversión, metas y actividades relacionadas con procesos culturales y deportivos fueron los siguientes:

Tabla No. 11. Procesos culturales y deportivos

• “Corredor cultural día de los niños y las niñas víctimas del conflicto armado • y niños en condición de discapacidad • Foro Gospel • Corredor rendición de cuentas FDLK • Corredor cultural literario • Corredor conmemoración día del trabajo • Festival ROM • Encuentro de pueblos indígenas • Corredor cultural mujeres • Kennedy Gospel • Corredor cultural afro • Miss Chiquitica • Foro rock	• Festival rock • Festival hip hop • Intercambio de saberes danza • Intercambio de saberes danza • Intercambio de saberes teatro • Cumpleaños Kennedy • Novena villa la torre • Novena Banderas • Novena Marsella • Novena Carvajal 3er sector • Novena Pio XII • Novena Tintal norte • Novena salen samaria • Novena palenque
--	---



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

• Foro hip hop • Celebración san pacho • Celebración santoral virgen de atocha • Celebración su majestad la cumbia • Celebración virgen de las mercedes	• Novena Ciudad Galán • Novena plazoleta la macarena • Novena margaritas • Novena unir • Festival de la persona mayor
---	---

En cuanto a los componentes de los procesos de formación y desarrollo de capacidades artísticas, se desarrollaron escuelas de formación artística, de las que tomaron parte 516 habitantes de la localidad de Kennedy, en las siguientes disciplinas y categorías:

Tabla No. 12. Formación y desarrollo de capacidades artística

• Artes plásticas Kennedy central • Artes plásticas Bavaria • Artes plásticas Timiza • Artes plásticas Aloha • Danza folclórica Alquería 2 • Danza folclórica Alquería 1 • Danza folclórica Calandaima • Danza Contemporánea Kennedy central • Ballet Kennedy central • Teatro Kennedy central • Literatura la igualdad • Danza urbana Corabastos • Música instrumental Timiza • Danza folclórica • Música instrumental Kennedy central	• Ballet grupo Kennedy central • Técnica vocal Bavaria • Fotografía Kennedy centro • Fotografía Carvajal • Fotografía Timiza • Música Kennedy central • Danza folclórica Kennedy • Danza folclórica Kennedy • Literatura • Literatura • Danza urbana patio bonito • Danza urbana patio bonito grupo ii • Técnica vocal Kennedy • Teatro la igualdad
---	--

Entre otras actividades, se organizaron mesas de trabajo con la participación de entidades, sectores y órganos administrativos, identificando cada oportunidad de mejora para el buen desarrollo de los componentes del proyecto mencionados en el CPS 438/2018. Algunas de las instancias que participaron en este cometido fueron:

Tabla No. 13. Instancias de Participación

• Los referentes locales del IDRD. • Referente local de Cultura • Secretaría Distrital de la Mujer • Representantes de las UPZ • Concejo local de Adulto Mayor • Consejo Local de Deportes	• Consejo Local de Cultura • Comisionados Encuentros Ciudadanos • Dirección de Educación Local • Organizaciones de recreación y deporte • Veedores ciudadanos cuyo aporte es velar porque las comunidades reciban los productos con la mejor calidad.
---	---



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Pilar 2. Democracia urbana.

Espacio público, derecho de todos, recreación y deporte para todos

La localidad de Kennedy presenta grandes deficiencias respecto a la oferta de bienes, espacio e infraestructura pública, por lo que se busca transformar e incrementar el espacio público como un escenario seguro, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El deterioro de los espacios recreo deportivos de la localidad, se debe principalmente a que estos espacios no son utilizados correctamente por parte de las comunidades, generando daños sustanciales en la infraestructura y a una falta de apropiación de dichos espacios; esta situación genera un problema social y cultural hacia las comunidades que buscan y requieren beneficiarse de ellos, ya que no pueden disfrutar de un esparcimiento sano con sus familias, porque contrario al propósito de su existencia, se convierten en focos de inseguridad venta y consumo de estupefacientes.

Meta: Intervenir 100 parques Vecinales y/o de bolsillo. Inversión en la vigencia 2019: \$5.77.021.736. Se adjudicó el contrato de obra pública COP-324-2019, que tiene como objeto ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios el diagnóstico, intervención y mantenimiento integral y preventivo de los parques priorizados de escalas vecinales y de bolsillo de la localidad de Kennedy.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Malla vial y espacio público

El deterioro de la malla vial local se debe principalmente a que estas vías son utilizadas como vías alternas para tráfico vehicular que requiere desplazarse a través de la localidad, situación que demanda características técnicas superiores a las del diseño inicial de las vías, y a que las acciones de conservación de la malla vial, a lo largo de su vida útil, han sido escasas, especialmente las relacionadas con el mantenimiento rutinario y preventivo. Esta situación genera mayores tiempos en el desplazamiento de las personas, dificultades para el acceso a los barrios, dificultades para el comercio y dificultades para la atención oportuna de emergencias, así como para las otras actividades propias de la comunidad, las que generan mayores costos en la movilidad.

Habida cuenta lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy ha realizado la intervención de mantenimiento y construcción de 66.66 k/m Carril, faltando un año para la culminación del plan de desarrollo KENNEDY MEJOR PARA TODOS “Localidad Ejemplo Para Todos” 2017-2020. En 2019 se suscribieron los siguientes contratos:

Meta construir 5 km/carril de malla vial local para mejorar la movilidad. Inversión: \$6.808.000.000. Se encuentra en ejecución el convenio interadministrativo 1459 de 2019, con el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, que tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros para adelantar los estudios diseños y obras el proyecto calles comerciales a cielo abierto, para intervención de la calle 45 sur entre carrera 72 U Bis C y 72 I de la localidad de Kennedy.

Meta mantener 60 km/carril de malla vial local para mejorar la movilidad. Inversión: \$ 21.221.173.210. Se adjudicaron los contratos COP-314-2019 y COP-315-2019, que tienen por objeto ejecutar a precios unitarios fijos y a monto agotable, las obras y actividades para la conservación de la malla vial de la localidad de Kennedy y su espacio público asociado grupos 1 y 2, respectivamente. Dichos contratos incluyen la meta de Mantener 15000 m2 de espacio público por valor de \$ 3.744.912.920.

Meta construir 8000 m2 de espacio público en la localidad. Valor: 1.192.000.000. Se encuentra en ejecución el convenio interadministrativo 1459 de 2019, con el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU que tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros para adelantar los estudios diseños y obras el proyecto calles comerciales a cielo abierto, para intervención de la calle 45 sur entre carrera 72 U Bis C y 72 I de la localidad de Kennedy.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Pilar 3. Construcción de comunidad.

Seguridad y convivencia

Se realizó la adquisición de motocicletas y vehículos tipo panel de vigilancia para el fortalecimiento del parque automotor de la Estación Octava de Policía, con lo que se obtuvo una mejora importante en la percepción de seguridad y en la operatividad de las actividades de policía. Como resultado de las actividades anteriormente descritas, a más de la inversión realizada en vigencias anteriores, se logró una reducción de 16 casos de homicidios en comparación con el año 2018, es decir una reducción del 11,6%.

Con el fin de contribuir en la búsqueda para establecer las condiciones de convivencia en el territorio nacional y propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, los profesionales de la Alcaldía Local de Kennedy y la Policía Nacional, con base a los diferentes requerimientos de los planteles educativos, juntas de acción comunal y ciudadanos en general, realizaron capacitación y sensibilización a toda la población para promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana, se priorizaron los siguientes temas:

- Derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos en atención al Nuevo Código Nacional de Policía, uso adecuado del espacio público, normas básicas de convivencia, documentación mínima para el ejercicio de una actividad comercial, conocimiento, reducción y manejo de aglomeraciones, garantizando el derecho de reunión, prevención de quemas ilegales, limpieza y recolección de residuos y de escombros. separación de residuos en la fuente, prevención por contaminación visual y auditiva, promoción de la Convivencia de las personas con animales, manejo de excretas.
- Responsabilidad derivada de la tenencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
- Capacitación socialización y sensibilización en normas de convivencia 2019 lugar: Barrio Tintalito, Villa la Loma, Pio XII, Dindalito, Tequendama, Britalia, Casa Blanca, Barrio Timiza.

De igual manera, el equipo de Gestores Locales de Seguridad y Convivencia, adelantó 184 acompañamientos, con el objetivo de mejorar la seguridad de los entornos escolares, parques y puentes peatonales, mediante la prevención, disuasión del delito, venta y consumo de sustancias alucinógenas, así como el fortalecimiento de los principios de articulación y corresponsabilidad social, con vendedores informales, comunidad educativa, residentes, policía, población flotante entre otros. Como resultado de las actividades anteriormente descritas, se logró una reducción de 510 casos de lesiones personales en comparación con el año 2018, lo que representa una reducción del 15,30%.

Víctimas

Los logros más representativos del proyecto están relacionados con las actividades de pedagogía social para la paz que se llevaron en la localidad y el fortalecimiento a las organizaciones e instancias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

de participación presentes en el territorio en aras de aumentar ostensiblemente su capacidad de gestión y liderazgo estratégico.

En los componentes de Participación y Paz y Reconciliación, 9.766 personas fueron vinculadas a procesos de paz y reconciliación a través de actividades como: (i) diplomado para el fortalecimiento de capacidades organizacionales, (ii) talleres de pedagogía social para la paz en colegios y organizaciones comunales, (iii) primer encuentro local de organizaciones de víctimas, (iv) Museo Itinerante de Paz y Reconciliación, Foro para la Paz, entre otros. En el componente de Inclusión Productiva, durante el 2019 se formuló el Primer Programa Específico de Esquemas y Proyectos Productivos para Población Víctima y durante la vigencia 2020 se pretende fortalecer 41 unidades productivas pertenecientes a víctimas del conflicto armado. Adicionalmente, en los componentes de asistencia y atención y de participación, las profesionales de enfoque diferencial de los Centros Locales de Atención a las Víctimas atendieron y las Referentes de Paz de la localidad atendieron individual y colectivamente a más de 2.362 personas víctima del conflicto armado.

Consideramos que estos logros constituyen la demostración de que desde lo local se pueden desarrollar actividades orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población víctima bajo criterios de eficacia y eficiencia.



Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética.

Ambiente

Para la vigencia 2019, se logró la siembra de 250 individuos arbóreos en las UPZ priorizadas y 400 m2 de cespiones con el fin de mejorar el paisaje de algunas zonas de la localidad, de igual forma se realizó la gestión ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA para la aprobación de la intervención de 1 hectárea con acciones de restauración en el sector de Villa Rica en la ronda del Río Tunjuelo; al ser el ambiente un aspecto transversal, se ve beneficiada toda la población Kennedyana a mediano y largo plazo aportando a la mejora de la calidad ambiental en la localidad, por lo que las intervenciones realizadas se hicieron de la mano con la comunidad para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones realizadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Durante la actual administración local, se realizó la siembra de 1000 individuos arbóreos y la intervención de 400 mediante acciones de mantenimiento; se gestionó la intervención de 1 hectárea de restauración ecológica y 0,7 hectáreas con acciones de re naturalización y finalmente, se mejoró la calidad del paisaje con acciones de empedramiento de 8500 m² en la localidad. En total se realizó la siembra y/o intervención de 1400 individuos arbóreos, se recuperará 1,7 hectáreas con acciones de re naturalización y/o eco urbanismo y se recuperaron 8500 m² de espacio público mejorando la calidad del paisaje.

La población beneficiada corresponde a todos los habitantes de la localidad de Kennedy en sus 12 UPZ en la medida que el ambiente es un aspecto transversal que, en su dimensión integral, involucra a todos los habitantes y los ecosistemas propios de la localidad. Este beneficio se coadyuva con las capacitaciones, sensibilizaciones, actividades de ejecución y la participación en las instancias con el fin de generar una corresponsabilidad entre el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, la Comunidad en general y los ejecutores de las actividades pactadas; generando la participación de los jóvenes, adulto mayor, mujeres, hombres, personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto, infancia y adolescencia y personas LGBTI, presentes en los puntos definidos para las intervenciones.



Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Fortalecimiento Institucional e IVC

Desde el componente de espacio público, se realizaron 258 acciones de vigilancia y control, que comprendieron sensibilizaciones, despeje de espacio público, comparendos, sellamientos, foto-comparendos, ajustados a la nueva normatividad nacional de policía y convivencia (Ley 1801 del 2016.) Desde el componente de medio ambiente se adelantaron 80 actividades de sensibilización, comparendos y operativos de salud y ambiente, logrando el disfrute del espacio público por la ciudadanía y el reconocimiento por la presencia de las instituciones en los territorios, principalmente agradeciendo el acompañamiento de la Alcaldía Local y su gobernabilidad en todos los rincones de la localidad.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Por su parte, desde el componente de seguridad, se realizaron 556 actividades de Inspección y Vigilancia a establecimientos de comercio, talleres, bares, alimentos y cárnicos, con lo que se obtuvo un crecimiento de la cultura de la legalidad respecto al cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento de los establecimientos de comercio, según lo estipulado en el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia”. Por último, en las ocho inspecciones de policía de la localidad de Kennedy, se adelanta el trámite de 24.937 procesos de control en temas de: Actividad económica, Contravenciones, Espacio Público, Querellas y Urbanismo.

Participación

La meta prevista para el cuatrienio comprende el fortalecimiento de 100 organizaciones e instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación local. En la vigencia 2019, se fortalecieron veinticinco (25) iniciativas en el marco del componente Modelo de Participación Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas, donde las organizaciones sociales presentaron proyectos relacionados a 12 temáticas focalizadas en problemáticas de sus comunidades. Además de esto, se fortalecieron las instancias de participación con el desarrollo del componente 2, Celebración Día Comunal, componente 3, Herramientas para el Cuidado y Bienestar de Líderes y Líderesas de la Localidad de Kennedy y el componente 5, Apoyo Técnico, Logístico a Espacios de Participación. Respecto de la meta que prevé la vinculación de 2000 personas a procesos de participación y/o control social: durante el 2019, se vincularon 368 personas mediante el desarrollo del Proceso de Formación Tipo Diplomado de 120 horas en temas de participación y/o control social, dirigido a líderes y lideresas de la localidad y la ejecución del componente Olimpiadas de la participación, donde se vincularon niños, niñas y jóvenes de la localidad en un proceso de formación en temas de participación, acciones que finalizaron con una olimpiada de fortalecimiento y cualificación de los conocimientos adquiridos en el proceso formativo.

Finalmente, en cuanto a la meta que prevé el acondicionamiento de una casa para la participación, la Alcaldía local de Kennedy incorporó el recurso destinado al proyecto de construcción de una nueva sede administrativa, la cual contará con un espacio llamado “casa de la participación” que estará adecuada con elementos para que las instancias de participación de la localidad logren desarrollar sus ejercicios participativos; actualmente se cuenta con todos los estudios y diseños de la nueva Sede Administrativa y su licencia de construcción por parte de la curaduría urbana No. 1. Por otra parte, la Alcaldía Local de Kennedy adecuó un espacio en su actual sede para las instancias de participación de su territorio, donde se han desarrollado los ejercicios participativos, además de contar con un equipo de profesionales que realiza el acompañamiento técnico y logístico.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques, dotación a jardines infantiles e instituciones educativas, salones comunales y escuelas de formación artística, contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL.


De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras crudas y, en lo participativo, facilita la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local de Kennedy.

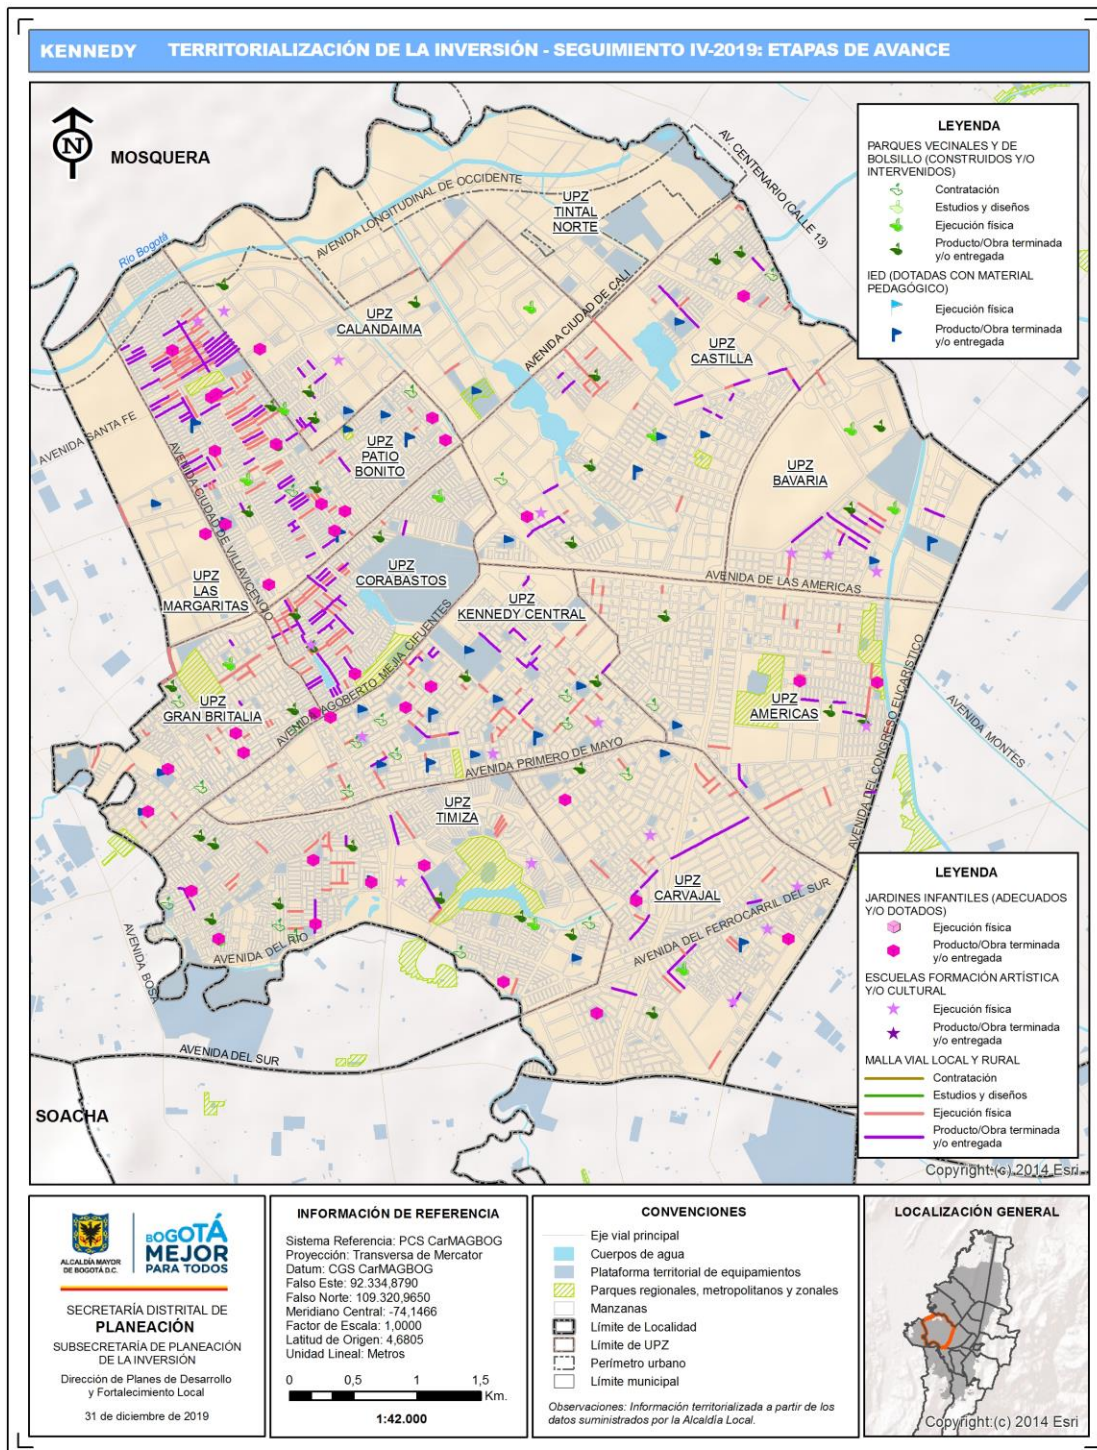

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Malla vial

Tabla No. 14. Territorialización malla vial local.

Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001892	KR 89D CL 35 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004904	KR 81K CL 41DBIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005066	KR 81L CL 41F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005191	KR 82 CL 41A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005281	KR 82 CL 42FBIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005385	KR 82 CL 42H S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004540	KR 82D CL 40D S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004329	KR 83 CL 40BISA S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004383	KR 83 CL 40BISB S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004481	KR 84 CL 40D S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004461	KR 85 CL 40D S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50004683	KR 82B CL 8BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006531	CL 48A S KR 81C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	7007871	KR 81J DG 56B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	7008779	KR 81J DG 56C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	7007872	KR 81J DG 56S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50002739	KR 81J DG 57 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50002759	KR 81J DG 57A BIS B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50002758	KR 81J DG 57A BIS C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50002760	KR 81J DG 57A BIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50002761	KR 81J DG 57A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50002757	KR 81J DG 57C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001151	KR 82B CL 8BISA	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	7007880	KR 81J NULL	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001066	CL 40A S KR 96	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001005	CL 40A S KR 96A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000969	CL 40A S KR 96B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000930	CL 40A S KR 97	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000901	CL 40A S KR 97A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000872	CL 40A S KR 97B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000846	CL 40A S KR 97C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000822	CL 40A S KR 97D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000795	CL 40A S KR 97F	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001128	KR 82B CL 8BISB	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000773	CL 40A S KR 98	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000748	CL 40A S KR 98A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000728	CL 40A S KR 98B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000710	CL 40A S KR 98C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000684	CL 40A S KR 99	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000665	CL 40A S KR 99A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000642	CL 40A S KR 99B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003736	CL 40D S KR 87BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011963	CL 42B S KR 93B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011964	CL 42B S KR 93C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001102	KL 82B CL 8BISC	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011965	CL 42B S KR 93D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011966	CL 42B S KR 94	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011967	CL 42B S KR 94A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011968	CL 42B S KR 94B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011969	CL 42B S KR 94C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003380	CL 42C S KR 88DBIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003316	CL 42C S KR 88FBIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003968	KR 86C CL 40 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004052	KR 86C CL 40A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003998	KR 86C CL 40BIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005290	CL 41D S KR 81ABIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004024	KR 86C CL 40BISA S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004189	KR 86C CL 40C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003735	KR 87BBIS CL 40C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003771	KR 87BBIS CL 40D S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003635	KR 87D CL 40C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003676	KR 87D CL 40D S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003339	KR 87H CL 40 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003275	KR 87I CL 40 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003199	KR 88 CL 40 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003218	KR 88B CL 40B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005116	CL 41D S KR 81D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002088	KR 89D CL 38 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002120	KR 89D CL 38A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002157	KR 89D CL 38B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002583	KR 89F CL 41 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002869	KR 89F CL 42F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002907	KR 89F CL 42FBIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002937	KR 89F CL 42FBISA S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001789	KR 91C CL 38C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapa avance
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001639	KR 93C CL 41 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001737	KR 93C CL 42 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005194	CL 42 S KR 81F	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011939	KR 93D CL 42B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011943	KR 94 CL 42B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011945	KR 94C CL 42B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001709	KR 94C CL 42F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001785	KR 94C CL 42G S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001662	KR 95A CL 42G S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001534	KR 95B CL 42F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001605	KR 95B CL 42G S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000894	KR 96 CL 38 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001002	KR 96 CL 38C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006248	KR 80H DG 42F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000861	KR 96A CL 38 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000952	KR 96A CL 38C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000833	KR 96B CL 38 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000913	KR 96B CL 38C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000968	KR 96B CL 40 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001028	KR 96B CL 40A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001095	KR 96B CL 41 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001115	KR 96B CL 42 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000803	KR 97 CL 38 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000879	KR 97 CL 38C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006176	KR 80I DG 42F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000776	KR 97A CL 38 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000851	KR 97A CL 38C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001239	KR 97B CL 42F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001305	KR 97B CL 42G S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000749	KR 97BBIS CL 38 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000819	KR 97BBIS CL 38C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000786	KR 97CBIS CL 38C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011957	KR 97F CL 42A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011959	KR 98BIS CL 42A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000919	KR 99 CL 42F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001929	KR 89D CL 35A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005128	KR 81GBIS CL 41F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000974	KR 99 CL 42G S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000881	KR 99A CL 42F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000927	KR 99A CL 42G S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000641	KR 99B CL 40 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000670	KR 99B CL 40A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000705	KR 99B CL 41 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000847	KR 99B CL 42F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000825	KR 99D CL 42G S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8008956	CL 42H S KR 78	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8008806	CL 42H S KR 78A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005279	KR 81GBIS CL 42 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8008715	CL 42H S KR 78B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8008608	CL 42H S KR 78C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8008509	CL 42H S KR 78D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8008973	CL 47ABIS S KR 78C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8008900	CL 47ABIS S KR 78D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8008811	CL 47ABIS S KR 78D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004344	KR 84 CL 40BISB S	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003820	TV 82CBIS DG 34B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50002741	DG 56B S TV 82A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005283	KR 78P CL 35BIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007428	KR 78P NULL	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002702	CL 35B S KR 87G	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002624	CL 35B S KR 87I	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002561	CL 35B S KR 88	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001962	KR 89D CL 36 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002503	CL 35B S KR 88BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002658	CL 42D S KR 90ABIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002983	KR 88F CL 40 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002933	KR 88G CL 40 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002108	KR 90D CL 40 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002200	KR 90D CL 40A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002666	KR 90D CL 42F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002747	KR 90D CL 42G S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002538	KR 91A CL 42F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002612	KR 91A CL 42G S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010379	KR 72 F BIS CL 39 B BIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001733	KR 92 CL 38 C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001820 KR 92 CL 40 S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001916 KR 92 CL 40A S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001367 KR 94 CL 40 S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001467 KR 94 CL 40A S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001037 CL 32 S KR 91C		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001475 CL 34BIS S KR 90C		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001131 CL 34S KR 91C		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8002005 CL 35A S KR 89C		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001930 CL 36 S KR 89D		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010304 KR 72 F BIS CL 39 B S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001963 CL 37 S KR 89D		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001141 KR 91BIS CL 26 S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001173 KR 91BIS DG 34 S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001218 KR 91BIS DG 34BIS S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011426 KR 68B CL 38F S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011984 CL 15A KR 80		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004798 CL 41A S KR 81H		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50008378 CL 41A S KR 81K		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004601 CL 41A S KR 82B		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004585 CL 41A S KR 82D		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010549 KR 72 F BIS CL 39 D S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004545 CL 41A S KR 83		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004518 CL 41A S KR 84		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004494 CL 41A S KR 85		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005968 CL 42BIS A S KR 80F		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006149 CL 42C S KR 80F		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006095 CL 42C S KR 80G		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006036 CL 42C S KR 80GBIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005986 CL 42C S KR 80H		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005940 CL 42C S KR 80I		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005887 CL 42C S KR 80J		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010603 KR 72 F BIS CL 39 F S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005856 CL 42C S KR 80FBIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005812 CL 42C S KR 81		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8012238 CL 42C S KR 81B		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005702 CL 42C S KR 81BBIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005646 CL 42C S KR 81CBIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005318 CL 42C S KR 81I		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005238 CL 42C S KR 81J		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005166 CL 42C S KR 81L		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005104 CL 42C S KR 82		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005053 CL 42C S KR 82A		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010694 KR 72 F BIS CL 39 H S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004987 CL 42C S KR 82B		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004939 CL 42C S KR 82D		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004875 CL 42C S KR 83		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004811 CL 42C S KR 84		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006311 CL 42CBIS S KR 80D		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006342 CL 42D S KR 80D		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50006668 CL 42D S KR 81D		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50006667 CL 42D S KR 81D BIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005449 CL 42D S KR 81G		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005395 CL 42D S KR 81H		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010450 KR 72 F BIS CL 39C S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006368 CL 42F S KR 80D		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005119 KR 81J CL 41F S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004697 KR 81K CL 41 S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004762 KR 81K CL 41A S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004761 KR 81K CL 41ABIS S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004779 KR 81K CL 41B S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004812 KR 81K CL 41BBIS S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004828 KR 81K CL 41C S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004853 KR 81K CL 41CBIS S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004876 KR 81K CL 41D S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006477 CL 1 KR 69A		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006479 CL 1 KR 69A		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006468 CL 1 KR 69B		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50002335 CL 1 KR 69BBIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50006449 CL 1 KR 69D		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006450 CL 1 KR 69F		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006444 CL 1 KR 69FBIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006436 CL 1 KR 70		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006425 CL 1 KR 70A		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50008338 CL 1 KR 70ABIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006699 CL 1 S KR 68C		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006691	CL 1 S KR 68D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007757	CL 25 S KR 70B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007591	KR 71C CL 25 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003500	CL 11 KR 68B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003425	CL 11 KR 68C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004054	CL 8A KR 69A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003937	CL 8A KR 69B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003946	CL 9 KR 69A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003843	CL 9 KR 69B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003722	CL 9 KR 69D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003577	CL 9 KR 70	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	7003642	CL 53A S KR 81B KR 81C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	7008774	DG 56A SUR KR 84 A TR 82 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	7008774	diagonal 56a sur cll 56sur cll 56b b	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003940	TV 71B CL 7B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	7008776	TV 82A DG 56C SUR DG 57 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	7008776	diagonal 56a sur cll 57sur cll 56b b	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	7008778	TV 82A DG 57 SUR DG 57A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	7008778	diagonal 56a sur cll 57sur cll 57a s	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8000883	CL 10 KR 81 A KR 81 B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000883	cil10 kr81b kr81a	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011303	CL 39G S KR 68G	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011359	CL 43A S AK 72	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011330	CL 43A S KR 72B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010809	DG 35A S AK 68	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010870	KR 68I CL 39 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011056	KR 68I CL 39A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8012463	KR 68I CL 39A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010960	KR 68I CL 39BIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011090	KR 68I CL 39CBIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011145	KR 68I CL 39D S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8011183	KR 68I CL 39F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8008643	KR 69B CL 31 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8008734	KR 69B CL 35 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8008902	KR 69B CL 36 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009003	KR 69B CL 37A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009166	KR 69B CL 37B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009211	KR 72H AK 72	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009507	KR 72H CL 38A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009636	KR 72H CL 38BBIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009882	KR 72H CL 39 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009541	KR 72H KR 72F	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009785	KR 72H KR 72F BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8012458	KR 72H KR 72G	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8000915	CL 10 KR 81 KR 81 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000915	cil10 kr81 kr81a	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001047	TV 73 CL 11D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001047	transversal 73 cil11d cil11f	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001088	TV 73 CL 11C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001088	Transversal 73 CL 11C CL 11D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001573	TV 78D CL 10	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001573	TV 78D CL 10 CL 10D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002595	CRA 81 CLL8A CL 8B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002595	cl42b sur kr90abis kr91	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001794	CL 10A KR 73B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001711	CL 10A KR 76	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000644	CL 11B KR 80B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000525	CL 11B KR 81A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000498	CL 11B KR 81B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000482	CL 11B KR 81C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000457	CL 11B KR 81D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000400	CL 11B KR 81F	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000373	CL 11B KR 82	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000345	CL 11B KR 82A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000320	CL 11B KR 82B	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000291	CL 11B KR 83	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8000267	CL 11B KR 84	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001283	CL 11F AK 72	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001190	CL 11 F KR 72 TR 73	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003621	CL 6B KR 79B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003055	CL 6B KR 80B	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50006524	CL 9 KR 78C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50006523	CL 9 KR 78G	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001510	KR 73B CL 11	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003808	KR 79C AC 3	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003743 KR 79C CL 6		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003629 KR 79C CL 6A		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003687 KR 79C CL 6BIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003054 KR 80B CL 6B		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001329 KR 81F AC 8		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001311 KR 81F CL 8BIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001273 KR 81F CL 8BISB		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001232 KR 81F CL 8BISD		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8003535 KR 87D CL 40 S CL 40 S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003535 KR 87 D CL 40 SUR CL 40 B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8001264 TV 74 CL 11ABIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003578 TV 71B CL 8BIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003578 Transversal 71 B CL 8BIS CL 8A		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005501 CL 46 S KR 83		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003662 CL 9B KR 69B		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007557 CL 56 S KR 81A		Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	7007894 CL 56 S KR 81G		Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	7007893 CL 56 S KR 81J		Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003662 Calle 9 B KR 69B KR 69DBIS		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005910 CL 35C S KR 78H		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8012391 CL 35C S KR 78I		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005915 CL 35D S KR 78I		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8012390 CL 35D S KR 78IBIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005615 CL 36 S KR 78N		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005547 CL 36 S KR 78P		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005368 CL 36 S KR 79		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007295 CL 39A S TV 73DBIS		Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007200 CL 39A S TV 73F		Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003663 TV 71B CL 8		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003663 Transversal 71 B CL 8 CL 8BIS		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007695 CL 41B S TV 78H		Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003690 CL 9C KR 69		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003690 Calle 9 C KR 69 KR 69B		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007148 KR 77 CL 38B S		Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003857 TV 71B CL 7C		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003857 Transversal 71 B CL 7C CL 8		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8003906 KR 87 CL 41 SUR CL 40C SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003906 kr87 cl41sur cl40c sur		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8003982 KR 69D CL 8		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003982 Carrera 69 D CL 8 CL 8A		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005403 CL 35BIS S KR 78L		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8004521 KR 79A CL 5 S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005403 CL 35BIS S KR 78L KR 78P		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005643 CL 3A KR 69D - KR 69F		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005643 cl3a kr69f kr69d		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007545 TV 78HBIS CL 41A S		Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005652 KR 79F CL 38CBIS S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005652 KR 79F CL 38CBIS S CL 39BIS		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005664 KR 78J CL 35 S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010571 CL 50 S KR 77K		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010393 CL 50 S KR 77L		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010300 CL 50 S KR 77M		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010201 CL 50 S KR 77N		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010124 CL 50 S KR 77N BIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8013320 CL 50 S KR 77P		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010045 CL 50 S KR 77P BIS		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009990 CL 50 S KR 77PBISA		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005664 KR 78J CL 35 S CL 35A S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010029 CL 58 S KR 78J		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005719 KR 79D CL 38CBIS S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005719 KR 79D CL 38CBIS S CL 39BIS		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005720 CL 39BIS S KR 79D		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005720 CL 39BIS S KR 79D KR 79F		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005768 CL 40 S KR 79F		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005768 CL 40 S KR 79F KR 79G		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005840 KR 78I CL 35A S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005840 KR 78I CL 35A S CL 35C S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005861 KR 79G CL 40 S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005861 KR 79G CL 40 S CL 40B S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005914 KR 78I CL 35C S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005914 KR 78I CL 35C S CL 35D S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005946 CL 46 S KR 81H KR 81J		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005199 CL 3A KR 73C		Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006660 CL 1 SUR KR 78F		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006642 CL 1 SUR KR 69		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007883	CL 14 SUR AK 68	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009579	CL 43 S KR 73D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009736	CL 43 S KR 73C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009866	CL 43 S KR 73B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010010	CL 43 S KR 73A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010096	CL 43 S KR 73	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005946	CL 46 S 81H 81J	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	7002022	DG 49 S KR 85 KR 86	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8005971	KR 75 CL 5A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005831	KR 81 J CL 45 BIS A S CL 46	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006135	KR 81 J CL 47 B S CL 49 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005576	KR 81 J CL 43 S CL 44 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005706	KR 81 J CL 45 BIS S CL 45 BIS A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006024	CL 46 S KR 81G KR 81H	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	7003337	CL 51 S KR 81 KR 81B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	7003515	CL 51C S KR 81 KR 81B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	7003736	CL 51C S KR 80H KR 80I	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005989	KR 81J CL 46 S CL 47B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005937	CL 40B S KR 79F KR 79G	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8008010	TV 78HBIS CL 44B S CL 45 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006986	TV 78 K CL 41 A S CL 41 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006977	TV 78 K CL 41 BIS S CL 41 A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006997	TV 78 K CL 41 B S DG 41 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006872	CL 38 B S KR 78 KR 78 B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007778	CL 42 F S TV 78 H BIS TV 78 H BIS A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007253	CL 42 B S KR 78 L KR 78 N	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007867	CL 44A S KR 78I KR 78K	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007716	CL 44A S KR 78K KR 78N	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007410	KR 79 CL 44 BIS A S CL 45 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007369	KR 79 CL 44 BIS S CL 44 BIS A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006301	CL 38 C S KR 78 K KR 78 M	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007078	KR 79B CL 42G S CL 42GBIS S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006701	CL 41B S KR 78P KR 79	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007297	CL 41D S TV 78IBIS TV 78J	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006214	CL 41 S KR 79C KR 79D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006257	CL 39BIS S KR 78N KR 78N	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007051	CL 40C S TV 78B KR 78D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006334	KR 78G CL 37 S CL 38 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006990	KR 78C CL 40 S CL 40B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006080	CL 39 S KR 78NBIS KR 78P	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006836	CL 41 D S KR 78 P KR 79	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006767	KR 78G CL 39 S CL 40 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006647	KR 78G CL 38C S CL 39 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006915	CL 40 S KR 78C KR 78D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006914	KR 78C CL 39A S CL 40 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006777	KR 78C CL 38C S CL 39 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006724	CL 38C S KR 78C KR 78F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006638	CL 38C S KR 78F KR 78G	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005541	KR 78H CL 33A S CL 34 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005486	KR 78H CL 26 S CL 33A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006003	CL 35 S KR 78A KR 78B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005971	KR 75 CL 5A S CL 26 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006766	CL 35C S KR 73C KR 73D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8013548	KR 78F CL 2A S CL 6 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006845	KR 74 CL 36B S CL 37 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006909	KR 74 CL 37 S CL 38 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007673	CL 42 F S TV 78 H BIS A TV 78 I	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007561	CL 42 F S KR 78 I KR 78 J	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001697	CL 5 KR 87 I KR 88	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8002704	KR 89 C CL 41 S CL 42 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	30001947	KR 89 C CL 42 F BIS A SUR CL 42 G	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8004648	CRA 78 CL5B CL 5C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8004562	KR 78G CL5C AV CL6	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8003264	CL 39A S KR 87D KR 87D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8003415	KR 87A CL 38C S CL 38C S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8003216	CL 39 S KR 87D KR 87D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006021	CL 2A KR 70ABIS - KR 70B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8002659	KR 89BIS CL 40 S CL 40 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001985	KR 87D CL 2A CL 3	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001105	KR 88 CL 6A CL 6D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	50000077	CL 8C KR 87B KR 88D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8004913	KR 78C CL 5 CL4	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8004621	KR 73B CL 5C AV CL 6	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8003127	CL 39B S KR 87HBIS KR 87HBIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006021	cl12a kr70b kr70a bis	Local	Ejecución física



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8008861	CL 42 F SUR KR 78 KR 78 B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8004636	KR 78G CL 5B CL 5C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001720	KR 91 A S CL 38 S CL 38 A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001748	KR 91 A S CL 38 A S CL 38 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001778	KR 91 A S CL 38 B S CL 38 C S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001838	KR 91 A S CL 38 D S CL 39 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001868	KR 91 A S CL 39 S CL 39 A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001896	KR 91 A S CL 39 A S CL 40 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8003093	CL 42 G BIS A KR 89 C KR 90 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8002467	KR 88 D CL 36 S CL 37 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8012102	KR 88 D CL 35 B S CL 36	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8002543	KR 88 D CL 37 A S CL 38 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8002413	KR 88 D CL 35 B S CL 35 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8009296	KR 77Y CL 47B S CL 47B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8009301	KR 77Y CL 47A S CL 47B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8009305	KR 77Y CL 47BIS S CL 47A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8009311	KR 77Y CL 48 S CL 48A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8012357	KR 77Y CL 47B S CL 48 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8009087	KR 78GBIS CL 49B S CL 51 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8011362	KR 72K CL 49 S DG 49A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8010468	KR 77KBIS CL 51A S CL 51A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006086	CRA 81H CLL 46S CL 47B SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8011259	KR 72K CL 48B S CL 49 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8010213	KR 73 CL 43 S CL 44 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8010321	KR 73 CL 44 S CL 45 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8008347	CL 42 F SUR KR 78 D BIS FR 78 F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8008532	CL 42 F SUR KR 78 C KR 78 D BIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8008625	CL 42 F SUR KR 78 B KR 78 C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8008926	KR 78GBIS CL 49A S CL 49B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006432	CL 35 S KR 73D KR 73F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006432	cl35 sur kr73f kr73d	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006517	KR 78C CL 37 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001303	KR 81 CL 8 B CL 8 C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8009580	KR 68 H BIS CL 31 A SUR CL 34 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8010153	KR 77N CL 52A SUR CL51A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	50006489	KR 71A CL 5C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005265	KR 6C CL 5	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006517	KR 78C CL 37 S CL 38 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005176	KR 70C CL 5	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006567	KR 68C CL1 - CL2	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006698	KR 68C CL1 S - CL 1	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006592	KR 78C CL 38 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8006393	KR 68C CL 2 CL 2A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8005022	KR 71A CL 5A CL 5A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8012547	CL 6 S KR 71D KR 71DBISA	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001238	CL 12BIS KR 71G KR 71G	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	50006456	CL 9CBIS KR 68G KR 69	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	30001780	CL 6 D KR 92 ALAMEDA	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	30001779	CL 6 D ALAMEDA KR 93 D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	50009071	CL 10 KR 87 B KR88D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8002000	KR 89D CL 37 S CL 37A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8012892	KR 93 D CL 6 C CL 6 D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	50000074	KR 88 D CL 8 C CL 10	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8012823	KR 92 CL 7 CL 8 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8009409	CL 39A S KR 72KBIS KR 72KBISA	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8009525	CL 39A S KR 72J KR 72JBIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8011854	KR 72 K CL 39 B S CL 39 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8011865	CL 38BBIS S KR 72HBIS KR 72HBIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8009272	KR 72HBISB CL 38 S CL 38 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007415	CL 36BIS S KR 72Q KR 72R	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8011866	CL 38BBIS S KR 72I KR 72I	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007880	KR 71DBIS CL 31 S CL 34 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8010961	CL 39A S KR 68I TV 68J	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007679	KR 71 CL 31 S CL 32 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007759	KR 71 CL 32 S CL 34 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007680	CL 32 S KR 71 F KR 72	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8011847	KR 68 A CL 40 S CL 39 IBIS SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007943	KR 70B AC 26 S CL 31 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8011336	CL 39H S KR 68G KR 68I	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8010305	CL 39 B BIS S KR 72 F BIS KR 72 G	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8008210	KR 69 B CL 24 A SUR CL 25 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8008123	KR 69 B CL 24 SUR CL 24 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8007971	KR 69 B CL 22 SUR CL 24 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8010836	CL 37 F KR 68 F KR 68 G	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	50006522	CL 9 KR 79 C KR 80	Local	Ejecución física



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	30001361	TV 73 CL 11 B CL 11C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8000910	KR 82 A CL 8 C CL 8 F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001295	TR 74 CL 11 A CL 11 A BIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001162	CL 8B KR 81C KR 81D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001033	CL 8B KR 82 KR 82A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001304	CL 8B KR 81 KR 81A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001123	CL 8B KR 81D KR 81F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001080	CL 8B KR 81F KR 82	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8000987	CL 8B KR 82A KR 82B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001254	CL 8B KR 81A KR 81B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001210	CL 8B KR 81B KR 81C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8013032	KR 79C CL 6BBIS CL 6BBIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	50009029	KR 72B CL 8A CL 8BBIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8003375	KR 74 CL 7 B CL 7 C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8000944	CL 8 B KR 82 B AV CIUDAD DE CAL	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8001638	KR 80 CALLE 8 C CALLE 8 D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8000428	CALLE 13 CARRERA 79 G CARRERA	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006592	KR 78C CL 38 S CL 38A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006661	KR 78C CL 38A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006661	KR 78C CL 38A S CL 38B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	7009216	TV 82A DG 57A SUR DG 57A BIS SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8013725	TV 82A DG 57A BIS SUR DG 57A BIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8013726	TV 82A DG 57A BIS B SUR DG 56B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	7002141	KR 85 DG 49 S CL 51C S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	7002247	KR 85 CL 51D S CL 52 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004757	CRA 84 CL 42 B SUR CL 42 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002718	CRA 89 B CL 40 B SUR CL 40 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003294	CL 39 A SUR CRA 87 C CRA 87 D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000027	CL 16 B BIS CRA 82 B CRA 83	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000025	CRA 83 CL 16B CL 16 B BIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005377	cra 81c cl 42 sur cl 41 f	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005506	cra 81c cl 42 sur diagonal 42a s	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006004	cra 81a cl 42f bis sur av. Cll 43 sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005882	cra 81c bis a av cll 43 sur cll 42 f b	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005630	CLL 42 SUR CRA 80J CRA 80 I	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000687	CR 98 B BIS CLL 38 C SUR CLL 40 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000497	CRA 81B CLL 11B CLL 11D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003653	CL 36 SUR CRA 84 CRA 85	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004741	CL 41 A BIS SUR CRA 82 B CRA 81	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004877	CL 41 D BIS SUR CRA 82 B CRA 81	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004699	CRA 83 CL 42 A SUR CL 41 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004816	CRA 83 CL 42 B SUR CL 42 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004663	CRA 84 CL 42 A SUR CL 41 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001595	CRA 96A CL 42A SUR CLL 42 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000957	CRA 97 A CL 41 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001069	CRA 96A CLL 41 SUR CLL 40B SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000655	CRA 98 CBIS CLL 38 C SUR CLL 40 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000977	CRA 97D CLL 42A SUR CL 42 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000736	CRA 98 CL 40 SUR CL 38 C SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002417	CARRERA 91 C CALLE 42 F SUR CA	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002500	CARRERA 91 C CALLE 42 G SUR CA	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002727	CARRERA 90 C CALLE 42 F SUR CA	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002795	CARRERA 90 C CALLE 42 G SUR AV	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002995	CALLE 42 F BIS SUR CARRERA 89 C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003013	CALLE 42 F BIS A SUR CARRERA 89	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005455	KRA 81C BIS A CALLE 42 CALLE 42/	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005314	KRA 81C BIS A CALLE 41F SURCALL	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004966	CALLE 41D SUR KRA 81 K KRA 80H	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005471	CALLE 42H SUR KRA 81 I KRA 81J	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50002874	KRA 84 CALLE 42C SUR CALLE 42 F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004947	KRA 83 CALLE 42C SUR CALLE 42 F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005351	CALLE 42H SUR KRA 81L KRA 82	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002225	KR 90 B CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002331	KR 90 B CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002162	KR 90 C CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002265	KR 90 C CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002055	KR 91 CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002132	KR 91 CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001931	KR 91 B CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002008	KR 91 B CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001876	KR 91 C CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001968	KR 91 C CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001715	KR 92 B CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001823	KR 92 B CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001657	KR 93 CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001771	KR 93 CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001545	KR 93 D CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001148	CL 38 A SUR KR 93D KR 94 C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001184	CL 38 B SUR KR 93 D KR 94 C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001223	KR 93 D CL 38 B CL 38 C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001183	KR 93 D CL 38 A CL 38 B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005140	cil 42h sur cra 82d cra 82b	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001285	CL 39 A KR 93 D KR 94 C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005282	cil 42h sur cra 82a cra 82	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001390	KR 93 C CL 38 C CL 40	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001581	KR 93 CL 38 C CL 40	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004368	KR 83 A CL 40 BIS B SURCL 40 B SL	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004429	KR 82 B CL 40 BIS B SURCL 40 B SL	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005666	KR 81 CL 42 SUR CL 42 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004938	KR 82 D CL 42 B BIS CL 42 C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005000	KR 82 D CL 42 C CL 42 F BIS SU	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005078	KR 82 D CL 42 F BIS CL 42 H	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005258	CL 42 F BIS SUR KR 81 L KR 82	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005192	CL 42 F BIS SUR KR 82 KR 82 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005126	CL 42 F BIS SUR KR 82 A KR 82 B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005065	CL 42 F BIS SUR KR 82 B KR 82 D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000849	KR 98 B CL 42 CL 42 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000772	KR 98 CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000814	KR 98 CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000856	KR 98 CL 41 SUR CL 42 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000907	KR 98 CL 42 SUR CL 42 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000794	KR 97 F CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000839	KR 97 F CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000563	kr 99 a bis cl 38c sur cl 38 sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000938	KR 97 F CL 42 SUR CL 42 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000821	KR 97 D CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000864	KR 97 D CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000916	KR 97 D CL 41 SUR CL 42 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000871	KR 97 B CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000923	KR 97 B CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000988	KR 97 B CL 41 SUR CL 42 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001052	KR 97 B CL 42 SUR CL 42 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000950	KR 97 C CL 41 SUR CL 42 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001009	KR 97 C CL 42 SUR CL 42 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000929	KR 97 CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000996	KR 97 CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001058	KR 97 CL 41 SUR CL 42 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001125	KR 97 CL 42 SUR CL 42 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000979	KR 96 A CL 40 SUR CL 40 BIS SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001041	KR 96 A CL 40 A SUR CL 40 B SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000709	KR 98 C CL 40 SUR CL 40 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000743	KR 98 C CL 40 A SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000619	cra 99 a bis cl40 sur cl 38 c sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004883	CKK 41 B SUR CR 81H CRA 81 K	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8011974	CL 42 A BIS SUR KR 94 C KR 95	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8011973	CL 42 A BIS SUR KR 93 C KR 94 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003660	CL 49 SUR KR 89 B KR 93 C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	30000703	CL 42ABIS S KR 80 D KR 80 F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006231	CL 42B S KR 80 D KR 80 F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000584	cra 99 c bis call 40 sur cil38c sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001841	KR 91 B CL 38 C SUR CL 40 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004508	KR 83 CL 40 D SUR CL 41 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000474	CL 11 A KR 82 KR 82 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8007464	KR 81 G CL 56 CL 57 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8011953	CRA 96B CL42A CL42F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8011955	KR 97 A BIS CL 42 A CL 42 F SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8011960	KR 98 A BIS CL 42 A CL 42 F SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	30000718	KL 100 CL 42 A CL 42 F SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8007009	KL 80 G CL 49 A SUR CL 49 B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8011950	KL 95 B CL 42 B CL 42 F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8011949	KL 95 A CL 42 B CL 42 F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006941	CL 46 S AK 80 KR 80	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001249	CRA 81 C CL 88 CL 8A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005210	CLL42H SUR CRA 82B CRA 82A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001417	CRA 81 CL 8A CL 8B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005408	CLL 42H CRA 81 J CRA 81L	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004910	CLL 42 B BIS SUR CRA 85A CRA 82L	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001427	CARRERA93D CL 40A SUR CL 40 SL	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008126	CALLE 20 S CRA 69A CRA69	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004406	CRA82D CLL 40B SURCLL 40 BISB SL	Local	Ejecución física



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005579	CL 42 SUR CRA 81 CR 80J	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005079	cll 42 h sur Cra 82d Cra 83	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006064	cra 68c cl 2b cl 3	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005760	cll 42 d sur cra 81d cra 81c bis	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003414	CL 49 sur CRA 90 A CRA 91	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009624	kr77u cl147a sur cl147b sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009621	kr77u cl147b sur cl148 sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009622	kr77u cl148 a sur cl148 sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009653	kr 78i call 57a sur- call 56a su	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008756	kr 73b Call40f sur call40h sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008696	kr73b bis cl140h sur cll 40 f sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008636	kr73c cl140h sur cl140 f sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000526	kr 78c cl114a cl116	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8000499	kr79a cl114 cl11 13	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8013244	cl38a sur kr72l kr72k bis a	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001351	cl18a kr81b kr81a	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8001292	cl18a kr81c kr81b	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009749	kr77t cl148a sur cl149sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8013311	cl148a sur kr78a kr78 a bis	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009069	cl148a sur KR 78a bis Kr78b	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008982	cl148a sur kr78b kr78c	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008899	cl148a sur kr 78c kr 78d	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008814	cl148a sur kr 78g kr 78d	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006956	TV 78K CL 41 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8002945	kr89 bis cl41 sur cl42sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003052	kr89bis cl42a sur cl42sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006956	TV 78K CL 41 S CL 41BIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8006967	CL 41D S KR 78N	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006967	CL 41D S KR 78N KR 78P	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008386	cl157a sur kr80a kr80b	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007002	TV 78K DG 41B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8007002	TV 78K DG 41B S CL 41D S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8007390	KR 78L CL 42B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8010891	cl37g sur kr 68g ckr 68f	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004431	kr71a cl16b cl16c	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8004364	kr71a cl16c cl17a bis	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009737	kr78h cl57a sur- cl 56b sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8007390	KR 78L CL 42B S CL 42F S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008918	KR 78G CL 49 S NULL	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009279	KR 77Y BIS CL 45 S CL 46B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006511	kr 74 cll 35a sur cll 35b sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006579	kr74 cl135b sur cl135c sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	7003414	cl154c sur kr81i kr81j	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	7003321	cl154c sur kr81k kr-81j	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	7003413	kr81i cl154c sur cll-54b su	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006843	cl147bsur kr80f kr80f bis	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006816	cl147asur kr80f kr80f bis	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009304	KR 72G CL 46B S CL 47BIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006944	kr68bis cl13sur cll 1sur	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009371	KR 79 CL 57A S DG 57BB	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009711	CL 58 S NULL	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009711	CL 58 S NULL CL 58BIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009804	CL 58 S KR 78M	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009804	CL 58 S KR 78M NULL	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009871	CL 58 S KR 78L	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009871	CL 58 S KR 78L KR 78	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009934	Transversal 68 G CL 34A S CL 35A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009976	TV 68G CL 35A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009976	Transversal 68 G CL 35A S CL 36 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8009996	TV 68G CL 36 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009996	Transversal 68 G CL 36 S CL 37 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8010040	TV 68 H BIS A CL 37 S CL 37BIS S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8010097	TV 68 H BIS A CL 37BIS S CL 37BIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	8010114	CL 58 S KR 78I	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8010114	CL 58 S KR 78I KR 78	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8010139	TV 68 H BIS A NULL CL 37B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8010220	TV 68 H BIS A CL 37C S CL 37D	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8010673	KR 72G CL 40 S CL 41A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8010774	KR 72G CL 41A S CL 42	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8010893	KR 72G CL 42 S CL 42B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8010912	Calle 39 Sur KR 68H KR 68H	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8010979	Calle 39 Sur KR 68GBIS KR 68H	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8011089	Calle 39 Sur KR 68G KR 68GBIS	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8011117	KR 72G TV 72FBIS TV 72	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8011223	KR 72G TV 72F CL 43A	Local	Ejecución física



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8011592	TRANSVERSAL688 cl44 sur cl43d	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8012477	TV 68 H BIS A CL 37BIS S CL 37A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8012479	TV 68 H BIS A CL 37B S CL 37C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	8012677	CL 10 KR 81 B AV KR 86	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8012677	cl10 kr86- kr81b	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8013449	TV 68 H BIS A CL 37A S NULL	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	30000657	KR 78G NULL CL 50	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50002875	CL 48 S KR 90A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50002079	carrera78i calle 54a sur calle 54b	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50002078	carrera78i calle 54b sur calle 54d	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008546	calle 57g sur carrera80h carrera8	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50002875	calle 48 sur carrera 90a avenida d	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50008225	CL 58A S CL 58BIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8012183	calle 38d sur carrera 86a carrera	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005645	carrera 81 c bis diagonal 42a sur d	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006830	calle 35c carrera 73d carrera 7	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50008183	CLL 48 SUR CRA 72N BIS CRA 72	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009620	CLL 47 B SUR KR 77 U KR 77 X	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009967	CLL 58 SUR KR 78 L KR 78 K	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008990	KR 78B CLL 49 S CLL 48 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008839	KR 78B CLL 49 S CLL 48 A SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003818	CL 8A KR69D 69F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006663	CL 35C SUR KR 73D KR73F	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005698	KR 79G CL 39 CL 40 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8006015	KR 79F CL 40 B SUR CL40C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8005862	CLL 40 B SUR KR 79G AV KR 80	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003801	calle 9d kr 69 kr 69b	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003581	calle 9d kr 69 kr 69b	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8003446	calle 9d kr 69b kr 69d bis	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009097	CLL 35 B SUR CARRERA 78I CARRE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8009037	CLL 35 B SUR CARRERA 78J CARRE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008989	CLL 35 B SUR CARRERA 78K CARRE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	8008959	CLL 35 B SUR CARRERA 78K CARRE	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1367-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50008225	CL 58A S CL 58BIS S KR 79	Local	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Parques

Tabla No. 15. Territorialización parques.

Código proyecto	Vigencia	Nombre parque	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	DESARROLLO VILLA DE LA LOMA	CALLE 42 B SUR ENTRE CARRERA 82B Y CARRERA 82D	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	DESARROLLO VALLADOLID	CRA 81 B ENTRE CALLE 8B Y CALLE 8C	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	KENNEDY ORIENTAL SUPERMANZANA 5	CALLE 34 SUR CON CARRERA 75	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	DESARROLLO ANDALUCIA	CRA 81 C ENTRE CALLE 13D Y CALLE 13F	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	URBANIZACIÓN EL PARAISO	CALLE 39 SUR ENTRE CARRERA 89D BIS Y CARRERA 90	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	LLANO GRANDE	DIAGONAL 38 BIS SUR CON TRANSVERSAL 83 C	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	EL PARQUE	DIAGONAL 42 SUR ENTRE CARRERA 72M Y CARRERA 72 N	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	VILLA ANDREA	CRA 85 ENTRE CALLE 51C SUR Y CALLE 51D SUR	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	SAN ANDRES	CALLE 43 B ENTRE CARREA 68G BIS Y CARRERA 68 H	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	DESARROLLO ALTAMAR	CALLE 42 A SUR CON CARREA 88D BIS	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	VILLA DE LOS SAUCES	CALLE 57 G CON CARRERA 78	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	LOS PINOS DE MARSELLA	TRANSVERSAL 70 CON CALLE 9 A	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	CRA 79 BIS ENTRE CALLE 56S Y CALLE 56A SUR	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 6A	DIAGONAL 37 D CON CARRERA 73A BIS	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	URBANIZACIÓN CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 6B	CALLE 39 SUR ENTRE CARRERA 78N BIS Y CARRERA 78P	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	FLORESTA DEL SUR	CALLE 1 SUR ENTRE CARRERA 68C Y CARREA 68 D	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	URBANIZACIÓN MANDALAY ETAPA A SECTOR II	CALLE 4 ENTRE CARRERA 73A Y CARRERA 73B	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	RIVERAS DE OCCIDENTE - UNIR II ZV 4 Y 8	CALLE 26 SUR ENTRE CARRERA 90A Y CARRERA 91C	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	UNIR 1-ETAPA I SECTORES I Y II	CALLE 34 B CON CARRERA 90	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	URBANIZACIÓN RECODO Y PETALUMA	CALLE 38 C SUR CON CARRERA 88	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	LA ALEJANDRA	CALLE 42 SUR CON CARRERA 72I	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	LAGO TIMIZA I ETAPA	CALLE 43 SUR CARRERA 73	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	URBANIZACIÓN BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	CALLE 56 A SUR CON CARRERA 79D	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	VILLA ALSACIA LOTE 1	CRA 71 C CON CALLE 12A	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	LAS PALMERAS	CALLE 38B SUR CON CARRERA 91 C	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	PUESTO DE MONTA	CRA 69D CON CALLE 1	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	TIERRA BUENA	CRA 99 A CON CALLE 34A SUR	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	URB PARQUES DEL TINTAL	CRA 92 CON CALLE 6D	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2017	VILLA DE LA TORRE	CRA 81 G ENTRE CALLE 42B BIS S Y CALLE 42D SUR	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	RIVERAS DE OCCIDENTE	CI 34 A Sur CI 37A Sur con Cra. 90A y Cra. 93B	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	DESARROLLO ANDALUCIA II SECTOR	CI 15A Entre Cra. 81 Bis y Cra. 81A, Costado Norte	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	EL PARQUE	CI 42 Sur y CI 42 B Cra. 72 K Bis A y Cra. 72 M	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	CASTILLA	Ac. 8 79 40	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	URBANIZACIÓN PIÀ XII	Cra. 78D y Cra. 78F y CI 6 A y CI 6A Bis	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	URBANIZACIÓN LA UNIDAD	CI 57D Sur 771 85	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	MARIA PAZ	CI 5A Sur con Cr 82	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	SAN MARTIN DE PORRES ETAPAS I Y II	CI 47 Sur 78A 51	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	DESARROLLO LAS BRISAS	CI. 42 Sur 89B 01	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	URBANIZACIÓN GRAN BRITANIA	Cr 82 47A 01 Sur	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	URBANIZACIÓN GRAN BRITANIA, DESARROLLO LA	Entre Cra. 81H y Cra. 80B, con CI 44 Sur y CI 46 Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 8	Cra. 77 NO 39-18 Sur	Bolsillo	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	VILLA NUEVA	CI. 39D Sur Cr 68B Bis A y LR 68 I	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	VILLA CASTILLA	CI. 7A Bis C Cr 80 Bis	Bolsillo	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	CATALINA II	Cr 77Q 54 18 Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	URBANIZACIÓN MULTIFAMILIARES LA PAZ	Cra. 68G 9D 52	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	VILLA ALSACIA LOTE 1	Ac. 12 y CI 12 A con Cra. 71 C	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1369-00	2018	URBANIZACIÓN OTERO DE FRANCISCO	CI 8A CI 8C Cra. 88D	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	URBANIZACIÓN VILLA ANITA	COSTADO ORIENTAL DE LA CALLE 54 SUR ENTRE CARRERA 87	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	CARVAJAL	KR 72N 35B 11 SUR	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	TOCAREMA	KR 88B CON CLL 5B	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	CALARCA	CARRERA 87 CON CALLE 46 SUR, COSTADO SUR-ORIENTAL	Bolsillo	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	URBANIZACIÓN BOITA II SECTOR	ENTRE CARRERA 69A Y CARRERA 69 CON CALLE 48 SUR Y CAL	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	KENNEDY SUPERMANZANA 1	ENTRE CALLE 24 SUR Y CALLE 27 SUR CON CARRERA 73 BIS (7	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	VISION DE COLOMBIA	ENTRE CALLE 15A Y CALLE 16 CON CARRERA 76D Y CARRERA	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	URBANIZACIÓN EL RUBI, URBANIZACIÓN PRADOS	CALLE 58 BIS SUR CON DIAGONAL 58A SUR, COSTADO NOR-O	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	LAGO TIMIZA	ENTRE CALLE 44 SUR Y CALLE 46 SUR CON CARRERA 73 Y CAR	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA	CL 42A SUR ENTRE KR 79B Y KR 79C, COSTADO ORIENTAL	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	CIUDAD KENNEDY ORIENTAL SUPERMANZANA 6	CL 36A SUR 73F 11	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	CARIMAGUA PRIMER SECTOR	CALLE 38 D SUR NO 72 I	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	DESARROLLO VILLA ANDRES Y DESARROLLO SANT	KR 88C BIS 40 40 SUR	Bolsillo	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	KENNEDY NORTH SUPERMANZANA 11	CALLE 42 A SUR KR 78K 31	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	MULTIFAMILIARES CARIMAGUA	CL 39S 72N 80	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	SUPER MANZANA 8	KR 78F 38 16 SUR	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	SUPER MANZANA 9B	KR 78M CON CALL 35 B 10 SUR	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	SUPERMANZANA 15	CALLE 42 F SUR # 79 - 45	Bolsillo	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	SUPER MANZANA 13	CL 40A SUR 79C 21	Bolsillo	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	KENNEDY ORIENTAL SUPERMANZANA 5	NOMENCLATURA OFICIAL: CALLE 35C SUR NO 75A-26	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	SINAI	TRANSVERSAL 80A CON CALLE 44A SUR, COSTADO NOR-ORIE	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	LAS LUCES Y VILLA RICA	CARRERA 77H ENTRE CALLE 51A SUR Y CALLE 52A SUR, COSTA	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	CATALINA II	KR 77K BIS 54 15 SUR	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	LA ALEJANDRA	CALLE 45A SUR NO 64B-55	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	URBANIZACIÓN RENANIA I Y II ETAPA	COSTADO SUR DE LA CARRERA 54 ENTRE CALLE 40 SUR Y DIA	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	CIUDAD TECHO II	CRA 82A NO. 6-38	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	DESARROLLO VILLA DE LA LOMA	CL 42B SUR 81I 06	Bolsillo	Contratación
3-3-1-15-02-17-1369-00	2019	VILLA ANDREA	CARRERA 81I NO. 51D 11 SUR	Vecinal	Contratación

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Jardines infantiles

Tabla No. 16. Territorialización Jardines Infantiles.

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre Jardín Infantil	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45305801	La Cometa	KRA 74 A 42 G52 SUR	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	46149101	<Null>	Av CI 43 Sur N. 88A-20	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45572402	Materile Lire Lo	CALLE 50 SUR 80 H 18	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2017	45578907	Britalia	CALLE 55 No. 80J - 17	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45352501	Class	CALLE 57 B SUR N° 80 H 15	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2017	45514201	Igualdad	CALLE 2 No. 68A - 50	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2017	45085301	Salacuna	CALLE 40 C SUR No. 77 - 10	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2017	45352501	Class	CALLE 57 B No. 84 - 15	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45069901	Argelia	CL 39 B Sur 72 G 62	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45514201	La Igualdad	CLL 2 No 68 A 80	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45557701	Luisa De Marillac	CLL 38 A SUR 86 F 15	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45058104	Lucerna	CLL 38 D SUR 72 Q - 91	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	46031801	Paraíso	CLL 39 Sur No 89 C 37	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45085301	Kennedy Salacuna	CLL 40 C SUR 79 -10	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	46077811	Casita De Ilusiones	CLL 41 SUR 94 - 04	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	46077902	Brisas De Alegria	CLL 41 SUR 94 - 12	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45761405	Creciendo Felices	CLL 50 A SUR NO. 80A-40	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45457874	Mi Pequeño Mundo	CLL 50 Sur No 78 -18	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45578907	Britalia	CLL 55 80 J 17 SUR	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45324301	La Unidad	CLL 57 D N° 77 I 85 SUR	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45641006	Semillas Del Futuro	CLL 5A NO. 86A-34	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	46031801	Paraíso	CLL 39 Sur 89C 37	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45445001	Delicias	CLL 44 Sur 72B 81	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45080102	Ciudad De Bogota	Cr 80 43 43 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45549001	Patio Bonito Satellite	CRA 87 No 5 B 21	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45361108	Las Voces De Los Niños	CRA 78 M No. 57 H-12 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	65030802	Vision De Colombia	CRA 79 G 13-09	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	46171325	Tintalito	CRA 86 B 42 F 03 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45551319	Mis Primeros Trazos	CRA 87 D No 39 - 10 SUR	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	43160211	Metro	CRA 88 C 43-37 SUR	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	46201901	Los Nietos Del Trueno	CRA. 80F 42-46 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45423601	Alqueria De La Fragua	KRA 68 A No 36- 25 Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45024608	Campo De Sueños	KRA 70 B No. 2-34	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45163701	Creadores De Sueños	KRA 72 L BIS NO. 48B-51 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45175701	Amas De Casa Jackeline	KRA 77 Q NO 45 A SUR 11	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45176408	Villa Rica	KRA 77K BIS A 50-64 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45083410	Jairo Anibal Niño	KRA 79 B No 41 B 34 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	65051301	Pio Xii	KRA 79 D No 6-15 Segundo Piso	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45252401	Ciudad De Bogota	KRA 80 43 43 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45559601	Risitas Infantiles Patio Bonito	KRA 86 D No 39 A 05 sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	46122922	Acunar Amiguitos Por Siempre	KRA 91 42 A 31 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	46277933	El Caracol	KRA 95 A N° 34 - 76 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	46098012	Acunar Juegos Y Aventuras	KRA 98 a 42 -13 Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2018	45445001	Delicias	TV 72 B SUR 44 C 19	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45305801	La Cometa	KRA 74 A 42 G52 SUR	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	46149101	<Null>	Av CI 43 Sur N. 88A-20	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45572402	Materile Lire Lo	CALLE 50 SUR 80 H 18	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45352501	Class	CALLE 57 B SUR N° 80 H 15	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45069901	Argelia	CL 39 B Sur 72 G 62	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45514201	La Igualdad	CLL 2 No 68 A 80	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45557701	Luisa De Marillac	CLL 38 A SUR 86 F 15	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45058104	Lucerna	CLL 38 D SUR 72 Q - 91	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	46031801	Paraíso	CLL 39 Sur No 89 C 37	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45085301	Kennedy Salacuna	CLL 40 C SUR 79 -10	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	46077811	Casita De Ilusiones	CLL 41 SUR 94 - 04	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	46077902	Brisas De Alegria	CLL 41 SUR 94 - 12	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45761405	Creciendo Felices	CLL 50 A SUR NO. 80A-40	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45457874	Mi Pequeño Mundo	CLL 50 Sur No 78 -18	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45324301	La Unidad	CLL 57 D N° 77 I 85 SUR	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45641006	Semillas Del Futuro	CLL 5A NO. 86A-34	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45549001	Patio Bonito Satellite	CRA 87 No 5 B 21	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45361108	Las Voces De Los Niños	CRA 78 M No. 57 H-12 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	65030802	Vision De Colombia	CRA 79 G 13-09	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	46171325	Tintalito	CRA 86 B 42 F 03 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45551319	Mis Primeros Trazos	CRA 87 D No 39 - 10 SUR	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	43160211	Metro	CRA 88 C 43-37 SUR	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	46201901	Los Nietos Del Trueno	CRA. 80F 42-46 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45423601	Alqueria De La Fragua	KRA 68 A No 36- 25 Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45024608	Campo De Sueños	KRA 70 B No. 2-34	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45163701	Creadores De Sueños	KRA 72 L BIS NO. 48B-51 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45175701	Amas De Casa Jackeline	KRA 77 Q NO 45 A SUR 11	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45176408	Villa Rica	KRA 77K BIS A 50-64 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45083410	Jairo Anibal Niño	KRA 79 B No 41 B 34 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre Jardín Infantil	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	65051301	Pio XII	KRA 79 D No 6-15 Segundo Piso	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45252401	Ciudad De Bogota	KRA 80 43 43 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45559601	Risitas Infantiles Patio Bonito	KRA 86 D No 39 A 05 sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	46122922	Acunar Amiguitos Por Siempre	KRA 91 42 A 31 SUR	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	46277933	El Caracol	KRA 95 A N° 34 - 76 Sur	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	46098012	Acunar Juegos Y Aventuras	KRA 98 a 42 -13 Sur	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45445001	Delicias	TV 72 B SUR 44 C 19	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	45305801	La Cometa	KRA 74 A N° 42 G - 52 Sur	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	43160211	Metro	KRA 88 C N° 43 - 37 Sur	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	46201901	Los Nietos Del Trueno	KRA 80 F N° 42 - 46 Sur	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	65030802	Vision De Colombia	KRA 79 G N°13 - 09	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-01-02-1365-00	2019	65051301	Pio XII	KRA 79 D N° 6 -15. Segundo Piso	Vecinal	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Instituciones Educativas Distritales

Tabla No. 17. Territorialización Instituciones Educativas Distritales.

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre IED	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45438113 <Null>	CLL 37 B SUR No.68 D-93		Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	65061701 <Null>	CRA 78 C No.8 A 43		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45352503 <Null>	CRA 80 I 57 B 50 SUR		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45662503 <Null>	CLL 5 A SUR No.88 B 08		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	46129704 <Null>	CRA 93 A No.42 A 37 SUR		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45111801 <Null>	CRA 78 G No.38 C 11 SUR		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	65168901 <Null>	CRA 86 No. 6 C 9		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	65140306 <Null>	CLL 11 B No. 80 B 67		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	46149101 <Null>	CLL 42 F SUR No.88 A 25		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45149701 <Null>	CLL 38 C SUR No.79 -08		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45140302 <Null>	DIAG 2 D No.79 C 83		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45175701 <Null>	CRA 77 Q No.45 A 21		Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45101601 <Null>	CRA 74 No.38 A 35 SUR		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45091901 <Null>	CLL 5 SUR No.72 A 69		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	46017601 <Null>	CLL 26 Sur 89 79		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	65062601 <Null>	CRA 78 F No. 7 D 3		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45104101 <Null>	CRA 78 No. 35-30 SUR		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45820401 <Null>	CRA 72 I No. 42 F -54 SUR		Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45075401 <Null>	CALLE 41 C SUR No.78 H -85		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45541404 <Null>	CALLE 1 BIS No.87-84		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	65026604 <Null>	CRA 69 No.7-90		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	43161706 <Null>	CRA 90 A No.46-50 SUR		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45053201 <Null>	CRA 72 L No. 34-19 SUR		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45085901 <Null>	CALLE 42 A SUR No.79 D-37		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	45071101 <Null>	CALLE 42 B SUR No.78 I -05		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2018	65092101 <Null>	CALLE 9C No. 68-52		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2017	45551002 <Null>	CRA. 87 A No.6A-23		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2017	455575 <Null>	CRA 87 H No. 39 A-23 SUR		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2017	45581001 <Null>	CRA 89 No.26-03 SUR		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2017	45578904 <Null>	CALLE 56 SUR No. 81-26		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2017	45352503 <Null>	CRA 80 I 57 B 50 SUR		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2017	45175701 <Null>	CRA 77 Q No.45 A 21		Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2017	45073201 <Null>	CRA 78 P No. 41-20 SUR		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2017	45111002 <Null>	CALLE 40 J No.78-08 SUR		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2017	45111002 <Null>	CALLE 40 B SUR No. 57-26		Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2017	65044415 <Null>	CRA 75 No. 8 B -86		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2017	45101601 <Null>	CRA 74 No.38 A 35 SUR		Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45101601 <Null>	CRA. 73 C No. 38 C 84 SUR		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45075401 <Null>	CALLE 41 C SUR No. 78 H -85		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45578904 <Null>	CALLE 56 SUR No. 81-26		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	43161706 <Null>	CRA. 90 A No. 46-50 SUR		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45053201 <Null>	CRA. 72 L No. 34 -19 SUR		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45073201 <Null>	CRA 78 P No. 41-20 SUR		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45116801 <Null>	CALLE 35 C SUR No. 78 F 81		Vecinal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45581001 <Null>	CRA 89 No.26-03 SUR		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45085901 <Null>	CALLE 42 A SUR No. 79 D -37		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45071101 <Null>	CALLE 42 B SUR No. 78 I -05		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45111002 <Null>	CALLE 40 J No.78-08 SUR		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	65148804 <Null>	TRANSV 77 B No. 49 A 05 SUR		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	455575 <Null>	CRA 87 H No. 39 A-23 SUR		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45101601 <Null>	CRA 74 No.38 A 35 SUR		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45091901 <Null>	CALLE 5 A SUR No. 72 A -69		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45104101 <Null>	CRA 78 No. 35-30 SUR		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45091901 <Null>	CRA 68 B BIS No. 01-09 SUR		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45149701 <Null>	TRANSV 62 B No.39-57 SUR		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45438113 <Null>	CLL 37 B SUR No.68 D-93		Vecinal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45033601 <Null>	CRA 70 B No. 24 B 35 SUR		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45053201 <Null>	TRANSV 72 B No. 44 C -19		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	65061701 <Null>	CRA 78 C No.8 A 43		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45352503 <Null>	CRA 80 I 57 B 50 SUR		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45662503 <Null>	CLL 5 A SUR No.88 B 08		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45104101 <Null>	CRA.77 A No. 38 C -01 SUR		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45053201 <Null>	CRA. 73 A BIS No. 36-47 SUR		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45111320 <Null>	DG 41 SUR No. 73 A -80		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	20511396 <Null>	CRA. 87 A No.6A-23		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	65140306 <Null>	CLL 11 B No. 80 B 67		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45149701 <Null>	CLL 38 C SUR No.79 -08		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	2051012903 <Null>	CALLE 38 B No. 89-81 SUR		Urbana	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	45140302 <Null>	DIAG 2 D No.79 C 83		Zonal	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-01-07-1360-00	2019	2051012998 <Null>	CRA. 88 A No. 11 A-21		Vecinal	Obra reportada y no ejecutada

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Escuelas de Formación Artística

Tabla No.188. Territorialización Escuelas de Formación Artística

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre Lugar	Dirección	Etapas avance
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	45105935 <Null>		CALLE 35B SUR 73b-37	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	45184101 <Null>		CARRERA 72N BIS 40C - 17 SU	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	45305901 <Null>		CARRERA 74 44-29SUR	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	45421934 <Null>		CR 68D 36A 21 SUR	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	45431305 <Null>		CR 68C 38G 58 SUR	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	45516811 <Null>		CARRERA 68C 2 - 04 SUR	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	45045638 <Null>		TRASVERSAL 68C 31 - 09 sur	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	45051125 <Null>		CL 37 F SUR 72 J 17	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	45081302 <Null>		Carrera 79B No. 42C – 26 sur	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	45113106 <Null>		CLL 40D SUR 78-02	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	46210901 <Null>		CRA 81 g 42 b 58 SUR	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	46273916 <Null>		CALLE 38C SUR 98C-17	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	46277605 <Null>		CALLE 34A SUR 97F - 41	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	65026603 <Null>		CRR 69 8-28	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	65026707 <Null>		Cl. 7a Bis 71a20	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	65027902 Salón parroquia Santa Juana de Arco		CRR 69 F 7A-13	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	65054449 Salón comunal Villa Galante		CLL 6B 79C-81	Ejecución física
3-3-1-15-02-17-1362-00	2018	65181001 <Null>		CLLE 2 91 - 11	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

Con relación a los temas de intervención en el pilar 1, se ha evidenciado que se han adelantado todos los procesos que permiten dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo local. En la medida que se ha dado cumplimiento a las necesidades identificadas y que son objeto de intervención, es claro que los recursos asignados no son suficientes para atender a toda la población potencialmente beneficiaria, por ende, no es posible atender todas las solicitudes recibidas.

En la vigencia 2019 no se ejecutaron actividades en materia deportiva, para lo cual se planifico el proceso de manera oportuna para garantizar que el proceso se ejecute en la vigencia 2020, dado que los beneficiarios en la localidad manifiestan la importancia de los procesos deportivos como herramientas y alternativas para el uso adecuado del tiempo, que incide en la calidad de vida y en el bienestar de los niños y tercera edad.

Con el fin de avanzar en las actividades, objetivos y metas que componen el pilar, es necesario fortalecer los procesos de formulación de aquellos proyectos en sus etapas de concertación y construcción con las instancias respectivas, facilitando el proceso contractual, teniendo en cuenta los procedimientos que deben surtir a nivel sectorial, así como los tiempos de acuerdo con la modalidad de contratación.

Así mismo, es necesario continuar con los procesos de socialización y comunicación de las actividades a la población, a través de medios alternativos locales de comunicación, con el fin de que la población objetivo se entere de una manera más amplia de la oferta institucional y participe de las diferentes convocatorias.

Pilar 2. Democracia urbana.

El pilar 2 ha evidenciado que se han adelantado todos los procesos que permiten dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo local, frente a las actividades a adelantar, siendo claro que, al tratarse de obras de construcción e intervención, requieren de tiempo necesario para que se cumpla con las condiciones y características que requiere el proyecto en sí.

Los procesos contractuales que se deben adelantar, a pesar de contar con pliegos tipo, implican un esfuerzo por parte de la Alcaldía Local para adelantar los procesos de verificación y evaluación de las propuestas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Teniendo en cuenta la complejidad de los procesos y el impacto en la localidad, es adecuado fortalecer los procesos de articulación y gestión con el IDU, con el fin de contar con la priorización de obras a realizar y lograr una mayor socialización de los mismos con la población beneficiaria.

Pilar 3. Construcción de comunidad.

En los temas de intervención en el pilar 3, se ha cumplido con las acciones proyectadas a ejecutar, el relacionamiento con las autoridades y la articulación para culminar diferentes procesos, ha permitido que se avance y se fortalezcan los diferentes frentes de seguridad, así como las intervenciones en territorio y la dotación en términos de seguridad.

En materia de víctimas, el proceso ha sido exitoso en términos de convocatoria y concientización en la localidad, no obstante, el número de población víctima en la localidad es muy alto, lo cual complejiza el alcance y la capacidad para beneficiar a toda la población identificada, con los recursos asignados.

En ese sentido, es claro que los recursos al ser limitados no permiten que se atienda a toda la población víctima identificada, por ende, es necesario articular acciones entre la Alcaldía Mayor y el nivel nacional, para poder establecer canales de atención y mecanismos de financiamiento, explorando temas de alianzas público privadas, con el fin de atender las necesidades identificadas y poder incrementar el número de beneficiarios de las acciones que abarca el plan de desarrollo local.

Con relación a seguridad y convivencia, se debe continuar con el fortalecimiento de los procesos de articulación, orientados a incrementar la dotación de las autoridades, y fortalecer los espacios de convivencia para todos los habitantes de la localidad.

Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética.

Las acciones en materia de sostenibilidad ambiental, a pesar de las que las necesidades en materia ambiental se incrementan, y la población beneficiaria ha avanzado en los procesos de conciencia ambiental, se ha logrado incrementar el número de beneficiarios por las acciones adelantadas a través de la suscripción de convenios interadministrativos, que permiten generar una mejor relación costo beneficio.

No obstante, es necesario que los habitantes de la localidad tengan claridad de las responsabilidades que se tienen ambientalmente, y lograr adelantar procesos que se mantengan en el tiempo, con actividades que no necesariamente están ligadas a la inversión de recursos, sino de hábitos que pueden ejecutar directamente en pro del ambiente sano y saludable, conservando las estructuras ecológicas, y desarrollando competencias en materia ambiental a través de capacitación.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



De la experiencia y las lecciones aprendidas en las actividades adelantadas, aunque el balance es positivo, es necesario articularse con diferentes entidades para generar procesos a escala, en materia de socialización, capacitación y divulgación.

Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Con relación a las acciones en referentes a Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, la administración ha dado cumplimiento a cada uno de los proyectos, metas y actividades que fortalecen los procesos de participación de la comunidad tanto para los ciudadanos como con los sectores y actores vinculados con instancias de participación local. Evidenciamos un crecimiento significativo de los participantes e interesados en los procesos adelantados por la alcaldía, así como una apropiación de los escenarios habilitados para sus expresiones, opiniones y procesos formativos relacionados con diplomados, entre otros.

De otra parte, se dio cumplimiento a las acciones proyectadas a partir de la articulación con actores, sectores, autoridades y entidades de cada uno de los procesos y proyectos que comprenden este eje transversal, permitiendo el avance y logros de las acciones, estrategias e intervenciones en territorio, el fortalecimiento local en campos institucionales como en lo relacionados con los procesos de contratación, adecuación o dotación para el funcionamiento.

Frente a las dificultades que se presentaron en los procesos de formulación y estructuración de los procesos de funcionamiento, se definieron y adelantaron lineamientos claros por parte de la administración y se fortalecieron los acuerdos, alcances y procedimientos con las entidades involucradas.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019

Ver Anexo No 1.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
