

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 14 de 2023

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 27 de abril de 2023

HORA: 08:30 am a 10:00 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo Triana	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Mauricio Mahecha	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)		X	
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL Colombia S.A. (CODENSA)	ENEL Colombia S. A. (CODENSA)	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Insuasty	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		
Lady Salamanca	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Juan Vargas	Profesional Alcaldía de Bosa	FDL Bosa	X		
Rosa Gómez	Profesional Alcaldía de Bosa	FDL Bosa	X		
Emma Bermúdez	Profesional Alcaldía de Bosa	FDL Bosa	X		
Yaneth Echeverría Becerra	Profesional Alcaldía de Kennedy	FDL Kennedy	X		
Aníbal Fernando Ospina Ardila	Profesional Alcaldía de Kennedy	FDL Kennedy	X		

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jesús Edimer Roncancio	Profesional Alcaldía de Kennedy	FDL Kennedy	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (12 Y 13 DE 2023).
4. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. Álvaro Reinoso Guerra en su calidad de encargado de la presidencia del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **(14)** del año 2023, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se coordina con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, el orden de intervención de las Alcaldías Locales, se realiza presentación e inicia su participación la delegada de la Alcaldía Local de Bosa:

3.1 Alcaldía de Bosa – Rosa Gómez:

Se tienen requerimientos para las empresas de servicios públicos de ENEL, VANTI y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Por tanto, se da la palabra a la Ingeniera Emma Bermúdez para que exponga la solicitud para los contratos de parques N°. 417 de 2021 y 340 de 2021:

3.2 Alcaldía de Bosa – Emma Bermúdez:

Para el contrato 417 del 2021, se realizó la ejecución de tres parques de la localidad, en este momento ya terminaron la intervención de obra civil y tenemos pendiente el tema de conexión del alumbrado público instalado. El contratista ha venido adelantando el proceso frente a la

revalidación de los diseños del 2019. ENEL contesta el 24 de abril, que frente a la revisión que hizo las factibilidades con los números correspondientes para cada uno de los tres parques se generaron unas condiciones, entonces quisiéramos conocer qué sigue en el proceso.

Respuesta ENEL Colombia – Pablo Ponce de León: Respecto al caso en específico no lo conozco, te solicito por favor remitir las comunicaciones o la última comunicación que llegó o salió de ENEL, entiendo que ya se les dio condiciones de servicio (factibilidad), se solicita confirmar.

En adición, se indican que son dos etapas, el primero es la parte de autorización del fotométrico y de las expansiones que entra por la UAESP, y el segundo es el punto de alimentación como tal del parque, es decir, por donde se va a conectar, que eso también pues nos corresponde a nosotros.

El tema de las expansiones, la tendrán que autorizar mediante los comités que se hacen semanalmente, donde se tratan los temas de expansiones de alumbrado y las solicitudes que llegan de clientes, ciudadanos, alcaldías Etc.

Se da el correo electrónico, y se solicita enviar la comunicación o la respuesta que emitió ENEL, para dar continuidad al trámite.

3.3 Alcaldía de Bosa – Emma Bermúdez:

Hemos adelantado mesas de trabajo y recorridos con la ingeniera Martha de zona 5 de la EAAB, ella nos ha acompañado, y se le ha manifestado las necesidades que se han presentado dentro del contrato 340 de 2022, correspondiente a la intervención de malla vial bajo la modalidad de mantenimiento. Específicamente en el sector Gran Colombiano, se está haciendo la intervención de 13 CIVs y forman una 'T', allí se ha encontrado tubería en asbesto cemento, por lo cual se debe realizar el reemplazo. Si bien dentro del contrato se dejó un rubro para intervención de redes, no es suficiente para satisfacer las necesidades que se han presentado en el desarrollo de la etapa de obra.

Así las cosas, se realiza la solicitud, que en la medida que pueda la EAAB en asumir los costos asociados a los materiales de tubería y la mano de obra, pues el contratista instala, pero nosotros sí, requerimos la tubería de 12 pulgadas y los accesorios para hacer ese reemplazo.

3.4 Alcaldía de Bosa – Isabel Sofía Picón:

El primero de marzo hicimos un comité en las instalaciones del Acueducto, se crearon varios compromisos el primero fue con respecto a la revisión de un pozo de inspección que se encuentra ubicado en el CIV 7005361, cercano al colegio Gran Colombiano, a ese pozo no se le encontró llegada de tubería.

La EAAB realizó la inspección hace diez días, en la misma determinaron que puede existir un taponamiento y que no llegan las redes, además, que el pozo está mal construido, por lo cual debe ser construido de nuevo, para que ahí lleguen las redes nuevas que se están instalando.

Actualmente se solicita a la EAAB confirmar la fecha de construcción para coordinar la conexión de la red, ya que nos ha afectado la dilatación de esta actividad.

Otro de los compromisos que se pactaron, corresponde a la red de 3" que por el CIV del colegio Gran Colombiano, se definió la red se va a trasladar al espacio público y pues que nos iban a colaborar con los accesorios.

Se envió a la ingeniera Martha el primer listado de accesorios el 28 de marzo, ella hizo algunas observaciones para dar claridad a los ítems, no obstante, se observó que en el cruce al siguiente CIV, la red cambia a 4", por lo cual, hubo un nuevo cambio el 14 de abril. A la fecha, no se ha recibido suministro de los accesorios, se solicita fijar fecha.

Respecto de los CIV que forman un 'T', nos encontramos con una tubería de 12" en asbesto cemento, allí se debe hacer remplazo y conexión, de tal manera, nosotros vamos a realizar un apique para identificar los accesorios. Se solicita acompañamiento del personal de la EAAB para determinar los accesorios que se requieren para hacer el empalme y que serán objeto de suministro por parte de la EAAB.

Frente al tema de VANTI, nos han brindado atención muy rápido, tenemos un tema de intervención de red antigua en el sector de gran colombiano, pero ya se generó la capacitación por parte de VANTI, la Ing. Patricia de esta ESP ha realizado un buen acompañamiento y está muy pendiente del tema, por lo cual, no hay requerimientos para esta empresa.

Finalmente, se presenta caso para la delegada de ETB:

- **Caso nuevo:** En el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renivelación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.

Respuesta EAAB – Ing. Javier Patiño: Respecto al suministro, ya se realizó la solicitud de la tubería al almacén, nosotros esperamos que mañana se pueda retirar, si pueden pasar por ella mucho mejor y se agiliza. Entonces, mañana en la tarde con Martha Ríos, que ha estado muy pendiente de ustedes, se pueden contactar para coordinar la entrega.

Para el caso del pozo que está por fuera de los tramos viales que tiene en ejecución el Fondo de Desarrollo Local, y que requiere ser reconstruido, se informa que fue incorporado en la programación, y será ejecutado en función de la disponibilidad de equipo y personal, por lo cual se requiere de paciencia.

Por último, para el apoyo de visita correspondiente a la bocacalle donde está la tubería de asbesto cemento en 12", lo podemos coordinar, y se solicita realizar el cambio de la red, ya que se pueden presentar problemas posteriormente en el segmento por la antigüedad de la tubería.

Se cita reunión en el tramo requerido por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, para el martes 02 de mayo de 2023 en el horario de la mañana.

3.5 Alcaldía de Bosa – Juan Vargas:

Soy ingeniero del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, estoy apoyando la supervisión del contrato 336 de 2022, se solicita coordinar intervenciones con la EAAB, en este caso específico hay seis segmentos viales en el barrio Argelia, de los cuales ya se tiene un diagnóstico inicial para intervenir a partir del 05 de mayo (según programación de contratista), no obstante, uno de los tramos esta para renovación de redes, ya que la tubería se encuentra en gres, los otros tramos tienen redes en concreto con profundidades mayores a 3,50 metros.

Al respecto, la EAAB ha indicado que adelantaba un contrato de estudios y diseños para la renovación de redes, por lo cual se solicita confirmación a la EAAB para poder ejecutar el contrato y se liberen los tramos, ya que la consultoría del Fondo responde al año 2018.

Respuesta EAAB – Ing. Javier Patiño: Desde la EAAB se informa que no es posible liberar los tramos, ya que esos segmentos tienen problemas por comportamiento hidráulico en redes, la tubería estructuralmente está en mal estado, en adición, corresponde a un sector que acaba de ser legalizado, y la EAAB ya tiene en curso una etapa de consultoría, incluyendo el sector de la Avenida Bosa hasta la diagonal 59 y desde la carrera 81 H hasta la carrera 81, y la EAAB proyecta iniciar obra en un año.

Por tanto, se solicita que la inversión de recursos del Fondo de Desarrollo Local se haga sobre otros tramos, ya que la EAAB realizará intervención para redes pluviales y sanitarias en este sector.

3.6 Alcaldía de Kennedy – Yaneth Echeverría:

Hago parte del área de infraestructura de Kennedy, en el momento tenemos un contrato de consultoría de malla vial donde se ejecutan 125 segmentos viales y dentro de las primeras fases de este contrato se requiere elevar consulta a las entidades públicas.

Aún nos faltan entidades por dar respuesta como Movistar, ETB, Tigo y Secretaría del Hábitat.

- **Caso nuevo:** Se solicita a ETB y Movistar respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.

Respuesta Movistar – Luis Enrique Gómez: Yo tengo a cargo el tema de validación de proyectos futuros en esos sectores, al respecto ya recibí respuesta por las áreas encargadas de despliegue de redes, entonces espero a más tardar mañana se esté dando respuesta por oficio.

3.7 Alcaldía de Kennedy – Jesús Roncancio:

Al respecto también se requiere conversar con la delegada de ETB, por tanto, se expone caso para remitir solicitud:

- **Caso nuevo:** La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle.
Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada

visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal manera, la Alcaldía necesita llegar el día 30 de junio con internet al predio, pero este requerimiento ha sido dilatado, porque no se tiene una respuesta real de si podemos hacer la instalación subterráneamente o aérea.

Intervención SDP – Paola Gámez: Teniendo en cuenta que la delegada de ETB no se encuentra en esta sesión, se remitirán casos para su estudio y atención.

Así mismo, se solicita a las Alcaldías Locales revisar si los casos expuestos durante el año 2022, ya fueron resueltos, en aras de dar cierre correspondiente en los documentos de control y seguimiento.

4 LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (12 Y 13 DE 2023).

La Ingeniera Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura a las actas dos últimas actas, correspondiente a la sesión número **12** y **13** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha 17 de noviembre de 2022, ante la cual, no se presentan observaciones.

También se menciona, que el acta N°. **8** de 2023 ya está publicada en la página Web de la SDP, así mismo, que las actas N°. **7, 9** y **10** están en proceso de publicación y las actas N°. **11, 12** y **13** inician el proceso firma, lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas:

N°. Acta	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Radicado SDP Respuesta Publicación
6	23/02/2023	X	X	X	X	3-2023-10298	3-2023-11613
7	02/03/2023	X	X	X	En trámite	3-2023-15456	Proceso 2183507
8	09/03/2023	X	X	X	X	3-2023-12388	3-2023-13783
9	16/03/2023	X	X	X	En trámite	3-2023-15456	Proceso 2183507
10	23/03/2023	X	X	X	En trámite	3-2023-15456	Proceso 2183507
11	30/03/2023	X	X	En trámite	Pendiente		
12	13/04/2023	X	X	En trámite	Pendiente		
13	20/04/2023	X	X	En trámite	Pendiente		

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el Ingeniero Álvaro hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, UMV, EAAB y ETB:

5.1 IDU – Álvaro Reinoso:

Se realiza observación para EAAB – Zona 2, en la calle 49 con carrera, 13, donde se informó que ya se había arreglado el espacio público, sigue con presencia de escombros, ya llevan casi un mes en el tramo vial, se solicita hacer la recolección.

5.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se reiteran los temas pendientes que han sido reportados por parte del IDU.

Por otro lado, se presenta una inquietud a ENEL Colombia, respecto a los reportes que se realizan por riesgos NO eléctricos, generados por la localización de la infraestructura de ENEL, por ejemplo, aquellas estructuras de ENEL que están desplazadas del nivel de pavimento y generan riesgo por seguridad vial.

Respuesta ENEL – Pablo Ponce de León: Lo que podemos hacer es que la canalices a través de mí, me encargaré de canalizarlas con el área de operación y mantenimiento, y ellos a su vez a las distintas zonas.

5.3 UMV – Humberto Ramírez:

Se expone el siguiente caso y se adjunta presentación:

- **Caso nuevo:** Para EAAB – Zona 1, se solicita realizar visita y medidas tendientes a reparar socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente – occidente.

5.4 ENEL – Pablo Ponce de León:

Se reportan los siguientes **casos resueltos y gestionados:**

- **Caso 407:** Está en ejecución esta semana, lo terminan mañana.
- **Caso 164:** Se encuentra en revisión con la UAESP, se está adelantado a través del Comité de alumbrado.
- **Caso 400:** Se efectuó recorrido el 6 de marzo, se está gestionando a través del comité de expansiones.
- **Caso 386:** Se realizó visita y se programó maniobra para segunda semana de mayo, no obstante, se necesita comunicación por parte del ciudadano para gestionar acciones que sean requeridas frente a obstrucción del predio.
- **Caso 236:** No se tiene requerimiento oficial, se solicita formalizar respecto a localización y si se hace referencia al mismo caso 407.
- **Caso 197:** Ya está cerrado.
- **Caso 46, 48, 49 y 50:** Cerrados, de acuerdo con confirmación de profesionales de la Alcaldía.
- **Caso 254:** Respecto al caso de la 80, ya se cerró, se coordinó con David Beltrán (PM de ENEL Colombia) maniobras.
- **Caso 256:** Atendido.
- **Caso 403:** Atendido.
- **Caso 347:** Se solicita nueva visita con Wilson Porras para dar cierre o gestionar, ya que en la verificación de 2017 hubo un daño por parte de ENEL, pero el año pasado hicimos una inspección donde se observaba la tubería e infraestructura en buen estado.

5.5 MOVISTAR – Lady Salamanca:

Se realiza requerimiento a Secretaría de Movilidad:

- **Caso nuevo:** Para SDM, respecto de la respuesta a solicitud de aprobación de PMT, se indica que en el mes de febrero se radicaron 76 puntos, en marzo 265 y en abril 150, para un total de 491 puntos pendientes, sobre los cuales no se ha recibido respuesta, es importante precisar que no nos han hecho observaciones, entonces queremos saber que ha pasado con la respuesta, ya que se cuenta con aprobación del IDU y pagos.

Respuesta SDM – Luis Humberto Gómez: Este tipo de trámites tienen una programación, donde se desarrolla lo correspondiente a estudios y se presentan para consideración.

Para ese cronograma, la SDM tiene una organización por zonas en donde hay profesionales encargados de atender de manera oportuna en el momento en que llega la petición, ellos dan respuesta o generan observaciones para su correspondiente atención, en ese orden de ideas, dado el tiempo y la magnitud de lo que tú estás manifestando, sería conveniente, remitir el número de los radicados para hacerle seguimiento.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se realiza seguimiento a los compromisos de la vigencia 2023 y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
366	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a realizar intervención de cambio de carpeta en este tramo vial y se requiere evaluar infraestructura de redes húmedas.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
367	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	IDU	PENDIENTE
368	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontró una acometida de agua que está dentro de una cámara de Movistar que se debe renivelar.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
370	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto Línea Techo Veraguas, adicionalmente se solicita lograr la viabilidad de inicio de actividades de modernización sobre el tramo 2 -	Entidades participantes en el Comité	SDP emitió respuesta con radicado SDP N°. 2-2023-18434

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	Calle 3 entre carrera 50 y Avenida 68 para el primer trimestre de 2023		
372	Para ENEL Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
373	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
374	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carreras 7 y 9 se realizó visita e inspección y se evidenció que corresponden a acometidas domiciliarias de la empresa de acueducto, se hace el llamado a la zona 1 de la Empresa de Acueducto para que por favor revise, se deja trazabilidad del caso en chat de grupo de trabajo y registro fotográfico	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
375	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
376	Se reporta que en la CI 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se está presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con CI 26, CI26 con KR 69 y el tercer punto CI 26 cerca de la Av. Boyacá	IDU	PENDIENTE
378	Solicitud de priorización al FDL de Usme sobre una intervención en la Calle 99 Sur No. 1A- 61, se remitió solicitud mediante correo electrónico	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE, Acta 05 :SDG indica que el correo fue remitido al fondo de desarrollo local sin embargo no se ha dado respuesta
379	Requerimiento de respuesta a la Zona 1 EAAB del radicado 3133002 -S-2022-317611 por concepto de instalación de tubería en acero de 14 pulgadas en la Carrera 62 entre Calle 169 B y Calle 167	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
380	Solicitud de trazabilidad en el comité respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Facón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A. En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Álvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	IDU	PENDIENTE
381	Requerimiento respecto a 110 puntos objetados por el IDU ni el IDPC ni el IDRD dan respuesta, lo que ha generado problemáticas para atender el proyecto de fibra óptica para la ciudad, solicita priorizar el caso	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
383	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cuse zar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Este y 1 Bis C, realizo obras dejando las cámaras de la ETB tapadas, solicita información para ver si por medio del IDU se pude contactar con ellos para que realice los correctivos sobre la infraestructura, queríamos saber si estas constructoras adelantan algún trámite ante el IDU para el recibido sobre el espacio público. Se deja reporte fotográfico por el chat del grupo.	SDP	PENDIENTE
384	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	PENDIENTE, Acta 05: el Ing. Luis Francisco indicó haber realizado el traslado de la solicitud
385	Solicitud de respuesta por parte de la EAAB respecto a los requerimientos E-2022-008905, E-2022-012772 del año pasado y uno realizado en enero de este año, indagando sobre unos tramos viales que están reservados por el consorcio Alcantarillado de Occidente, al momento no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
387	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
388	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Álvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
389	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	PENDIENTE
390	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de ENEL.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
391	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
392	Solicitud a la EAAB respecto a daños en proximidad al pozo de inspección, posibles daños en la red de alcantarillado. Se solicita evaluación por parte de la EAAB en la Carrera 52 C desde la Calle 41 Sur hasta la Calle 41 A Sur.	EAAB – Zona 2	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
393	Carrera 96 por Avenida Calle 63 hasta la Calle 66 A, en este corredor vial la UMV tiene proyectado iniciar obras en un proyecto piloto el día 15 de marzo, se solicita a través de este comité el apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado para lo que tiene que ver con el desarrollo de esta obra.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
394	Filtración de Cámaras en la Carrera 13 A No. 101 - 09 Edificio Oikos, se recibió una tutela por parte del dueño del predio ETB procedió a impermeabilizar la cámara luego de realizar visita conjunta con la empresa de Acueducto, sin embargo, persiste la filtración en el sótano del edificio. El ingeniero Jhon del acueducto programo visita en el edificio. Se deja trazabilidad del caso en el comité	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
395	Caso de una cámara localizada en la Carrera 23D No. 60A - 10 Sur que está sin tapa, una señora tuvo un accidente en dicha cámara	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
396	requerimiento respecto a una consultoría del 2018 sobre dos salones comunales, indica que en 4 años no se ha obtenido resultado alguno, sin embargo menciona que de la consultoría de ambos salones comunales el que se encuentra ubicado en la Carrera 35A con Calle 9 Sur detrás de la Iglesia de Santa Matilde requiere apoyo referente a un contacto para agilizar el trámite de disponibilidad de servicios públicos con Acueducto, Vanti y ENEL Colombia (CODENSA), indica que con Vanti ya se tuvo la primera audiencia sin embargo la idea es volver a solicitarla.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
397	Tienen 2 CIVs, en compañía del Ingeniero Francisco Rodríguez hemos venido trabajando nos encontramos terminando el primero del cual está pendiente solamente asfalto, había un compromiso de renovar la red de acueducto que se encuentra en asbesto cemento, antes de iniciar los trabajos la situación reportada había sido otra el compromiso con el acueducto era hacer el trabajo nosotros con el contratista realizar las zanjas y el acueducto hacer su trabajo, para eso en particular son el CIV 10002609 Y 16002550 poder tener una fecha definida con el Acueducto porque estamos en este momento frenados dependemos de esa tarea	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
398	otro caso es el del CIV 16002083 vamos a iniciar su intervención, es un callejón cerrado en pavimento flexible pretendemos hacerlo en pavimento rígido, pero por esa misma proyección que tenemos necesitamos la definición del acueducto si allá se van a cambiar o no las redes para poder definir tiempos de trabajo en conjunto. Dirección a intervenir Carrera 51 entre Calles 37 Sur y Calle 28 Sur	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
399	solicita una mesa de trabajo para un tema a nivel distrital sobre una intervención en la ladera del río Fucha, ya se solicitó mediante oficio, se hicieron unas propuestas de diseño para mitigar la habitabilidad de calle en ese lugar, se solicita concepto y reunión para solucionar eso.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
400	En la noche del 6 de marzo de 2023 se hizo un recorrido con la UAESP para el tema de las expansiones que necesitamos en un parque porque es un punto crítico de venta de estupefacientes y de habitabilidad de calle, en este momento se está generando un sendero con la comunidad a partir de la iniciativa juntos cuidamos Bogotá, pero necesitamos las expansiones de esa luminaria, la UAESP nos indicó que cuando termináramos el sendero hiciéramos otro recorrido para solicitarle a ENEL el tema de la expansión, nos gustaría darle celeridad a ese tema porque es un punto crítico de la localidad y la comunidad lo ha pedido mucho	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE Acta 14-2023: Se efectuó recorrido el 6 de marzo, se está gestionando a través del comité de expansiones.
401	se remitió al chat de trabajo un caso por la Avenida Calle 3 por Carrera 56 para la cual no se observó señalización alguna, fue enviado para verificación a quien está haciendo esa intervención con el objetivo de que se recupere el espacio.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
404	solicitud al acueducto zona 5 sobre un caso reportado en marruecos Calle 50 A Sur No. 7 – 64, requiere que atienda visita en este sector.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
406	solicitud para las empresas ENEL Colombia, Vanti, ETB y Acueducto, están por iniciar dos proyectos un parque de bolsillo en la Calle 7 con Carrera 3 y uno de espacio público en la Calle 12C entre 1A y Carrera 3 desde la Calle 12B hasta la Calle 12D, requerimos acompañamiento de las empresas con el objetivo de generar un diagnóstico de redes para que el contratista las tenga en cuenta, la semana pasa se enviaron las solicitudes, pero no se ha obtenido respuesta, pregunta que si por medio de este comité se puede generar la cita.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
408	presenta requerimiento para la zona 1 de acueducto con el ing. Mauricio Mahecha, donde un ciudadano reporta una queja indicando que hace más de dos meses la empresa de acueducto rompió e hizo una zanja frente al predio de la Carrera 46 No. 138 – 53 y no se ha recuperado, para que por favor zona 1 investigue a que contrato pertenece.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
409	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	SDM	PENDIENTE
410	En la Carrera 62 con Calle 62 hasta la Calle 64 en el barrio Santa Rosa Sur hay cuatro segmentos viales que no cuentan con alcantarillado pluvial, se solicita apoyo a la EAAB, la comunidad manifiesta que en ocasiones se ha generado inundación en sus predios.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
411	El año pasado se presentaron unas solicitudes de factibilidad a ENEL para el servicio en Betania y San Juan. Se hicieron visitas técnicas y nos informaron que para Betania se tenían que hacer unas adecuaciones eléctricas que ya se están estudiando dentro de una formulación. Sin embargo, quedó pendiente el tema de San Juan, indica que de esas visitas no recibió acta, adicionalmente desconoce si la información fue recibida por ingenieros y arquitectos que ya no están en el fondo, es decir que se perdió la trazabilidad del caso, pregunta si es posible que de parte de ENEL que le remitan las actas de esas visitas técnicas.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
412	El FDL de Chapinero el marco del Decreto Distrital 168 del 2021 ha solicitado la asistencia técnica tanto a empresas de Servicios Públicos como entidades distritales, sin embargo algunas de estas entidades no nos han dado respuesta, es muy importante contar con los delegados de cada entidad para poder llevar a cabo las mesas de trabajo de asistencia técnica teniendo en cuenta que en los estudios y diseños que existen en el banco del FDL de Chapinero se prevé la subterranización, traslado y protección de redes de servicios públicos perteneciente a los activos de cada empresa. Se han adelantado algunas mesas de trabajo con algunas entidades distritales, sin embargo, en este momento estamos a la espera de los delegados de la Secretaría Distrital de Planeación por parte de la Secretaria Jurídica, IDU, Claro, ENEL Colombia, IDPC, Movistar, Promo ambiental, Catastro, Une EPM, Grupo Energía Transición, DADEP, Requerimiento N. 2 Al IDU y Secretaría Distrital de Hábitat. En el mismo correo donde se envió la invitación a la convocatoria se va a enviar estos oficios con los acuses de recibido por parte de cada una de estas empresas y entidades, con el objetivo de contar con la asistencia técnica y respuesta oportuna a los procesos de formulación del FDL de Chapinero.	IDU	PENDIENTE
413	El contrato 159 de 2022 etapa preliminar, necesitamos iniciar unos trámites: Acueducto, ENEL Colombia y IDPC, por parte del IDPC estamos en trámite, al Acueducto se solicita visita para revisar el tema de CCTV de las redes.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
414	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	SDM	PENDIENTE

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
415	Solicitud al Ing. Pablo Ponce para que por favor nos ayude a evaluar el cobro de energía de la planta la esmeralda, la sede de producción, nos llegó un cobro por 235 millones de pesos, estamos un poco ilíquidos, de acuerdo con una revisión que hizo uno de los contratistas de ENEL para avaluar el cobro se dio cuenta que en algún momento el consumo de energía había bajado y establece que como es una sede industrial entonces nosotros producimos todos los días las mismas cantidades y no es así , hay meses donde no tenemos la mezcla de agregados y donde la producción baja, ya le escribí al Ing. Pablo Ponce no me ha contestado voy a reiterar a ver cómo nos puede ayudar para ver a quien le respondemos el requerimiento y si nos dan plazo para pagar eso.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
416	Corresponde a la filtración de aguas residuales entre la transversal 19 y calle 46 sur donde se ubica la central de ETB San Carlos, hay una filtración de aguas residuales que está llegando a la red de ETB y está ingresando al predio San Carlos y está generando malos olores adicionalmente está afectando al colegio Bernardo Jaramillo, no sabemos si hay un tubo roto conexión errada o alguna que está ocasionando esta problemática.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
417	Para EAAB – Zona 3, tenemos una filtración en una caja de paso en la Calle 36H Sur N°. 11A-08, se requiere una visita conjunta con la empresa para verificar los daños, se precisa de manera urgente pues corresponde al desagüe de una caja de paso sencilla y sobre la misma se ha presentado derecho de petición.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE Acta 13: Se indica que se remitió respuesta por correo, se informa reenvío de información el 20 de abril.
418	En la calle 127 con 13A, la semana pasada se informó al delegado de EAAB - Zona 1, sobre una filtración de agua, allí enviaron personal, pero dijeron que no era del alcance de ellos. Sin embargo, ETB está preparando la cámara y arreglando todo lo que le corresponde, no obstante, la filtración continúa. Por lo cual, se le requiere a la EAAB que revise la filtración y solucione este inconveniente.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
419	Evento SIRE 5414763, frente al predio ubicado en la calle 63A #68G-30, barrio Bosque Popular, localidad de Engativá, CIV 10009654 PK ID 1475178, se reporta socavación de 1.00X1.00 metro cuadrado y profundidad de aproximadamente 1.00 metro, es posible que se deba a un daño en la red de la EAAB, lo cual potencia la ocurrencia de accidentes. Se solicita visita de esta ESP, y que se tomen las medidas correspondientes, desde la UMV se reitera apoyo.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
-Casos presentados	365	100,00%	54	100,00%
-Casos resueltos al corte	214	58,63%	9	16,67%

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
- Casos pendientes al corte	151	41,37%	45	83,33%

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se logró resolver siete (07) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 46, 143, 254, 256, 386, 403 y 407, así mismo se presentan avances en otros casos a cargo de ENEL, por tanto, se espera verificación final para realizar cierre.

Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: Se logró resolver siete (07) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 46, 143, 254, 256, 386, 403 y 407; así mismo, se presentan avances en otros casos, sobre los que se espera efectuar verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.</p>	

Icono	Decisión
	<p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

8 COMPROMISOS

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
<p>1 Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.</p>	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 04-mayo de 2023
<p>2 Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Data Studio, correspondiente a gestión del Comité.</p>	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 04-mayo de 2023
<p>3 Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (virtual o presencial).</p>	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 04-mayo de 2023

9 CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye la sesión número catorce del Comité para la vigencia 2023, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 04 de mayo de 2023 a las 8:30 am, de manera presencial y/o vía Google Meet.**

En constancia se firman,



WILLIAM ORLADO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE



PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba – SDP.

Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.

Aprobó: William Orlando Luzardo Triana - IDU.

Anexo: 1. Presentación UMV – 27 de abril de 2023.
2. Tablero de control – COISP – Corte del Acta 14 de 2023.



UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL




BOGOTÁ

TEMAS 27 ABRIL 2023
COMITÉ OPERATIVO





Socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente - occidente

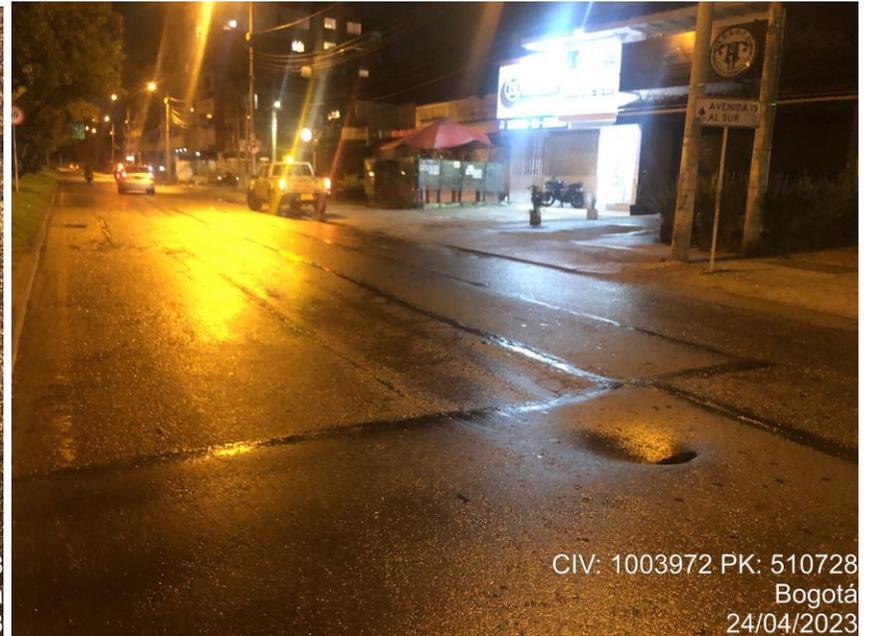

"Al parecer está relacionado con red de alcantarillado de la EAAB"





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial




@UMVbogota



UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



Número de casos registrados por mes

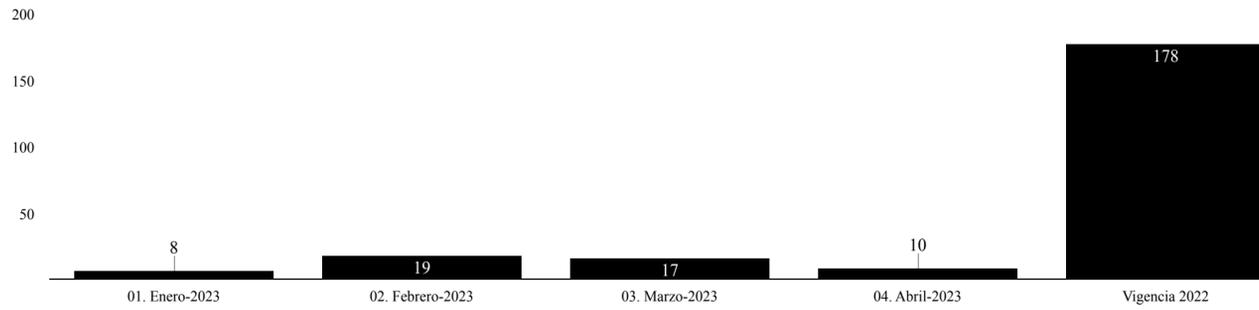

Nº. de casos registrados

232




Consulta por Entidad que presentó el caso

Consulta por Entidad Responsable

MES REPORTE DE CASO

Número de casos resueltos por mes

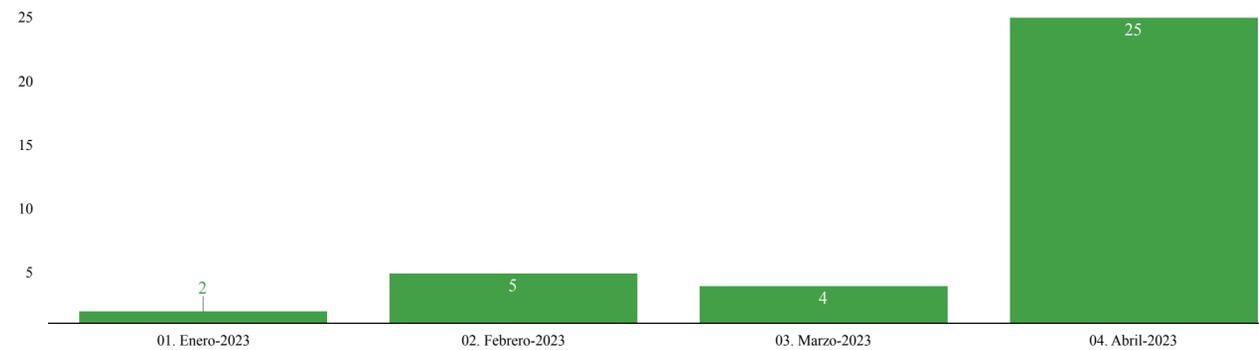


Nº. de casos resueltos


36



Porcentaje de avance

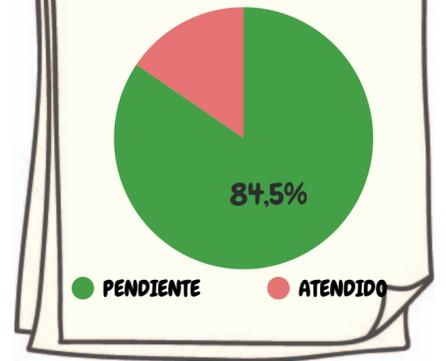

Número de casos pendientes por mes

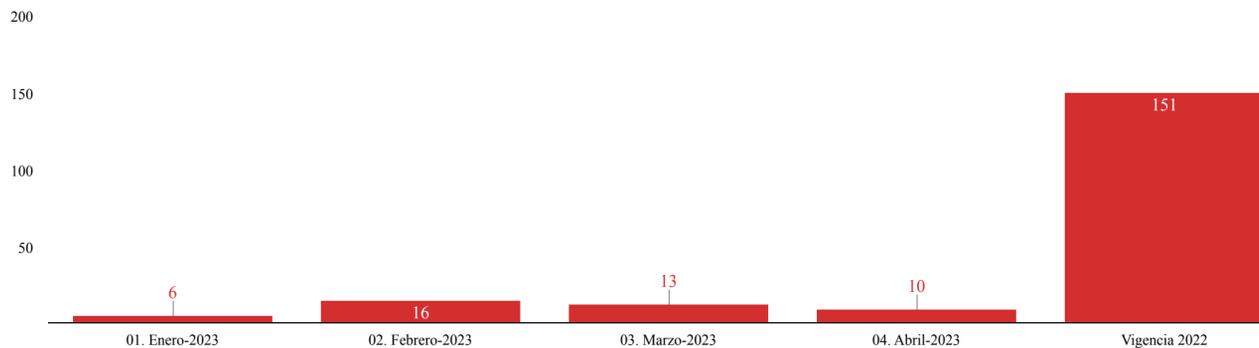

Nº. de casos pendientes

196



TOP - Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	45
2. EAAB - Zona 2	27
3. IDU	23
Total	232


TOP - Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	14
2. EAAB - Zona 2	3
3. VANTI GAS NAT...	3
Total	36


Recuento de casos

Nº. SESIÓN DE ...	Nº. DE CA...	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO
02 - Enero 26 de 2023	369	IDU	Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero qu...	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
02 - Enero 26 de 2023	368	MOVISTAR	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontr...	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	366	UMV	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A - CIV 1005620, ya que se va a rea...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	367	MOVISTAR	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se pres...	IDU	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	372	SDG	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contr...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	371	Alcaldía San Cristóbal	Para Enel Colombia, la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022...	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de ...	373	EAAB - Zona 4	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio car...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	370	ENEL COLOMBIA	Se solicita coordinación con entidades como Acuecuto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto...	Entidades participantes en el Co...	PENDIENTE
04 - Febrero 09 de 2...	374	UMV	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carrera...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	377	Alcaldía Kennedy	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully ...	IDU	ATENDIDO
05 - Febrero 16 de 2...	376	MOVISTAR	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos:...	IDU	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	375	UMV	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	385	Alcaldía Engativá	Solicitud de respuesta por parte de la EAAB respecto a los requerimientos E-2022-008905, E-2022-012772 del año pasado y ...	EAAB	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	384	ETB	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	382	ETB	Se reporta novedad en cámara de ETB con filtración de aguas negras en la Calle 20 No. 13 - 29 se deja registro en video por e...	EAAB - Zona 3	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	383	ETB	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Est...	SDP	PENDIENTE

Número de casos registrados por mes

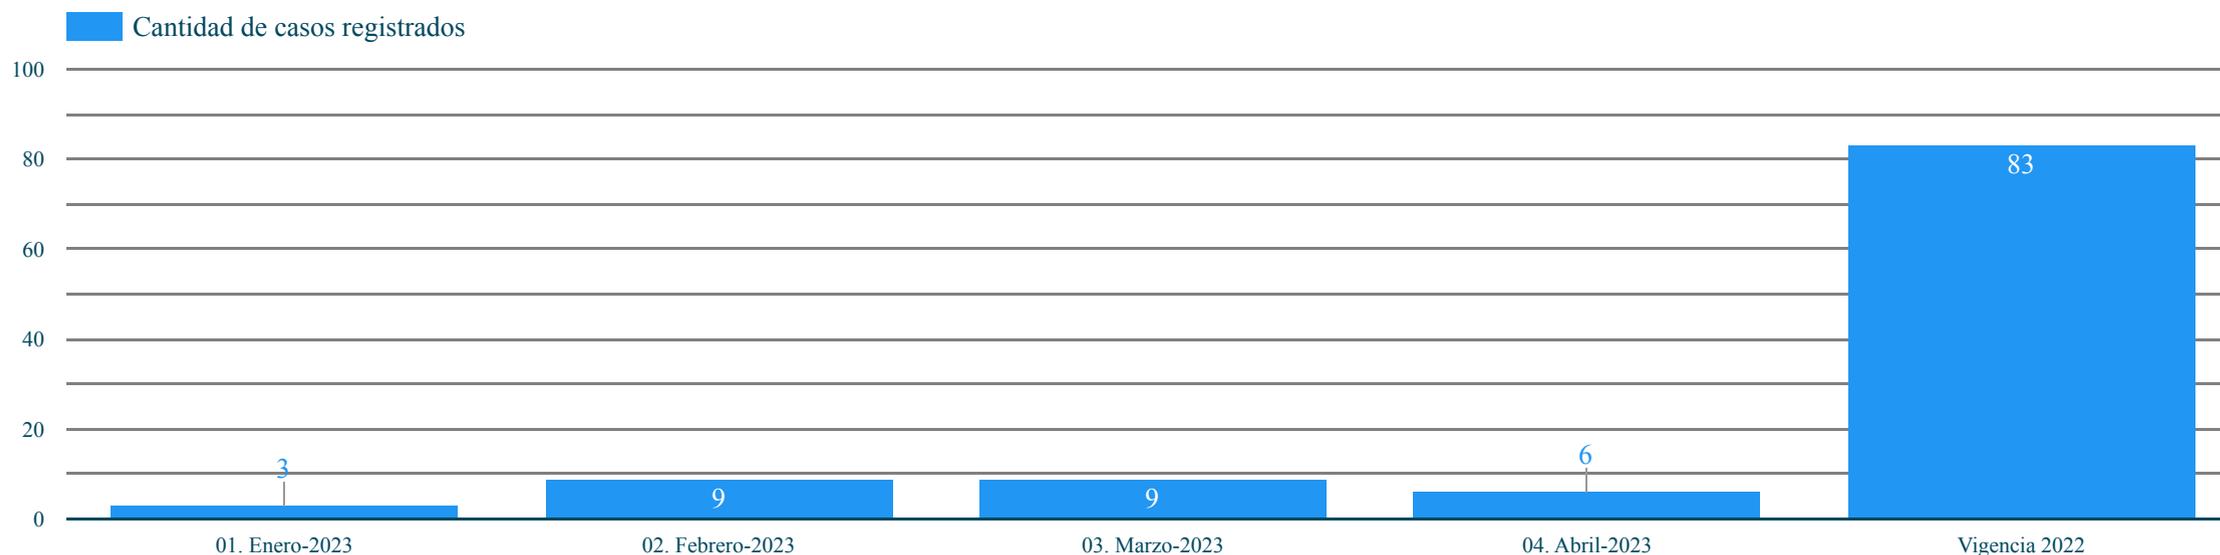


Número de casos por zona o área pendientes

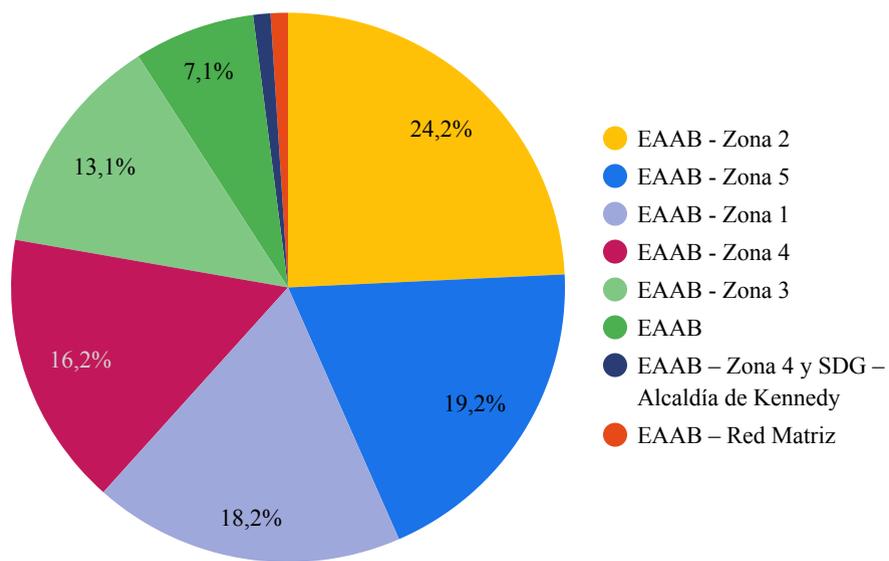


Nº. DE CASO...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EAAB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021)	PENDIENTE
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	PENDIENTE
29	Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021)	PENDIENTE
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU - II Sesión 2022)	PENDIENTE

Número de casos registrados por mes

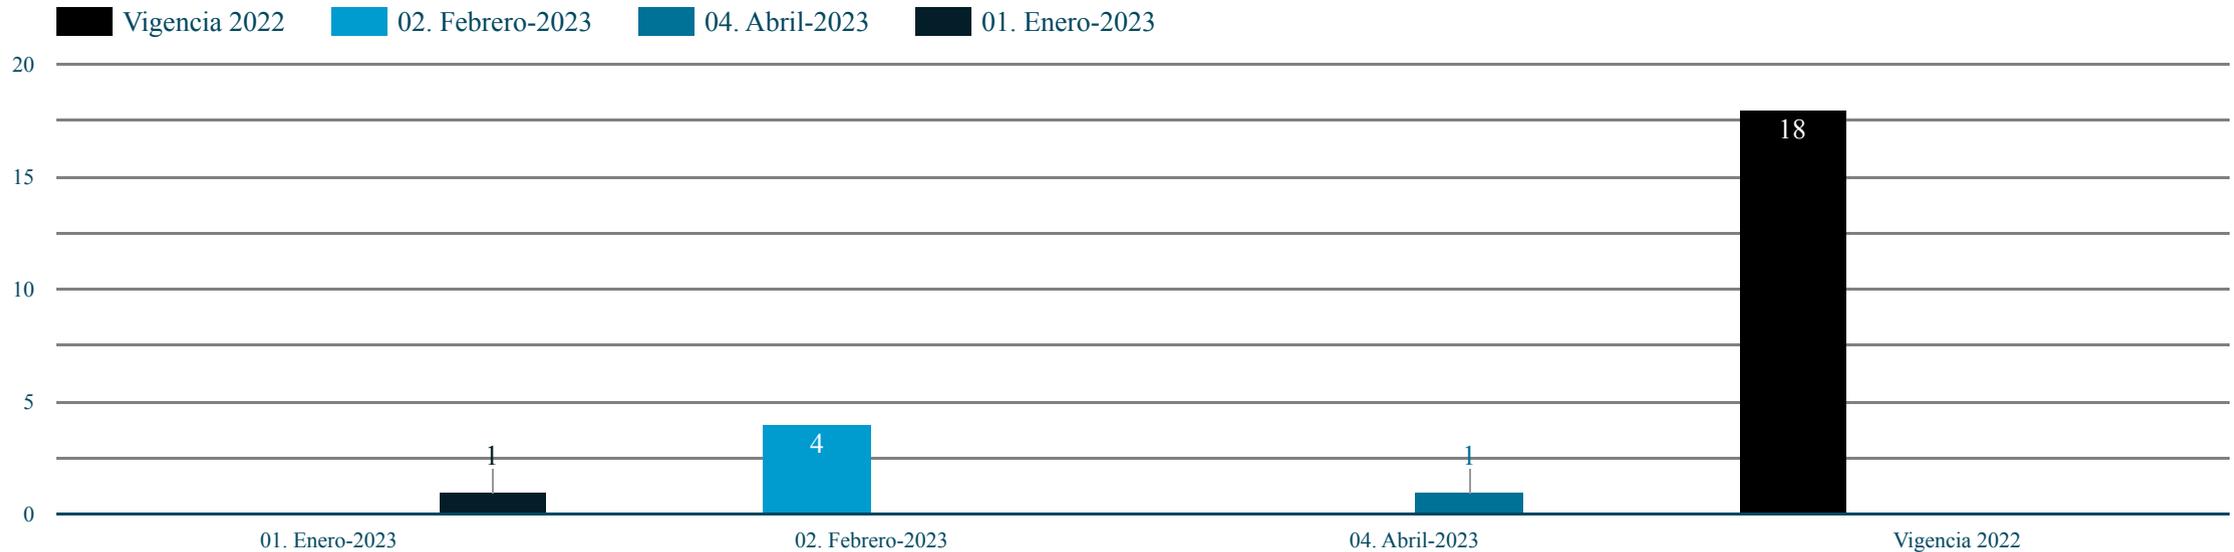

Número de casos pendientes por responsable

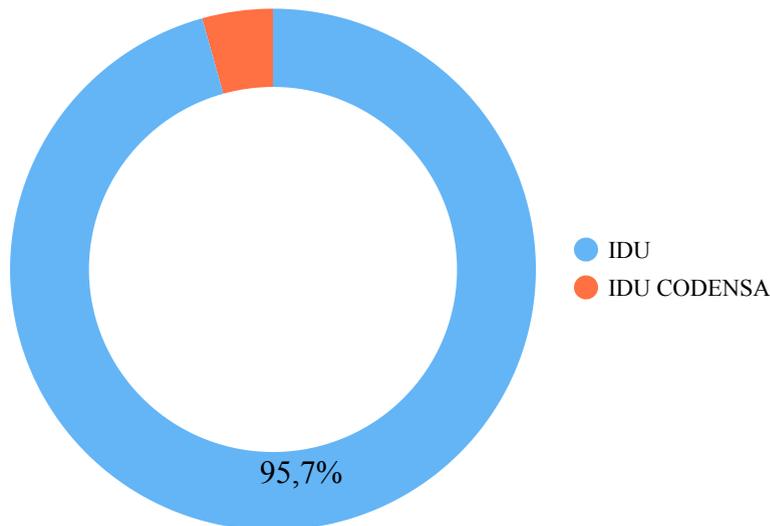

MES REP...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Se reporta que en la CI 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, CI26 con KR 69 y el tercer punto CI 26 cerca a la Av Boyaca	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va	PENDIENTE



Casos: Unidad de Mantenimiento Vial - UMV

N°. de casos registrados

4


N°. de casos resueltos

3

Número de casos registrados por mes




Pendientes por Entidad que presentó el caso




MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Para UMV, en la localización TV 19 con CL 44 sur y CL 47 sur, la calzada está bastante afectada ocasionando alto riesgo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para la UMV, para las intervenciones en el barrio "20 de julio", se requiere contacto del área de intervención, en aras de realizar proceso de coordinación al respecto de las obras adelantadas en este sector.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para UMV, se le consulta al Ing. Humberto frente a la intervención realizada en el barrio el Tuno – Calle 118 Bis Sur N°. 0-61, se reportó que la reserva del tramo corresponde a la UMV, por lo cual se requiere verificar si al efectuar labores de mantenimiento en carpeta de rodadura, se taparon dos pozos de alcantarillado, se requiere ingresar a los pozos para hacer mantenimiento a la red.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	ATENDIDO


Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso

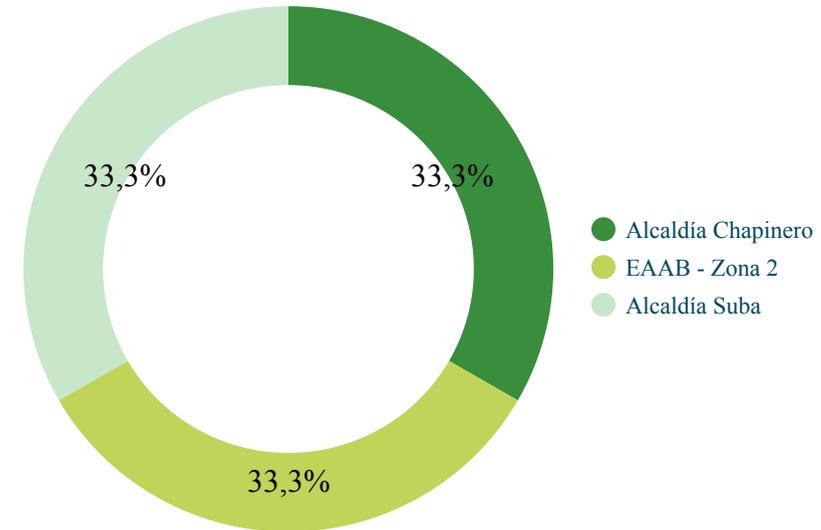

MES REPORTE DE CASO	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	PENDIENTE
03. Marzo-2023	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	PENDIENTE
04. Abril-2023	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para SDM, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir aprobación de los diseños de señalización para el contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para SDM, frente al contrato N°. 398 de 2017 se tiene aprobación de los diseños, ya se cuenta con implementación de la señalización, se requiere recibo por parte de la Entidad, para generar certificado de “paz y salvo” en esta vigencia, y así desembolsar recursos de la liquidación.	ATENDIDO



Casos: ENEL Colombia ESP


N°. de casos registrados

46


N°. de casos resueltos

14

Número de casos registrados por mes

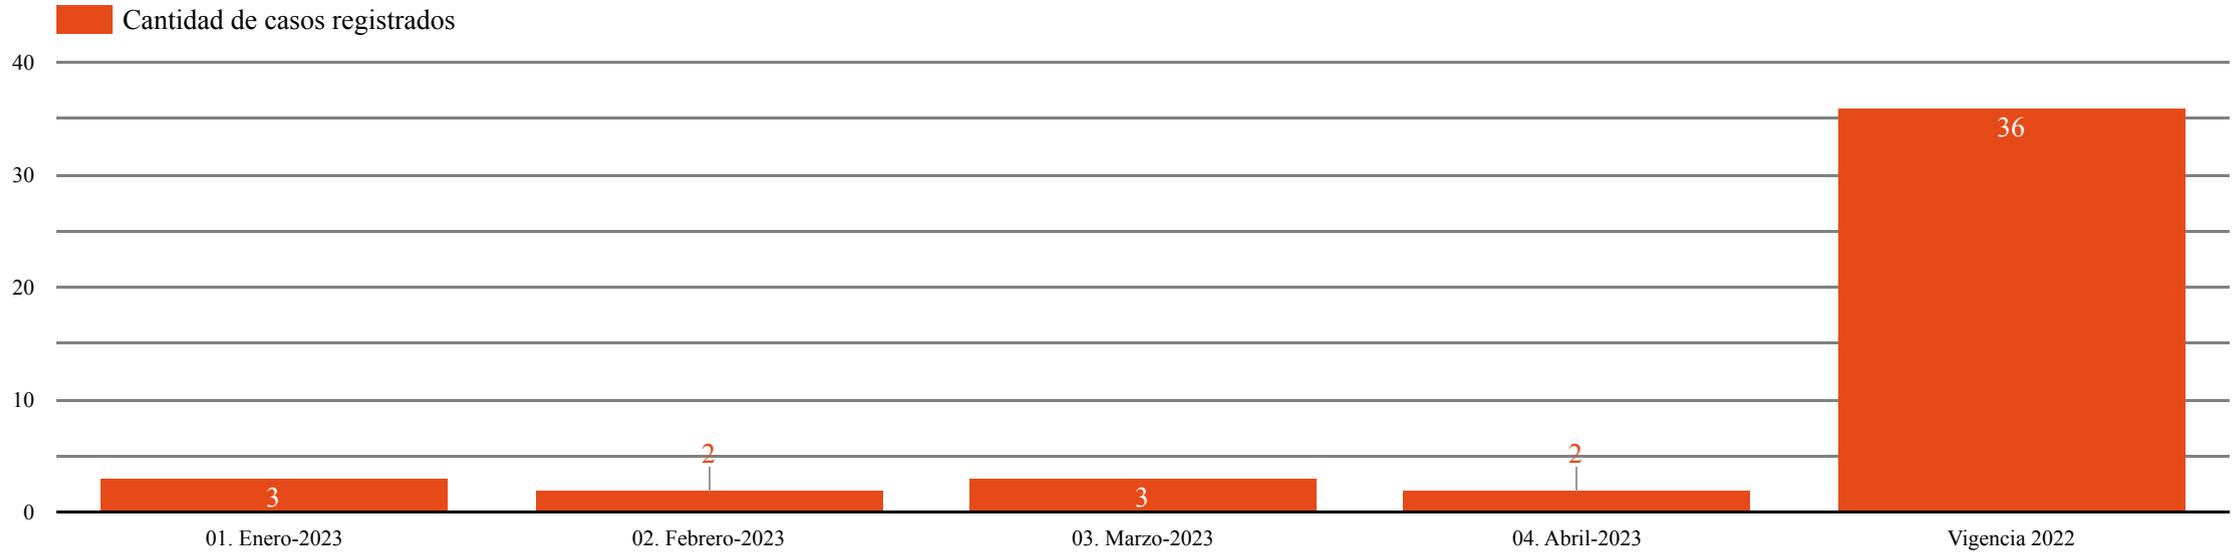


Número de casos pendientes por responsable

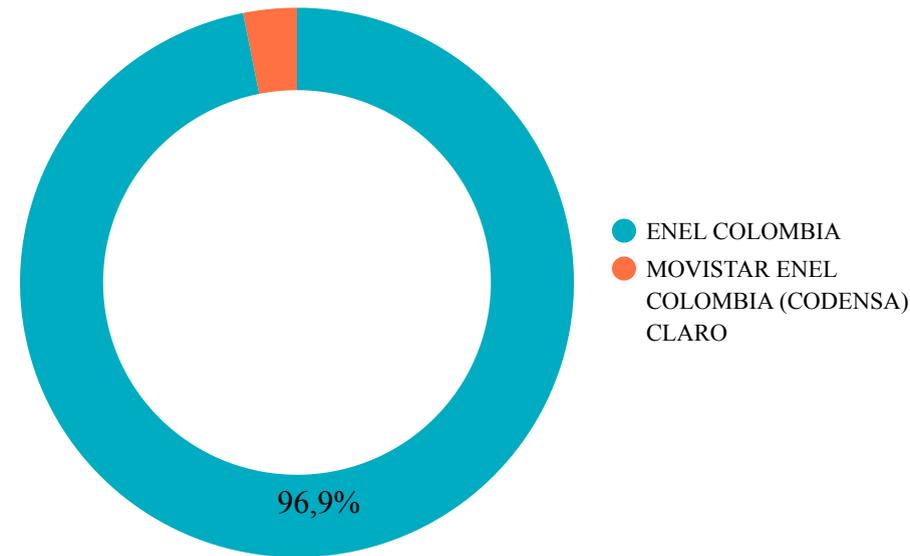


MES REPORT...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	PENDIENTE
01. Enero-2023	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	PENDIENTE
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa	PENDIENTE



Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso

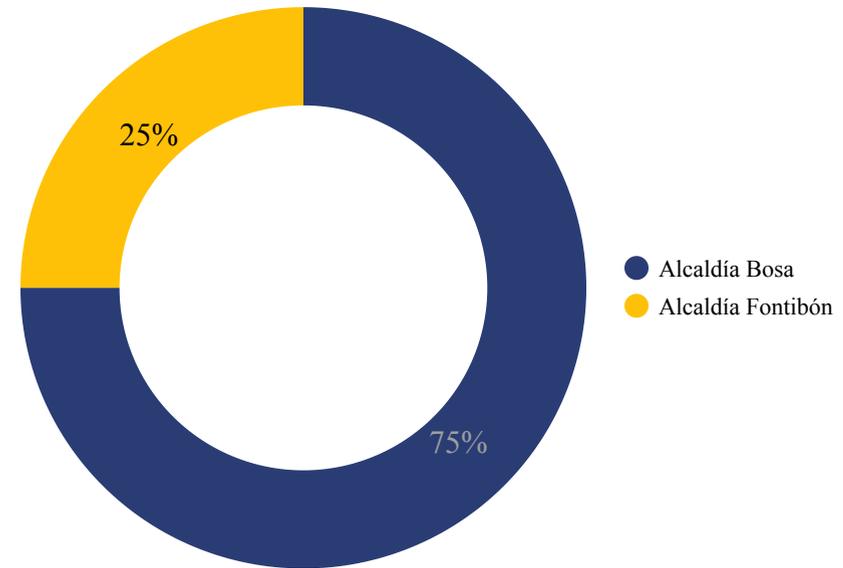

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de "paz y salvo" de VANTI para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. Se ha mantenido comunicación con la profesional Liliana Beltrán, sin embargo, no se ha generado factura para realizar pago respectivo.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para Vanti Gas Natural, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir certificado de "paz y salvo" del contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021, no se ha emitido factura para efectuar pagos por daños.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para VANTI, Se trata en general de solicitud de respuesta a varios temas pendientes hace algún tiempo y que a continuación se sintetizan: -Contrato 1683 de 2020 relacionado con paz y salvo, enviado vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán -Contrato 1698 de 2020 Acta de Competencia de pago en revisión por el Ing. Héctor Hernández, entregada por Ing. Dary Cogua. -Contrato 1692 de 2020, expedición de factura por daños, enviada vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán -Contrato 1691 de 2020, respuesta a solicitud de contratista sobre exclusión de vías reportadas por Vanti con daño en las mismas con objeto del contrato IDU citado -Contrato 1695 de 2020, respuesta a solicitud interventoría sobre estado del certificado de "paz y salvo" requerido -Contrato 352 de 2020 Troncal 68 Transmilenio, Acta de Definición de Tramos Funcionales, en revisión por parte de la Ing. Ángela Guío enviada en el pasado mes de septiembre.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para VANTI se solicita recuernerar vía donde se realizó intervención Parque minero Industrial "El Mochuelo" KM 3 Vía Pasquilla	ATENDIDO



Casos:

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB


Nº. de casos registrados

5


Nº. de casos resueltos

1

Número de casos registrados por mes

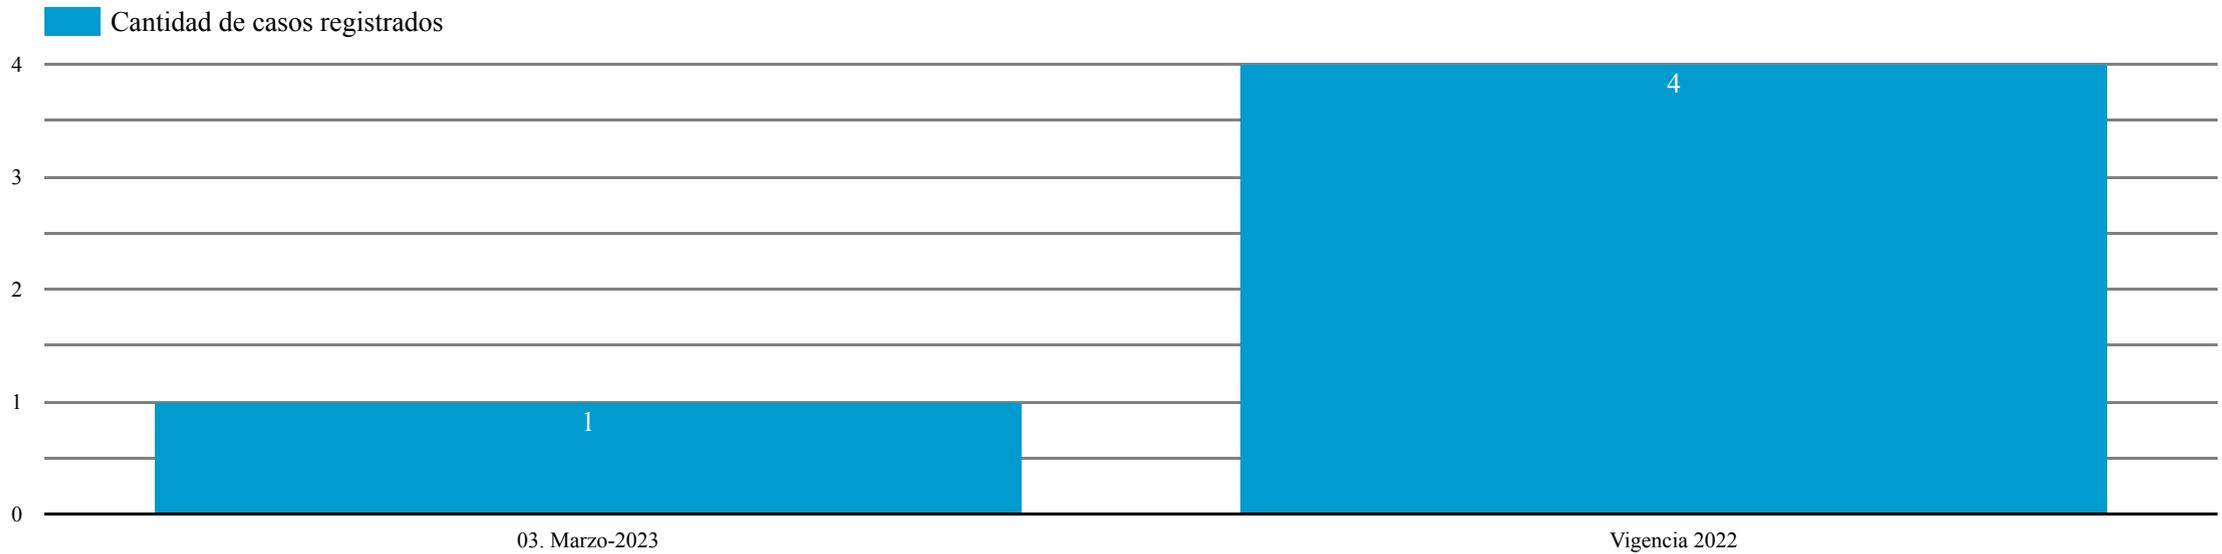

Pendientes por Entidad que presentó el caso




MES REPORT...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
03. Marzo-2023	Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para ETB, se requiere validación de los diseños del contrato FDL-Bosa N°. 254 de 2018, remitidos mediante radicado 010940.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para ETB, sobre el tramo CL 156C entre KR 96 y KR 97A se presentan varios postes de infraestructura de ETB sobre los ejes de vía, se requirió la visita correspondiente, y se efectuó reunión de campo, llegando a una cotización al respecto del traslado por 34 millones de pesos. Posteriormente, se realizó visita con Contraloría en este mismo sector, donde se indicó al Fondo de Desarrollo Local que: "no era competencia de la Alcaldía hacer el traslado de los postes y, por tanto, corresponde a la empresa encargada el moverlos", así las cosas, se remitió oficio a ETB para que no se generará costo y se informó el proceso de auditoría en el que se encuentra la Contraloría.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para ETB, se reporta cámara de ETB que presenta hundimiento en la KR 3 – Frente a ICETEX.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y	PENDIENTE


1 - 5 / 5



Número de casos registrados por mes

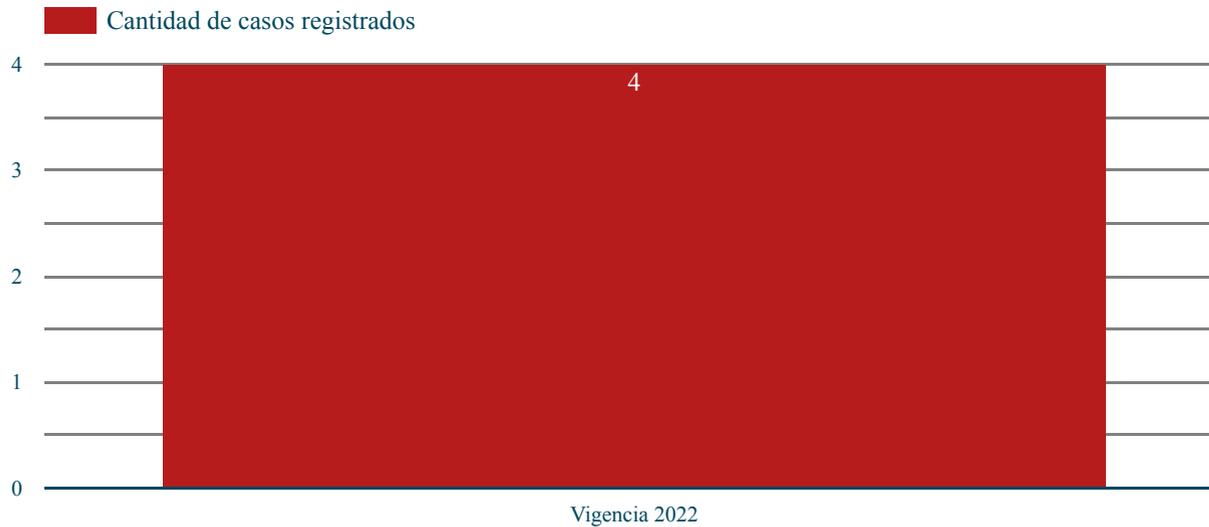

Pendientes por Entidad que presentó el caso

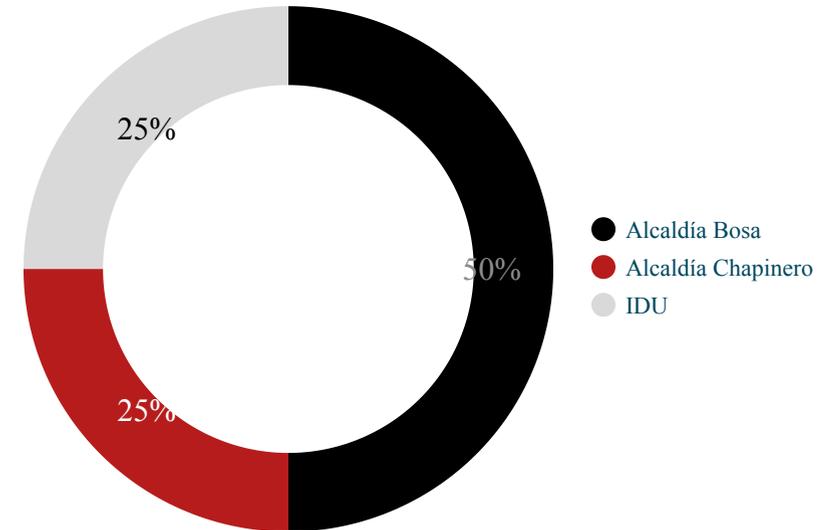

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	PENDIENTE
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopeunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	PENDIENTE


ENTIDAD RESPONSABLE RESPUESTA

MES REPORTE DE CASO


¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?

ESTADO DEL CASO


Número de casos pendientes por mes a cargo de Alcaldías locales

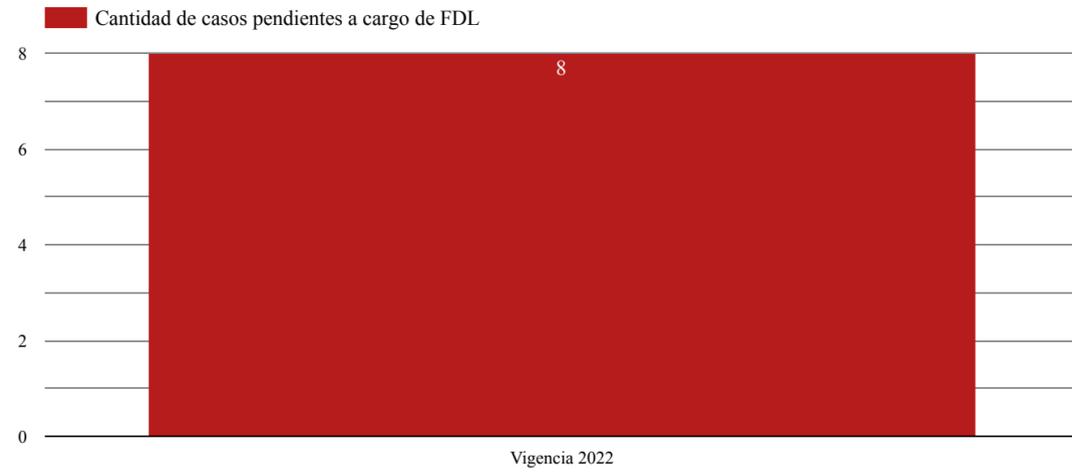

Número de casos presentados por mes por Alcaldías locales



Casos presentados por Alcaldía local

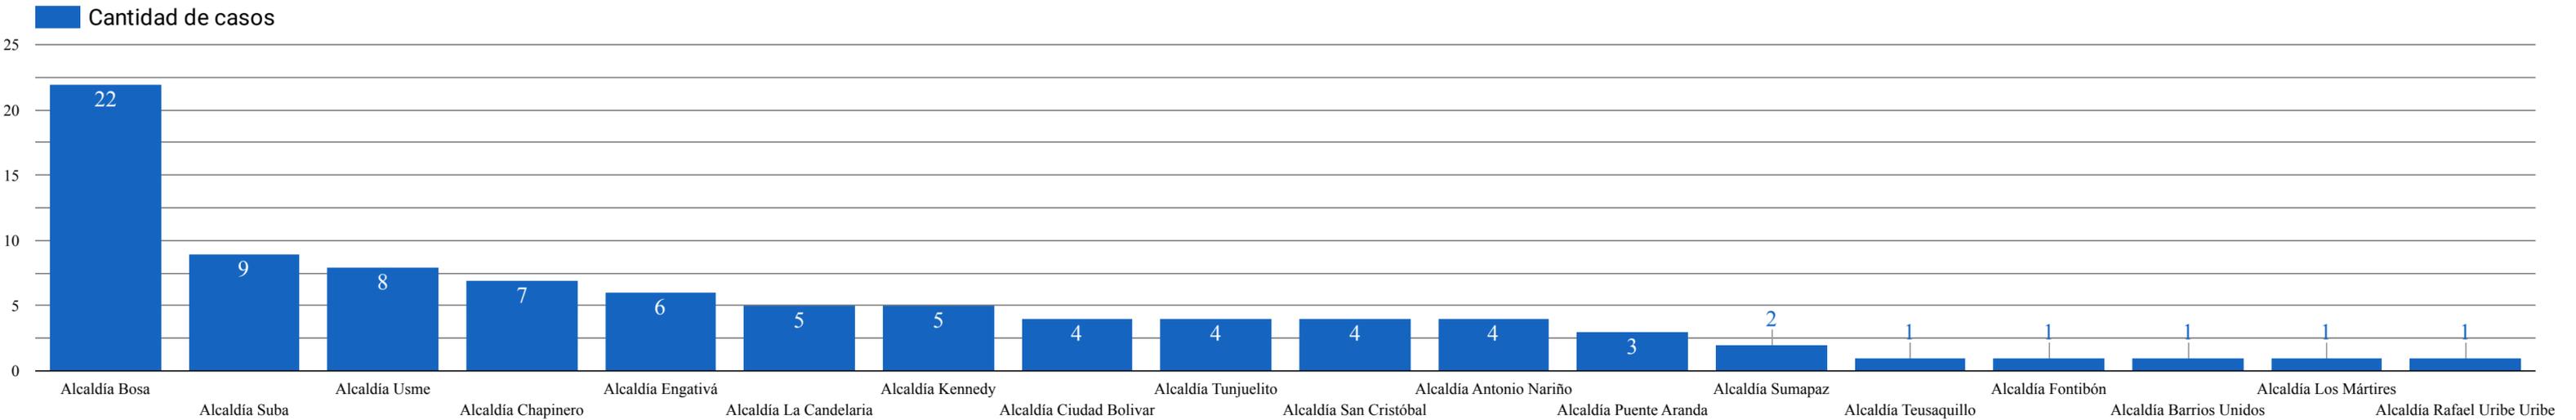

Registro de los casos

MES REPO...	SOLICITUD	ENTIDAD ...	ESTADO DE...
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado meses de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	PENDIENTE
02. Febrero-2023	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	IDU	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual. El ingeniero Álvaro Rojas indica que va a gestionar para que agilice el proceso de	IDU	PENDIENTE



Nº. de casos resueltos
18

Nº. de casos registrados
88

Nº. de casos pendientes
70
