

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 24 de 2023**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 06 de julio de 2023**

**HORA: 08:30 am a 09:10 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Rodríguez	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Juan Sebastián Acevedo Iriarte	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50435
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Diego Andrés Suarez Gómez	Subdirector SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-40945
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Anamaria Solano Monroy	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez T.	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)	X		
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL Colombia S.A. (CODENSA)	ENEL Colombia S. A. (CODENSA)	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-41750
Benjamín Ochoa	Profesional ETB	ETB		X	
Mario Insuasty	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Abril	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	
Lady Salamanca	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Rosa Gómez Corredor	Profesional Alcaldía de Bosa	FDL Bosa	X		
Emma Viviana Bermúdez Garzón	Profesional Alcaldía de Bosa	FDL Bosa	X		
Juan Vargas	Profesional Alcaldía de Bosa	FDL Bosa	X		
Juan Pablo Chicué Peralta	Profesional Alcaldía de Kennedy	FDL Kennedy	X		

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

1. ORDEN DEL DÍA:
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
3. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (23 DE 2023).
5. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
6. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
7. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
8. TOMA DE DECISIONES.
9. COMPROMISOS.
10. CONCLUSIONES.

**DESARROLLO:****1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

**2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

El Ing. Álvaro Reinoso Guerra en su calidad de encargado de la presidencia del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número veinticuatro (**24**) del año 2023, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

**3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES**

Se coordina con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, el orden de intervención de las Alcaldías Locales de Bosa y Kennedy, se realiza presentación e inicia su participación el delegado de la Alcaldía Local de Kennedy:

**3.1 Alcaldía de Kennedy – Juan Pablo Chicué Peralta:**

Se presenta requerimiento para la EAAB solicitando conceptos de favorabilidad de unas obras para mantenimiento de tres puentes. La EAAB les solicito más información, pero la Alcaldía de Kennedy indica que no se va a hacer una estructura nueva, sino que van a hacer un mantenimiento, lo que implica pintura, cambios de algunas barandas, reemplazo de algunas losas de andén y del puente.

Solicitan un contacto directo con la EAAB para darle celeridad al trámite ya que es un contrato que ya cuenta con una suspensión que inició el sábado y tiene 90 días de suspensión continua.

**Intervención Álvaro Reinoso:** Pregunta si de la Alcaldía local han tenido contacto con el ingeniero Javier Patiño para que les indique con quien se pueden contactar en la EAAB.

**Respuesta – Juan Pablo Chicué Peralta:** Indica que les contestaron con un comunicado en donde especifican la dependencia en la EAAB con la cual pueden realizar la consulta, pero querían saber si había algún profesional puntual y el contacto para hablar con él directamente.

**Intervención Álvaro Reinoso:** Señala que de Secretaria Distrital de Ambiente se encuentra el ingeniero Juan Sebastián Acevedo y pregunta si tiene alguna petición.

**Intervención Juan Pablo Chicué Peralta:** SDG se encuentra estableciendo mesas de trabajo con SDA, de hecho, hoy a las 10:00 am se citó una reunión de seguimiento.

Desde la Alcaldía y SDA se tiene claro que se debe contar con los conceptos de favorabilidad de las obras de puentes emitidos por EAAB, para continuar con el trámite de permisos de ocupación de cauce.

Así mismo, se indica que en dos de los tres puentes requieren una poda para que la iluminación existente funcione correctamente, es necesario saber si esa actividad la realiza directamente ENEL.

**Respuesta – ENEL Pablo Ponce de León:** Respecto al tema de podas se está canalizando a través de la UAESP, se debe enviar la comunicación a la UAESP, solicitando una poda por tema de riesgo eléctrico a la red, seguidamente la UAESP le notifica a ENEL y se da respuesta de acuerdo con esa solicitud. Realizar el requerimiento con copia a ENEL.

**Respuesta Alcaldía de Kennedy – Juan Pablo Chicué Peralta:** Se realizará la solicitud a la UAESP junto con el registro fotográfico con copia a ENEL.

### **3.2 Alcaldía de Bosa – Rosa Gómez Corredor:**

Se presenta requerimiento para el IDU, respecto a la solicitud de una reserva para realizar unas intervenciones durante la vigencia 2023, efectivamente les conceden la reserva, pero cuando revisan la plataforma de SIGIDU aparece que la reserva la tiene el IDU directamente.

**Respuesta – IDU Álvaro Reinoso:** Indica correo electrónico de la persona del área encargada en el IDU para que remitan la información del oficio y que quede a nombre del fondo de desarrollo Local de Bosa. El correo es [sully.rojas@idu.gov.co](mailto:sully.rojas@idu.gov.co) - Sully Rojas Dirección Técnica de Inteligencia del Negocio.

### **3.3 Alcaldía de Bosa – Emma Viviana Bermúdez Garzón:**

Se reitera respuesta del caso 201 que viene desde la vigencia 2022, respecto a requerimiento para ENEL, específicamente para el contrato N°. 0417, el cual se encuentra suspendido hace 9 meses aproximadamente, no ha sido posible recibir respuesta.

**El caso 201**, presenta un proceso de revalidación para dos parques de la localidad, el contrato tiene más de 9 meses de suspensión con la justificación de que se debe realizar el trámite ante ENEL.

La factibilidad del servicio para la revalidación del parque #07146 es el N°. 1500312136 con fecha de 12 de mayo de 2023 y para el parque #07148, el número de revalidación es la N°. 1500309440 con fecha del 2 de junio de 2023 pero no se ha emitido respuesta alguna. No tienen información de quien se encuentra atendiendo el caso por parte de ENEL.

**Intervención – ENEL Pablo Ponce de León:** Se comunicará con la persona encargada para que le entreguen el estado actual de las factibilidades o saber qué observaciones hay. Solicita un correo electrónico al cual puedan enviar respuesta.

**Intervención - Emma Viviana Bermúdez Garzón:** Indica el siguiente correo para que ENEL envíe respuesta [emma.bermudez@gobiernobogota.gov.co](mailto:emma.bermudez@gobiernobogota.gov.co)

Finalmente, la Ingeniera Emma presenta requerimiento para EAAB respecto reemplazo de una tubería en el sector de Gran Colombiano, actualmente se encuentran a la espera de respuesta por parte de la EAAB, solicitan que se programe urgentemente el cierre para que el contratista pueda realizar los cambios que se requieren de la tubería.

**Respuesta – Álvaro Reinoso:** Se debe insistir en la comunicación con el ingeniero Javier Patiño para que se programe el respectivo cierre. El ingeniero no pudo asistir al presente comité, pero se dejará escrito en el acta para trasladarle la solicitud.

### 3.4 Alcaldía de Bosa – Ing. Juan Vargas:

- **Caso nuevo:** Se presenta requerimiento para ETB, señalando que en la intervención de algunos segmentos viales en el sector de Gualoche - Bosa Centro, se observó paso de redes de telecomunicaciones en cajas de inspección. Por lo cual, se requiere visita por parte de ETB para definir actuaciones en obra. Así mismo, se precisa que se efectuaron requerimientos a ETB solicitando acompañamiento a través de los radicados N°. 006621 y N°. 009069 pero no han obtenido respuesta.

**Respuesta – ETB Carme Rocío López:** Solicita que por medio de correo electrónico le envíe los archivos PDF de las comunicaciones y los datos de contacto para programar la visita.

- **Caso nuevo:** Se presenta requerimiento para VANTI, respecto al traslado de una red de polietileno de 1" en el sector de Gualoche que se instaló sobre la vía. Se han realizado visitas por parte de VANTI, pero se requiere consolidar el traslado de la red a un costado del andén, generando retrasos en el proceso constructivo.

**Respuesta – Álvaro Reinoso:** Remite por el chat los datos del ingeniero Mauricio García [mgarciacast@grupovanti.com](mailto:mgarciacast@grupovanti.com) quien es la persona encargada de programar emergencias

y traslados. Así mismo, solicita a la Alcaldía Local de Bosa enviar un correo haciendo referencia a la situación para que realicen la programación del traslado.

#### 4 LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (23 DE 2023).

La profesional Anamaria Solano Monroy de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 29 de junio de 2023, correspondiente a la sesión número **23** del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

También se menciona, que el **informe trimestral II** se remitió para revisión y firma al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, que las actas N°. **21** y **22** de 2023 se encuentran en proceso de publicación, mientras que las actas **19** y **20** de 2023 ya se encuentran publicadas en la página Web de la SDP. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes en el último mes:

N°. Acta	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Radicado SDP Respuesta Publicación
21	15/06/2023	X	X	X	X	3-2023-23032	Proceso 2216563
22	22/06/2023	X	X	X	En trámite	Proceso 2221939	Pendiente
23	29/06/2023	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente
INFORME	TRIMESTRE II	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente

#### 5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el Ingeniero Álvaro hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: UMV, EAAB, ETB:

##### 5.1 IDU – Álvaro Reinoso:

Se solicita realizar seguimiento a los casos que se tienen asignados por Empresas de Servicio Público y Entidades, actualmente se han generado herramientas que facilitan efectuar rastreo y control de los casos, como la matriz de seguimiento y el tablero de control, los cuales se encuentran en línea, se actualizan de manera semanal y son dinámicos, lo que hace posible verificar los avances que se registran, en el momento se incorporaron tableros específicos por empresa para que se pueda revisar la información de manera rápida. Así las cosas, se solicita revisar los casos antiguos y depurar las situaciones que ya se han resuelto y no se han socializado.

Así mismo, requiere a la Secretaría Técnica que en el próximo comité se realice un filtro de la aplicación de seguimiento para ver gráficamente como se encuentran en compromisos y realizar un repaso de temas pendientes.

##### 5.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se reiteran los temas pendientes que han sido reportados en las sesiones anteriores.

### 5.3 UMV – Humberto Ramírez:

Se solicita dar **cierre al caso 451**, relacionado con una luminaria frente a la casa cural de la iglesia de Modelia, agradece la gestión de ENEL por parte del ingeniero Pablo Ponce de León.

### 5.4 EAAB – Juan Carlos López:

- **Caso nuevo:** Para IDU, requerimiento respecto al contrato 1311 correspondiente a sumideros, del cual no se ha podido cerrar el recibo de vías por parte del IDU, el contratista ya entregó los documentos radicados de acuerdo con lo conversado. Se solicita coordinar una visita al IDU con el Ing. Álvaro Reinoso ya que para ese contrato se vencen los términos próximamente.

**Respuesta IDU – Álvaro Reinoso:** Se acuerda visita en las oficinas de IDU con EAAB para el viernes 07 de julio en horas de la mañana, se revisará el caso con la ingeniera encargada del tema.

### 5.5 ETB – Carmen Rocío López:

Reitera el seguimiento a los casos que han sido reportados anteriormente en el comité.

## 6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
366	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a realizar intervención de cambio de carpeta en este tramo vial y se requiere evaluar infraestructura de redes húmedas.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
367	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	IDU	PENDIENTE
368	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontró una acometida de agua que está dentro de una cámara de Movistar que se debe renivelar.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
370	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA, SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto Línea Techo Veraguas, adicionalmente se solicita lograr la viabilidad de inicio de actividades de modernización sobre el tramo 2 - Calle 3 entre cra 50 y Av 68 para el primer trimestre de 2023	Entidades participantes en el Comité	SDP emitió respuesta con radicado SDP N°. 2-2023-18434

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
372	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
373	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
374	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carreras 7 y 9 se realizó visita e inspección y se evidenció que corresponden a acometidas domiciliarias de la empresa de acueducto, se hace el llamado a la zona 1 de la Empresa de Acueducto para que por favor revise, se deja trazabilidad del caso en chat de grupo de trabajo y registro fotográfico	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
375	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
376	Se reporta que en la CI 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se está presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl. 26, CI26 con KR 69 y el tercer punto CI 26 cerca a la Av Boyacá	IDU	PENDIENTE
378	Solicitud de priorización al FDL de Usme sobre una intervención en la Calle 99 Sur No. 1A- 61, se remitió solicitud mediante correo electrónico	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE, Acta 05: SDG indica que el correo fue remitido al fondo de desarrollo local sin embargo no se ha dado respuesta
379	Requerimiento de respuesta a la Zona 1 EAAB del radicado 3133002 -S-2022-317611 por concepto de instalación de tubería en acero de 14 pulgadas en la Carrera 62 entre Calle 169 B y Calle 167	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
380	Solicitud de trazabilidad en el comité respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A. En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Álvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	IDU	PENDIENTE
381	Requerimiento respecto a 110 puntos objetados por el IDU ni el IDPC ni el IDRD dan respuesta, lo que ha generado problemáticas para atender el proyecto de fibra óptica para la ciudad, solicita priorizar el caso	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
387	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
388	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
389	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación	SDM	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato		
391	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
392	solicitud a la EAAB respecto a daños en proximidad al pozo de inspección, posibles daños en la red de alcantarillado. Se solicita evaluación por parte de la EAAB en la Carrera 52 C desde la Calle 41 Sur hasta la Calle 41 A Sur.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
395	Caso de una cámara localizada en la Carrera 23D No. 60A - 10 Sur que está sin tapa, una señora tuvo un accidente en dicha cámara	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
396	requerimiento respecto a una consultoría del 2018 sobre dos salones comunales, indica que en 4 años no se ha obtenido resultado alguno, sin embargo menciona que de la consultoría de ambos salones comunales el que se encuentra ubicado en la Carrera 35A con Calle 9 Sur detrás de la Iglesia de Santa Matilde requiere apoyo referente a un contacto para agilizar el trámite de disponibilidad de servicios públicos con Acueducto, Vanti y Enel Colombia ( Codensa), indica que con Vanti ya se tuvo la primera audiencia sin embargo la idea es volver a solicitarla.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
397	Tienen 2 CIVs, en compañía del Ingeniero Francisco Rodríguez hemos venido trabajando nos encontramos terminando el primero del cual está pendiente solamente asfalto, había un compromiso de renovar la red de acueducto que se encuentra en asbesto cemento, antes de iniciar los trabajos la situación reportada había sido otra el compromiso con el acueducto era hacer el trabajo nosotros con el contratista realizar las zanjas y el acueducto hacer su trabajo, para eso en particular son el CIV 10002609 Y 16002550 poder tener una fecha definida con el Acueducto porque estamos en este momento frenados dependemos de esa tarea	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
398	otro caso es el del CIV 16002083 vamos a iniciar su intervención, es un callejón cerrado en pavimento flexible pretendemos hacerlo en pavimento rígido, pero por esa misma proyección que tenemos necesitamos la definición del acueducto si allá se van a cambiar o no las redes para poder definir tiempos de trabajo en conjunto. Dirección a intervenir Carrera 51 entre Calles 37 Sur y Calle 28 Sur	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
399	solicita una mesa de trabajo para un tema a nivel distrital sobre una intervención en la ladera del río Fucha, ya se solicitó mediante oficio, se hicieron unas propuestas de diseño para mitigar la habitabilidad de calle en ese lugar, se solicita concepto y reunión para solucionar eso.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
400	En la noche del 6 de marzo de 2023 se hizo un recorrido con la UAESP para el tema de las expansiones que necesitamos en un parque porque es un punto crítico de venta de estupefacientes y de habitabilidad de calle, en este momento se está generando un sendero con la comunidad a partir de la iniciativa juntos cuidamos Bogotá, pero necesitamos las expansiones de esa luminaria, la UAESP nos indicó que cuando termináramos el sendero hiciéramos otro recorrido para solicitarle a Enel el tema de la expansión, nos gustaría darle celeridad a ese tema porque es un punto crítico de la localidad y la comunidad lo ha pedido mucho	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE Acta 14-2023: Se efectuó recorrido el 6 de marzo, se está gestionando a través del comité de expansiones.
401	se remitió al chat de trabajo un caso por la Avenida Calle 3 por Carrera 56 para la cual no se observó señalización alguna, fue enviado para verificación a quien está haciendo esa intervención con el objetivo de que se recupere el espacio.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
404	solicitud al acueducto zona 5 sobre un caso reportado en marruecos Calle 50 A Sur No. 7 – 64, requiere que atienda visita en este sector.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
406	solicitud para las empresas ENEL Colombia, Vanti, ETB y Acueducto, están por iniciar dos proyectos un parque de bolsillo en la Calle 7 con Carrera 3 y uno de espacio público en la Calle 12C entre 1A y Carrera 3 desde la Calle 12B hasta la Calle 12D, requerimos acompañamiento de las empresas con el objetivo de generar un diagnóstico de redes para que el contratista las tenga en cuenta, la semana pasa se enviaron las solicitudes, pero no se ha obtenido respuesta, pregunta que si por medio de este comité se puede generar la cita.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
408	presenta requerimiento para la zona 1 de acueducto con el ing. Mauricio Mahecha, donde un ciudadano reporta una queja indicando que hace más de dos meses la empresa de acueducto rompió e hizo una zanja frente al predio de la Carrera 46 No. 138 – 53 y no se ha recuperado, para que por favor zona 1 investigue a que contrato pertenece.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
409	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	SDM	PENDIENTE
410	En la Carrera 62 con Calle 62 hasta la Calle 64 en el barrio Santa Rosa Sur hay cuatro segmentos viales que no cuentan con alcantarillado pluvial, se solicita apoyo a la EAAB, la comunidad manifiesta que en ocasiones se ha generado inundación en sus predios.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
411	El año pasado se presentaron unas solicitudes de factibilidad a ENEL para el servicio en Betania y San Juan. Se hicieron visitas técnicas y nos informaron que para Betania se tenían que hacer unas adecuaciones eléctricas que ya se están estudiando dentro de una formulación. Sin embargo, quedó pendiente el tema de San Juan, indica que de esas visitas no recibió acta, adicionalmente desconoce si la información fue recibida por ingenieros y arquitectos que ya no están en el fondo, es decir que se perdió la trazabilidad del caso, pregunta si es posible que de parte de ENEL que le remitan las actas de esas visitas técnicas.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
412	El FDL de Chapinero el marco del Decreto Distrital 168 del 2021 ha solicitado la asistencia técnica tanto a empresas de Servicios Públicos como entidades distritales, sin embargo algunas de estas entidades no nos han dado respuesta, es muy importante contar con los delegados de cada entidad para poder llevar a cabo las mesas de trabajo de asistencia técnica teniendo en cuenta que en los estudios y diseños que existen en el banco del FDL de Chapinero se prevé la subterranización, traslado y protección de redes de servicios públicos perteneciente a los activos de cada empresa. Se han adelantado algunas mesas de trabajo con algunas entidades distritales, sin embargo, en este momento estamos a la espera de los delegados de la Secretaría Distrital de Planeación por parte de la secretaria Jurídica, IDU, Claro, ENEL Colombia, IDPC, Movistar, Promo ambiental, Catastro, Une EPM, Grupo Energía Transición, DADEP, Requerimiento N. 2 Al IDU y Secretaría Distrital de Hábitat. En el mismo correo donde se envió la invitación a la convocatoria se va a enviar estos oficios con los acuses de recibido por parte de cada una de estas empresas y entidades, con el objetivo de contar con la asistencia	IDU	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	tecina y respuesta oportuna a los procesos de formulación del FDL de Chapinero.		
413	El contrato 159 de 2022 etapa preliminar, necesitamos iniciar unos trámites: Acueducto, ENEL Colombia y IDPC, por parte del IDPC estamos en trámite, al Acueducto se solicita visita para revisar el tema de CCTV de las redes.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
414	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	SDM	PENDIENTE
415	Solicitud al Ing. Pablo Ponce para que por favor nos ayude a evaluar el cobro de energía de la planta la esmeralda, la sede de producción, nos llegó un cobro por 235 millones de pesos, estamos un poco ilíquidos, de acuerdo con una revisión que hizo uno de los contratistas de ENEL para avaluar el cobro se dio cuenta que en algún momento el consumo de energía había bajado y establece que como es una sede industrial entonces nosotros producimos todos los días las mismas cantidades y no es así , hay meses donde no tenemos la mezcla de agregados y donde la producción baja, ya le escribí al Ing. Pablo Ponce no me ha contestado voy a reiterar a ver cómo nos puede ayudar para ver a quien le respondemos el requerimiento y si nos dan plazo para pagar eso.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
416	Corresponde a la filtración de aguas residuales entre la transversal 19 y calle 46 sur donde se ubica la central de ETB San Carlos, hay una filtración de aguas residuales que está llegando a la red de ETB y está ingresando al predio San Carlos y está generando malos olores adicionalmente está afectando al colegio Bernardo Jaramillo, no sabemos si hay un tubo roto conexión errada o alguna que está ocasionando esta problemática.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
417	Para EAAB – Zona 3, tenemos una filtración en una caja de paso en la Calle 36H Sur N°. 11A-08, se requiere una visita conjunta con la empresa para verificar los daños, se precisa de manera urgente pues corresponde al desagüe de una caja de paso sencilla y sobre la misma se ha presentado derecho de petición.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE Acta 13: Se indica que se remitió respuesta por correo, se informa reenvío de información el 20 de abril.
418	En la calle 127 con 13A, la semana pasada se informó al delegado de EAAB - Zona 1, sobre una filtración de agua, allí enviaron personal, pero dijeron que no era del alcance de ellos. Sin embargo, ETB está preparando la cámara y arreglando todo lo que le corresponde, no obstante, la filtración continúa. Por lo cual, se le requiere a la EAAB que revise la filtración y solucione este inconveniente.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
419	Evento SIRE 5414763, frente al predio ubicado en la calle 63A #68G-30, barrio Bosque Popular, localidad de Engativá, CIV 10009654 PK ID 1475178, se reporta socavación de 1.00X1.00 metro cuadrado y profundidad de aproximadamente 1.00 metro, es posible que se deba a un daño en la red de la EAAB, lo cual potencia la ocurrencia de accidentes. Se solicita visita de esta ESP, y que se tomen las medidas correspondientes, desde la UMV se reitera apoyo.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
420	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renovación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	ETB	PENDIENTE
421	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	ETB	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
423	Para EAAB – Zona 1, se solicita realizar visita y medidas tendientes a reparar socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente – occidente.	EAAB - Zona 1	Reiterado por IDU en el Comité N°. 18: Para EAAB – Zona 1, se reporta hueco en la calle 134 entre carrera 19 y carrera 19A - CIV 1003972 PK 510728. Indican que hay una importante socavación de aproximadamente un metro de profundidad, que se observa una tubería al parecer de alcantarillado. Reiterado por IDU en el Comité N°. 23: Para EAAB – Zona 1, EAAB INFORMA: Respecto a los requerimientos presentados por el IDU – Onisalba Segura de Arbeláez, se debe precisar que la recuperación del espacio público en zona 1 se realiza a través de un contrato de obra, por lo cual la información se remitió al contratista para que se efectuará las labores correspondientes y así presentar los soportes de atención a los casos.
426	Se solicita acta de coordinación al Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB - Zona 3, se ha requerido de manera reiterativa desde enero, toda vez que se está solicitando por una acción de tutela y a la fecha no se ha tenido respuesta al respecto.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE Acta 15-2023 - IDU – Álvaro Reinoso: Se envió directamente al director de acueducto Carlos Rivera y él se lo remitió al ingeniero Juan Rafael Osorio de la Zona 3. De igual manera, ayer se reiteró, porque de VANTI se recibió nuevamente requerimiento.
427	Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalizarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer. Hoy estarán enviando el oficio a SDM, para que se considere la señalización de vías ejecutadas por el FDL.	SDM	PENDIENTE
428	Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.	SDA	PENDIENTE
429	Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.	SDA	PENDIENTE
431	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una reunión que se llevó a cabo ayer (10-mayo-2023), en el tramo de la carrera 18 B entre calle 145 y 146. Allí la UMV va a intervenir, pero según lo informado por la dirección de la obra (Ing. Rafael Pérez) hay problemas de drenajes, entonces, se solicita a la EAAB evaluar el caso de manera conjunta y llegar a una posible solución. En la reunión estuvo José Casallas y Jairo García de la EAAB, por lo que conocen este caso y se solicita sea comunicado al Ing. Mauricio Mahecha.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
432	Para ENEL Colombia, se relaciona con una cámara localizada en la calle 147 # 9-60, presencia de hueco que al observar con más detalle se encuentra que la base	ENEL COLOMBIA	Acta 17: Se reporta correo de operación regional, donde se indica que el caso se encuentra

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	<p>donde se apoya la tapa en dicha cámara se encuentra dañada generando una diferencia de altura, la cual al pasar un vehículo produce un efecto de rebote y a su vez las vibraciones dañando tanto la estructura de la cámara como la del pavimento adyacente a la misma.</p>		<p>en gestión, para el levantamiento inicial se requiere un permiso no otorgado por emergencia y por tanto está en trámite el PMT correspondiente. ENEL ya realizó la visita, se realizó valoración y plan de trabajo, por ahora se espera tramite de PMT. Se reiterará a Oscar Escobar de la regional, para efectuar seguimiento interno. Acta 23 del 29 de junio de 2023: se informa que SDM va a instalar esta semana unos semáforos provisionales para regularizar el tránsito en este sector, y posteriormente si se aprobaría el PMT para realizar la intervención pertinente.</p>
433	<p>Para EAAB – Zona 2, se requirió mediante correo electrónico del 10 de abril de 2023, respuesta por parte de la EAAB para arreglo de las canalizaciones que fueron afectadas durante los trabajos de reparación de la red de acueducto ejecutados por la Zona en la Carrera 73A por Calle 80 costado Este-Sur. Lo anterior en razón a que, en visita de la ETB, se encontró tapada la excavación y no hay evidencia de que la infraestructura haya sido reparada.</p>	EAAB - Zona 2	<p>Acta 17: Efectivamente el tema fue escalado a la división acueducto, que fueron los que en su momento ejecutaron esas obras, ellos ya están gestionando efectuar una intervención en ese punto para restituir las canalizaciones que se dañaron.</p>
435	<p>Para IDU, el requerimiento presentado consiste en la obra que requiere adelantar Movistar frente a una de sus oficinas, el día de ayer la interventoría del contrato 1791, respondió que el acta de recibo definitivo no ha sido emitida para el inicio de la garantía, por tanto, no se pueden ejecutar obras adicionales. En adición, se observa que la ejecución se realizó sobre la ciclorruta y se requiere intervenir en un área diferente a este sector.</p>	IDU	<p>Acta 17: Existe una opción a través del acta de coordinación, si se indica por parte del contratista que ya terminaron la obra, esta es una información valiosa, y quizás exista una posibilidad de autorización, así mismo, la situación debe ser resuelta desde el área ejecutora, para advertir formas de avanzaba y coordinar las obras entre las dos entidades tal como se quería siempre hacer. Acta 18: Se tiene visita el día 26 de mayo para verificar en campo con Interventoría, es posible que se efectuó acta de coordinación.</p>
436	<p>Para EAAB Zona 3, frente a la reconstrucción de la red sanitaria y pluvial del segmento vial CIV 16001178 – KR 44 entre CL 4F y CL 4F Bis, la red estaba en contrapendiente, y debería ir de norte a sur, hacia el costado del parque, se solicitó nuevamente revisión por CCTV porque al parecer la red debería estar de sur a norte, ayer se entregó las grabaciones al Ing. Francisco, pero se requiere una definición pronta al respecto de la red, ya que se tiene caja abierta y la maquinaria se encuentra en stand by.</p>	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
437	<p>Para ETB, sobre la calle 4F se tiene un cámara al parecer de telefonía, no obstante, se encuentra con marcación de EPM, la cual afecta la red pluvial del proyecto. Se solicita apoyo al respecto. Se encuentra cercano al CIV 16001178 – KR 44 entre CL 4F y CL 4F Bis y el contrato del cual hace</p>	ETB	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	parte es el 263 de 2022, contratista CONSORCIO INGESEM 2022.		
438	Para EAAB – Zona 3, se solicita apoyo con un equipo de vactor en la carrera 17 con Calle 17 Sur sobre la carrera, se tiene alta colmatación en los sumideros y con la llegada de la temporada de lluvias, genera afectaciones en la comunidad.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
440	Para EAAB, en la carrera 69B con calle 17 en el costado nororiental se encontraron dos cámaras con cables y canalizaciones afectadas por obras de la EAAB. Se solicita visita para verificar y atender los daños.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
441	Para EAAB, respecto a una solicitud de reposición de tapa en pozo ubicado en la Avenida Ciudad de Cali con calle 20, ya que según reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad se reportan faltantes de tapas, y al realizar la visita se encontró pozo de la EAAB sin este elemento.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
443	Para SDA, frente al contrato FDL RU 281 de 2019, se realizó radicación N°. 2021ER143989, donde se programan y efectúan visitas con funcionario de la SDA, contratista e interventoría. De estos recorridos se solicita generar modificaciones, y nuevamente se radica a la Entidad con número 2022ER173992, no obstante, a la fecha no se ha generado respuesta y desde el Fondo de Desarrollo Local se han remitido diversas comunicaciones sin pronunciamiento por parte de SDA. Este contrato lleva aproximadamente suspendido desde febrero del año pasado porque se requiere respuesta de Secretaría Distrital de Ambiente, para definir lineamientos y precisar la terminación.	SDA	PENDIENTE
444	Para ENEL Colombia SA ESP, se solicita recorrido para expansión de alumbrado público en el parque Sarasota de la localidad de Rafael Uribe, se remitió comunicación de manera previa a través de radicado 20216823134.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
446	Para EAAB, corresponde a un reporte realizado en el chat grupal el 26 de mayo de 2023, se refiere a una afectación vial localizada en la KR 10 con Av. Jiménez, se asocia a posibles daños en red de la EAAB.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
447	Para EAAB, corresponde a un reporte efectuado en el chat grupal el 29 de mayo de 2023, se asocia a un daño en la carrera 16 con calle 138, se efectuó intervención y no fue recuperado el pavimento.	EAAB - Zona 1	Pendiente. Reiterado por IDU en el Comité No. 23
448	Para EAAB – Zona 1, respecto a la Avenida Ciudad de Cali con calle 134, se informa que son obras de redes donde su contratista dejó abandonada la intervención, son alrededor de 80 metros y la EAAB está solicitando que la UAERMV apoye con la terminación de esta obra. Se realizará la visita, pero la posición de apoyar el requerimiento en el momento es casi nula.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
450	Para EAAB, corresponde a un reporte realizado en el chat grupal el 5 de junio de 2023, se refiere a una vía en mal estado en la vía CL 140 en el sector de la KRA 15 debido a que se llevó a cabo una intervención efectuada por la EAAB y no se realizó la recuperación del pavimento.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
452	Se solicita a ENEL Colombia SA ESP, que por favor deleguen a una persona para llevar a cabo las coordinaciones y los acercamientos a los que haya lugar en cumplimiento del principio de planeación y ley de infraestructura, frente a la etapa de formulación de los proyectos que tiene en curso el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
453	En el desarrollo del contrato 289, se llegó a la etapa de liquidación, y se están tramitando los certificados de “paz y salvo” con la EAAB, el día 16 de mayo de 2023 se remitió comunicación, pero no se ha logrado una coordinación con el líder de zona 1 y 2, el número de radicado es E-2023-	EAAB - Zona 1	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	047187, se solicita una respuesta oportuna. Se requiere visita de manera efectiva, para lograr liquidar, se han recibido recomendaciones de hacer nuevamente un oficio y radicar una reiteración en la EAAB, especialmente para zona 1, no obstante, se espera coordinar a través de esta instancia.		
454	En el marco de la ejecución del contrato 327 de 2023, se realizó la solicitud de visita técnica en campo a ENEL Colombia SA ESP, y a la fecha no se ha recibido respuesta, por lo cual se solicita un contacto para gestionar los requerimientos del contrato. Adicionalmente se informa que el radicado de la solicitud a ENEL es 000537380 del 23 de mayo de 2023.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
455	Para EAAB-Zona 1, el FDL de Usaqué se encuentra liquidando el contrato N°. 175 de 2022, por lo cual se encuentran en proceso de obtener los certificados de "paz y salvo" por parte de las empresas de servicios públicos, de tal manera, se requiere respuesta por parte de la EAAB-Zona 1, el radicado es E-2023-045253 del 10 de mayo de 2023.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
456	Para ETB, en la carrera 75 con calle 24, la UAERMV está realizando trabajos de rehabilitación, en una actividad se generó daño en red de fibra óptica de ETB que se encontraba superficial, se requiere conocer si la Gerencia de Intervención se comunicó con Benjamín Ochoa para efectuar reparación temporal.	ETB	PENDIENTE
457	Para EAAB-Zona 5, se compartió el día de ayer un reporte correspondiente a daño sobre una cámara telefónica de ETB localizada en límite entre Bosa y Soacha, se solicita socializar situación con delegado correspondiente, para que se realice la reparación o se reciba factura con costo de los daños, adicionalmente se señala que al tener expuesto los cables telefónicos, pueden ser objeto de vandalismo y/o generar algún tipo de accidente.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
458	Para EAAB-Zona 5, se reporta segmento vial que salió en las noticias, está ubicado en la CL 26 S Entre KR 73 B BIS Y KR 73 C, se evidenció una socavación aparentemente por daño de redes, se intervino en marzo de 2022 en el Convenio 389 de 2020 entre el Fondo De Desarrollo Local de Kennedy y UMV, no obstante, no se puede adelantar parcheo hasta tanto se realice revisión y reparación de redes.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
459	Para EAAB – Red Matriz, se requiere validación de daños generados por las obras de la manija de Tibitoc, en la Av. Boyacá con Calle 10B, se envió correo electrónico a Fabián Restrepo (contratista de la obra), pero no se ha obtenido ningún tipo de respuesta, por tanto, se requiere escalar con delegado de EAAB.	EAAB – Red Matriz	PENDIENTE
460	Para SDA, se solicita respuesta a requerimiento radicado 2023ER97832 (SDP 2-2023-45032), en aras de obtener concepto actualizado de determinantes ambientales y continuar con el debido trámite del Plan Director Bosques del Mediterráneo.	SDA	PENDIENTE
461	Para EAAB-Zona 5, se solicita respuesta de fondo al requerimiento radicado en la EAAB como E-2023-054108, donde a la fecha se emitió concepto de salida S-2023-143100, señalando que allí se ubica un plan parcial, lo cual es del conocimiento de esta Secretaría, se ha aclarado y reiterado que el plan director hace parte del plan parcial, y, por tanto, se requiere un nuevo concepto. Toda vez que el concepto de viabilidad del plan parcial, ya venció (tenía vigencia de 3 años) y no se puede avanzar con otros instrumentos que hacen parte del plan hasta tanto se actualice concepto por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
462	Para SDA, se realizaron varios requerimientos para cierre de PINES AMBIENTALES: 19817 con radicado 2023ER977455, 19879 con radicado 2023ER97478, 18724 con radicado 2023ER97479, 21178 con radicado 2023ER97480, la solicitud se efectuó hace más de tres meses, lo cual representa un valor de aproximadamente 3000 millones, afectando las obligaciones por pagar, y siendo contratos que están próximos a fenecer, es un tema urgente para el FDL. Se hizo reunión en la Alcaldía Mayor hace 8 días, invitando a Secretaría Distrital de Ambiente, pero no se muestra ninguna disposición para avanzar.	SDA	PENDIENTE

### 6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
-Casos presentados	365	100,00%	93	100,00%
-Casos resueltos al corte	248	67,95%	25	25,77%
-Casos pendientes al corte	117	32,05%	72	74,23%

## 7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

### 7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se logró resolver uno (01) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 451, así mismo no se presentan avances en otros casos.

### 7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p><b>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b></p>
<p><b>Síntesis:</b> Se logró resolver uno (01) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 451, así mismo no se presentan avances en otros casos.</p>	
	<p><b>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</b></p>
<p><b>Síntesis:</b> Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

## 8 COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 13-julio de 2023
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Data Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 13-julio de 2023
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (virtual o presencial).	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 13-julio de 2023

## 9 CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye la sesión número veinticuatro (24) del Comité para la vigencia 2023, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 13 de julio de 2023 a las 8:30 am, de**

**manera presencial y/o vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM RODRIGUEZ CASTELLANOS  
PRESIDENTE**




**PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA  
SECRETARIA**

Proyectó: Anamaria Solano M – Paola Andrea Gámez T– SDP.  
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte del Acta 24 de 2023.

## Número de casos registrados por mes

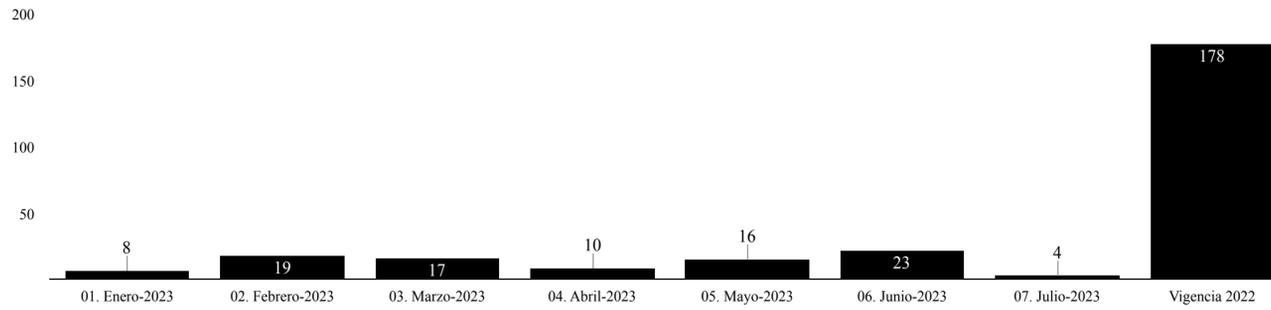

Nº. de casos registrados

275




Consulta por Entidad que presentó el caso

Consulta por Entidad Responsable

MES REPORTE DE CASO

## Número de casos resueltos por mes

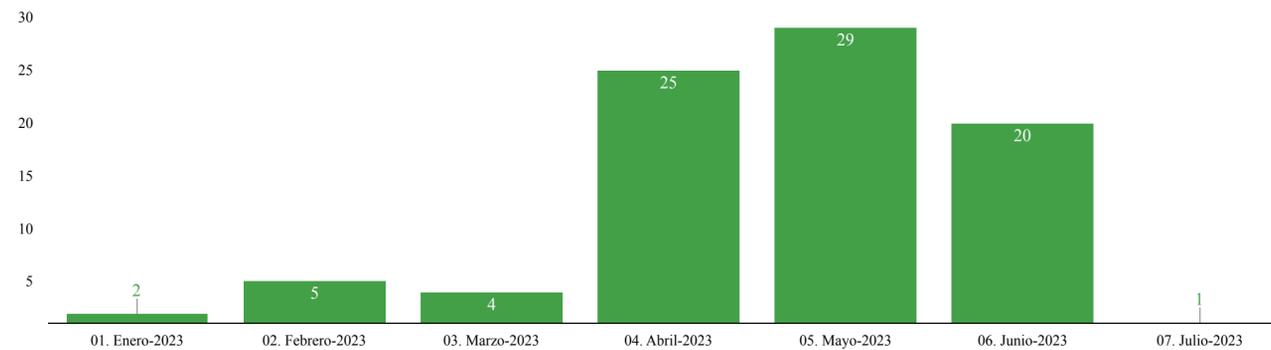

Nº. de casos resueltos


86



## Porcentaje de avance



## Número de casos pendientes por mes

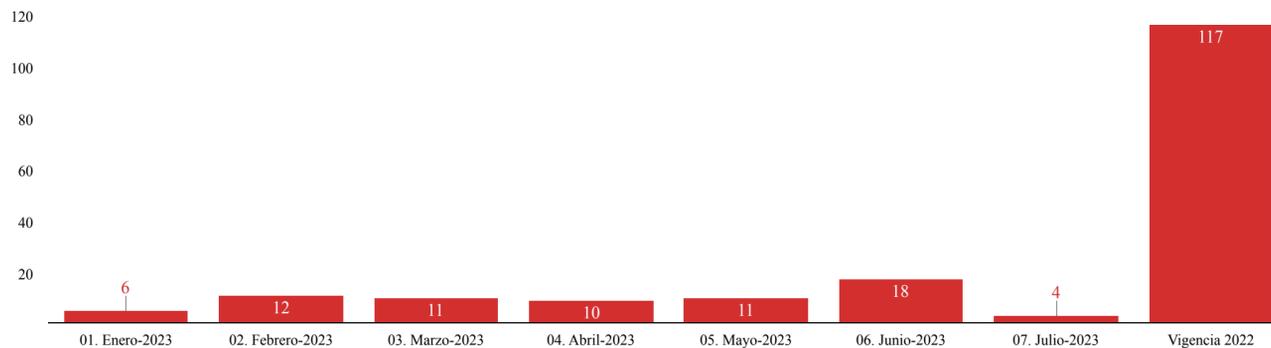

Nº. de casos pendientes

189



## TOP - Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	53
2. EAAB - Zona 2	29
3. EAAB - Zona 1	26
<b>Total</b>	<b>275</b>


## TOP - Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	21
2. EAAB - Zona 2	9
3. VANTI GAS NAT...	8
<b>Total</b>	<b>86</b>


## Recuento de casos

Nº. SESIÓN DE ...	Nº. DE CA...	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO
02 - Enero 26 de 2023	366	UMV	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a rea...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	369	IDU	Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero qu...	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
02 - Enero 26 de 2023	368	MOVISTAR	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontr...	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	367	MOVISTAR	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se pres...	IDU	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	372	SDG	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contr...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	371	Alcaldía San Cristóbal	Para Enel Colombia, la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022...	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de ...	373	EAAB - Zona 4	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio car...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	370	ENEL COLOMBIA	Se solicita coordinación con entidades como Acuecuto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto...	Entidades participantes en el Co...	PENDIENTE
04 - Febrero 09 de 2...	374	UMV	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carrera...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	376	MOVISTAR	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: ...	IDU	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	375	UMV	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	377	Alcaldía Kennedy	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully ...	IDU	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	380	VANTI GAS NATURAL	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón ...	IDU	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	383	ETB	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Est...	SDP	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	382	ETB	Se reporta novedad en cámara de ETB con filtración de aguas negras en la Calle 20 No. 13 - 29 se deja registro en video por e...	EAAB - Zona 3	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	384	ETB	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	ATENDIDO

### Número de casos registrados por mes

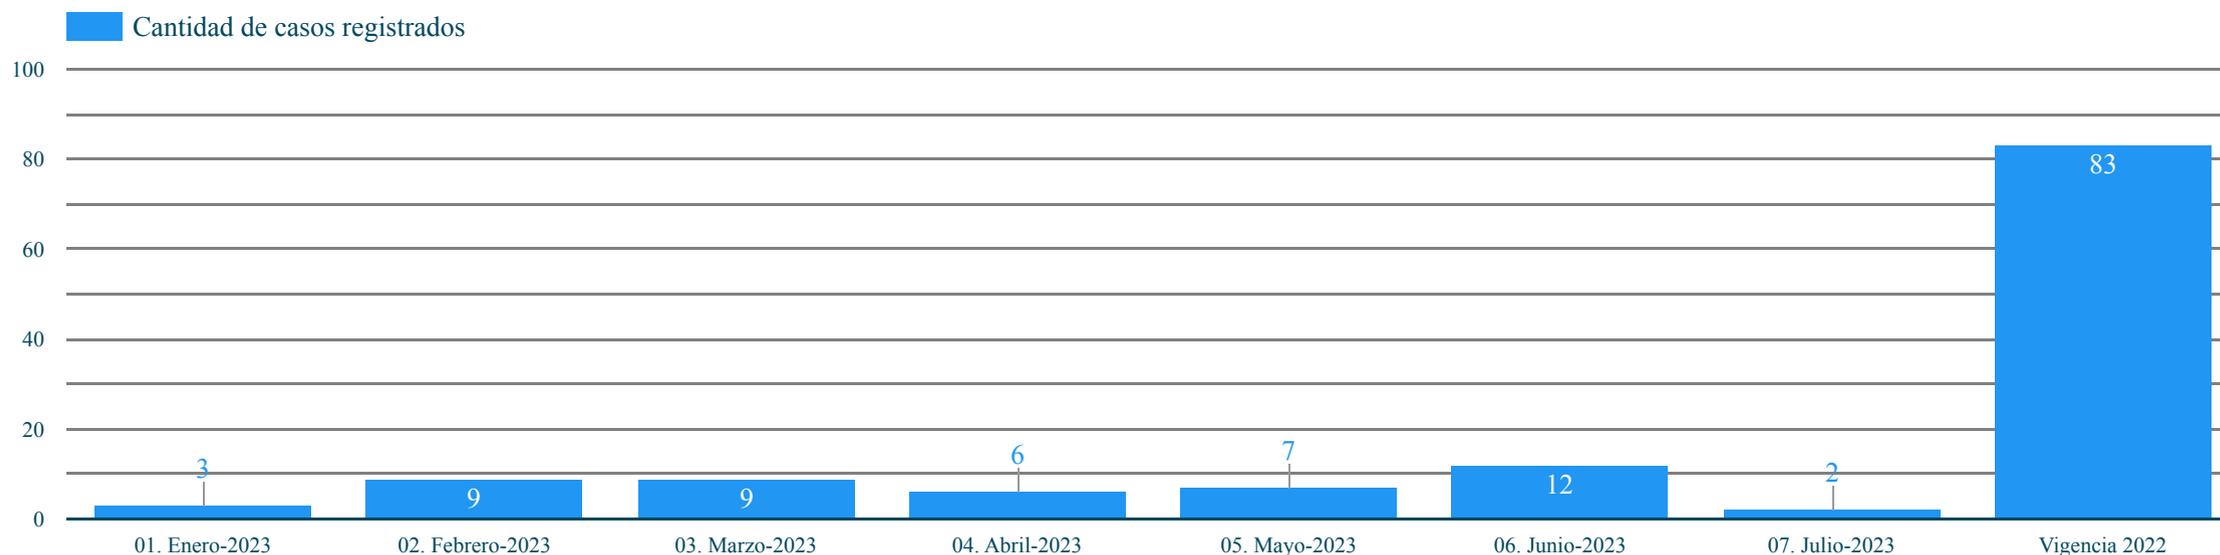


### Número de casos por zona o área pendientes

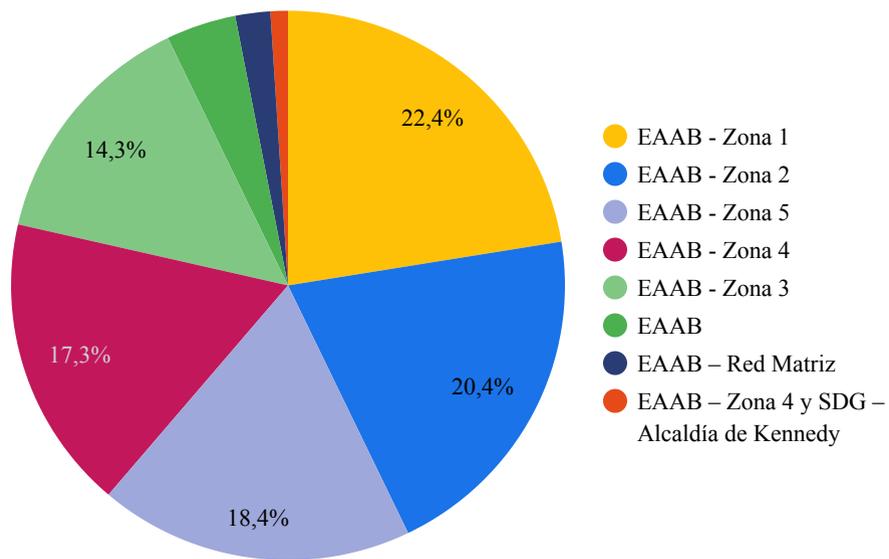


Nº. DE CASO...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EAAB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021)	PENDIENTE
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	ATENDIDO
29	Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021)	PENDIENTE
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU - II Sesión 2022)	PENDIENTE



**Número de casos registrados por mes**

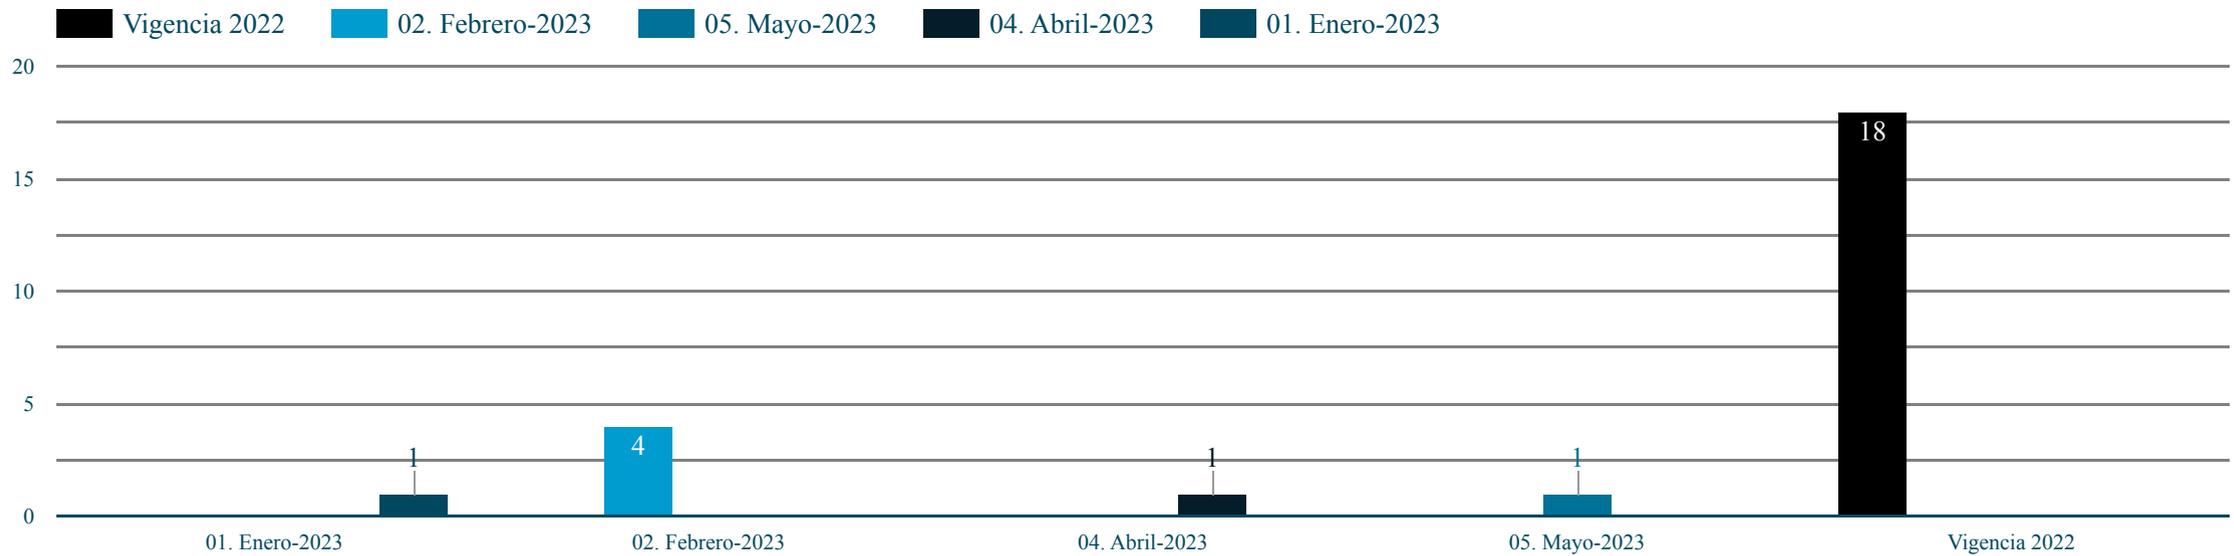

**Número de casos pendientes por responsable**



MES REP...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, Cl26 con KR 69 y el tercer punto Cl 26 cerca a la Av Boyaca	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A . En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Alvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	ATENDIDO



# Casos: Unidad de Mantenimiento Vial - UMV

N°. de casos registrados

4

N°. de casos resueltos

4

## Número de casos registrados por mes




## Pendientes por Entidad que presentó el caso


No hay datos

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Para UMV, en la localización TV 19 con CL 44 sur y CL 47 sur, la calzada está bastante afectada ocasionando alto riesgo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para la UMV, para las intervenciones en el barrio "20 de julio", se requiere contacto del área de intervención, en aras de realizar proceso de coordinación al respecto de las obras adelantadas en este sector.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para UMV, se le consulta al Ing. Humberto frente a la intervención realizada en el barrio el Tunó – Calle 118 Bis Sur N°. 0-61, se reportó que la reserva del tramo corresponde a la UMV, por lo cual se requiere verificar si al efectuar labores de mantenimiento en carpeta de rodadura, se taparon dos pozos de alcantarillado, se requiere ingresar a los pozos para hacer mantenimiento a la red.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	ATENDIDO


### Número de casos registrados por mes

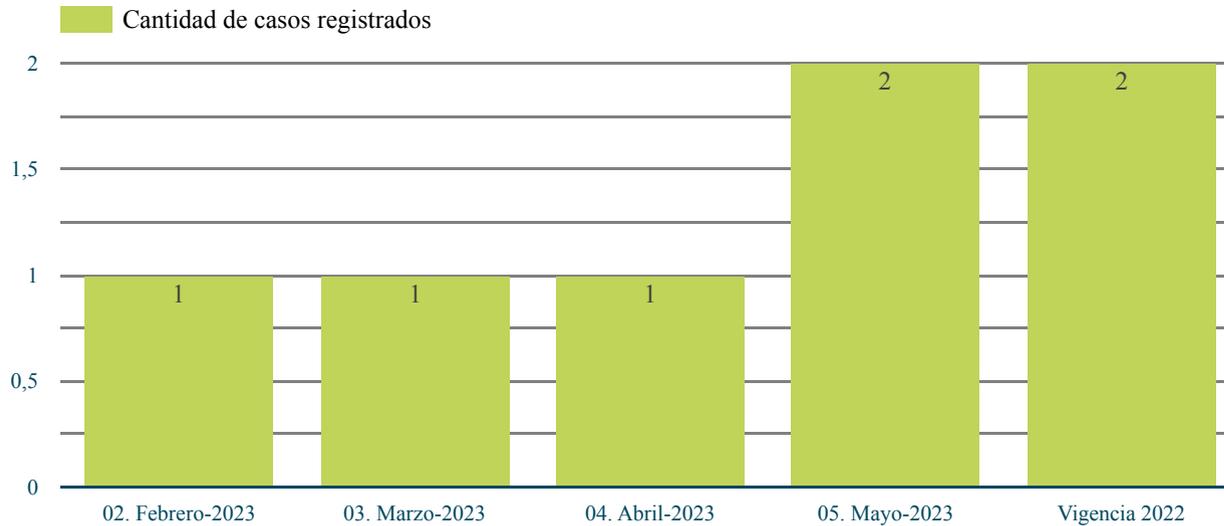

### Pendientes por Entidad que presentó el caso

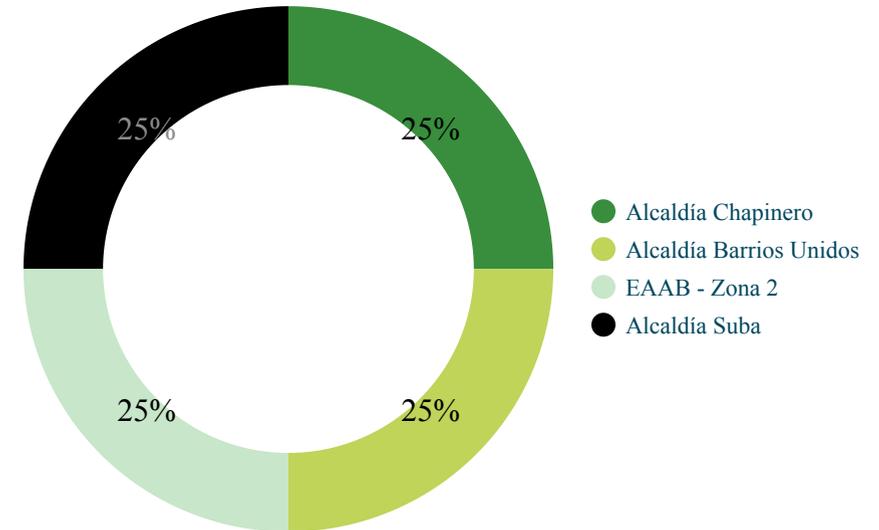

MES REPORTE DE CASO	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	PENDIENTE
03. Marzo-2023	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	PENDIENTE
04. Abril-2023	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	Para SDM, respecto de la respuesta a solicitud de aprobación de PMT, se indica que en el mes de febrero se radicaron 76 puntos, en marzo 265 y en abril 150, para un total de 491 puntos pendientes, sobre los cuales no se ha recibido respuesta, es importante precisar que no nos han hecho observaciones, entonces queremos saber que ha pasado con la respuesta, ya que se cuenta con aprobación del IDU y pagos.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer.	PENDIENTE



# Casos: ENEL Colombia ESP


N°. de casos registrados

54


N°. de casos resueltos

22

## Número de casos registrados por mes

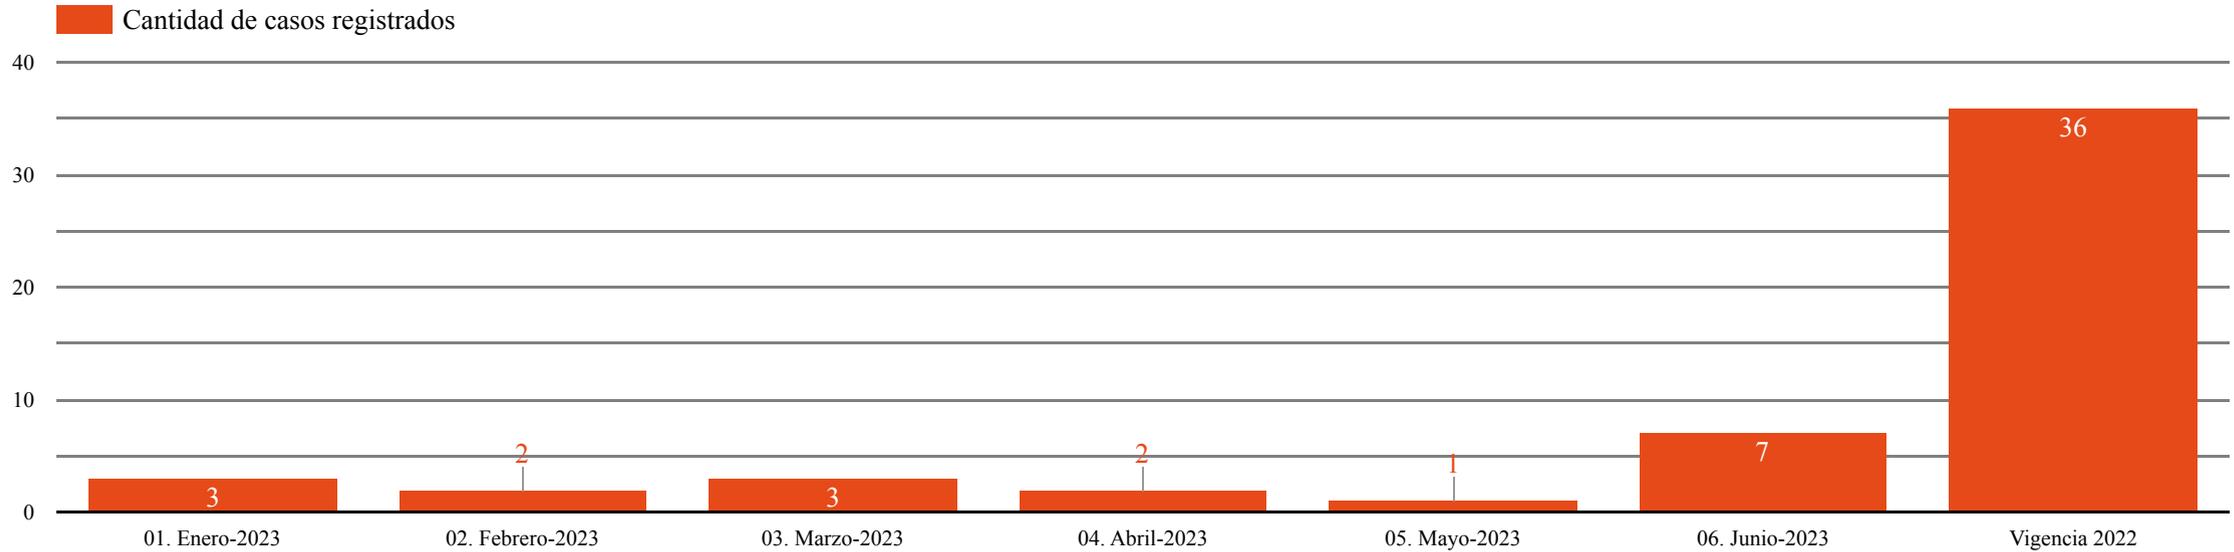


## Número de casos pendientes por responsable

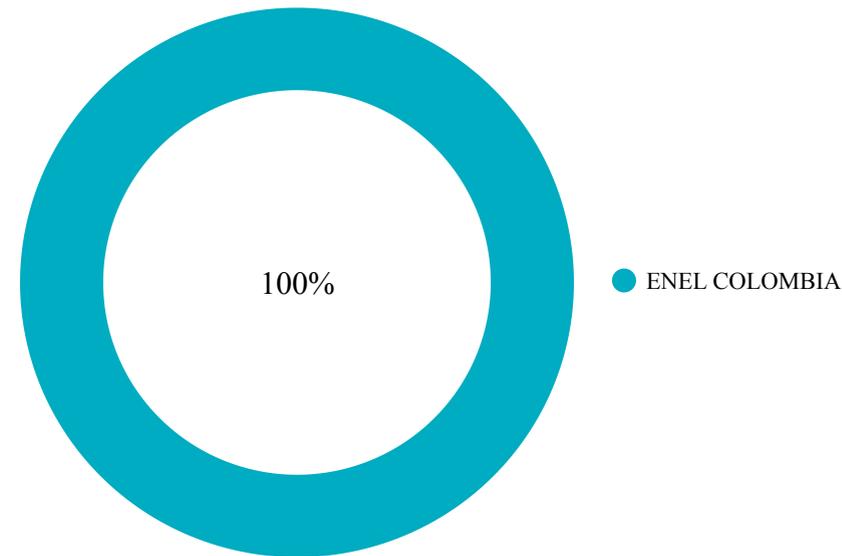

MES REPORT...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	PENDIENTE
01. Enero-2023	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	PENDIENTE
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa	ATENDIDO

**Número de casos registrados por mes**



**Pendientes por Entidad que presentó el caso**

No hay datos

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
06. Junio-2023	<p>Para VANTI, con respecto a un CIV en Alameda en la CL 63 Bis Sur entre carrera 74 H y 74F, solicita coordinar una visita de acompañamiento para tratar temas específicos en el punto. La obra fue reportada por medio de un oficio via correo electrónico informando las intervenciones y ubicación al inicio del contrato.</p> <p>Por otro lado, se realiza requerimiento frente a cinco puntos más en donde se van a abrir nuevos frentes de obra y solicita coordinar aspectos con VANTI. Se enviará correo electrónico para programar las visitas respectivas.</p>	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de VANTI para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. Se ha mantenido comunicación con la profesional Liliana Beltrán, sin embargo, no se ha generado factura para realizar pago respectivo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	<p>Para VANTI, Se trata en general de solicitud de respuesta a varios temas pendientes hace algún tiempo y que a continuación se sintetizan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Contrato 1683 de 2020 relacionado con paz y salvo, enviado vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán</li> <li>-Contrato 1698 de 2020 Acta de Competencia de pago en revisión por el Ing. Héctor Hernández, entregada por Ing. Dary Cogua.</li> <li>-Contrato 1692 de 2020, expedición de factura por daños, enviada vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán</li> <li>-Contrato 1691 de 2020, respuesta a solicitud de contratista sobre exclusión de vías reportadas por Vanti con daño en las mismas con objeto del contrato IDU citado</li> <li>-Contrato 1695 de 2020, respuesta a solicitud interventoría sobre estado del certificado de “paz y salvo” requerido</li> </ul>	ATENDIDO



# Casos:

## Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB


Nº. de casos registrados

10


Nº. de casos resueltos

3

### Número de casos registrados por mes

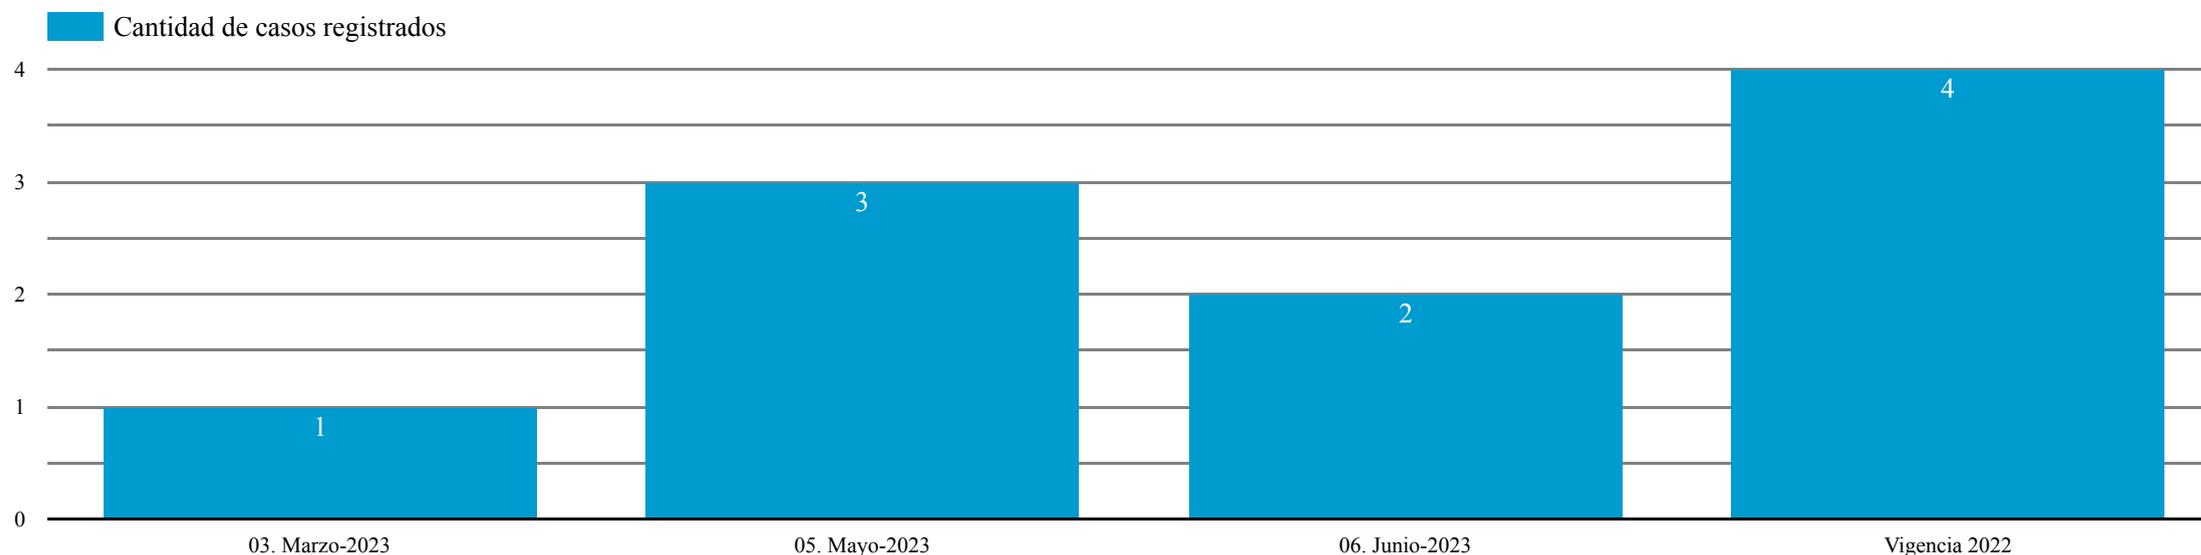


### Pendientes por Entidad que presentó el caso

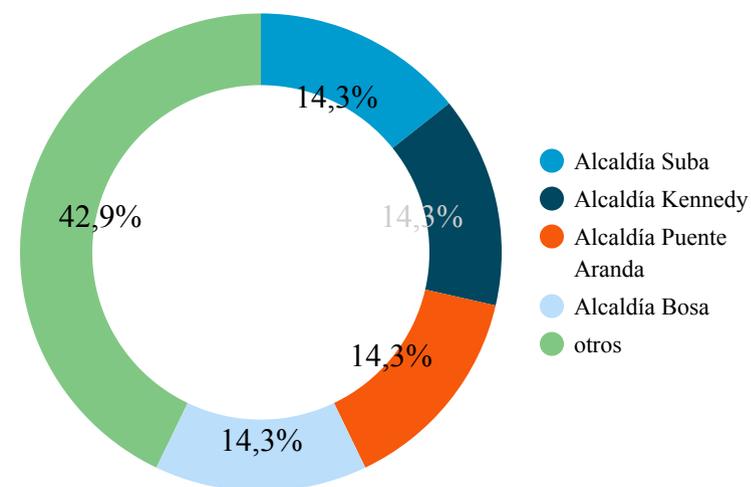


MES REPORT...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
03. Marzo-2023	Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renovación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal	ATENDIDO



**Número de casos registrados por mes**

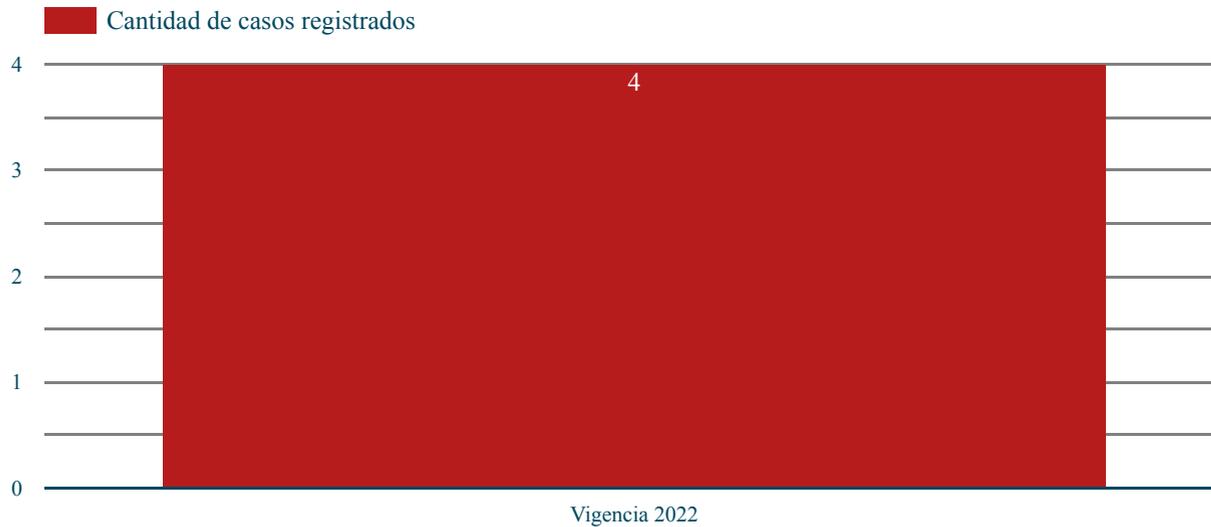

**Pendientes por Entidad que presentó el caso**

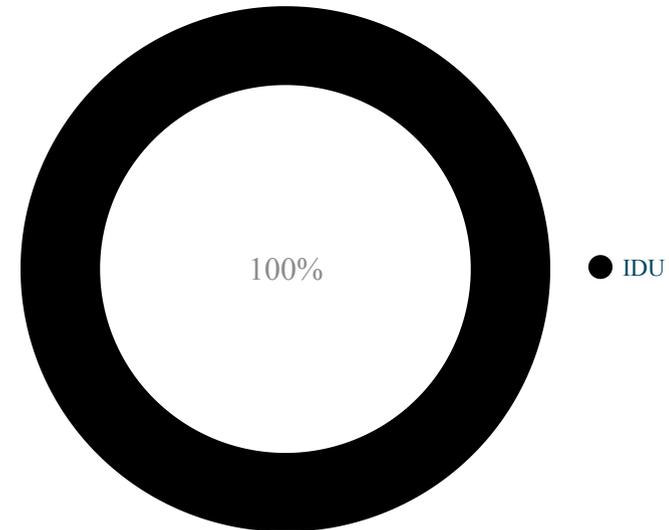

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	PENDIENTE


ENTIDAD RESPONSABLE RESPUESTA

MES REPORTE DE CASO


¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?

ESTADO DEL CASO


## Número de casos pendientes por mes a cargo de Alcaldías locales

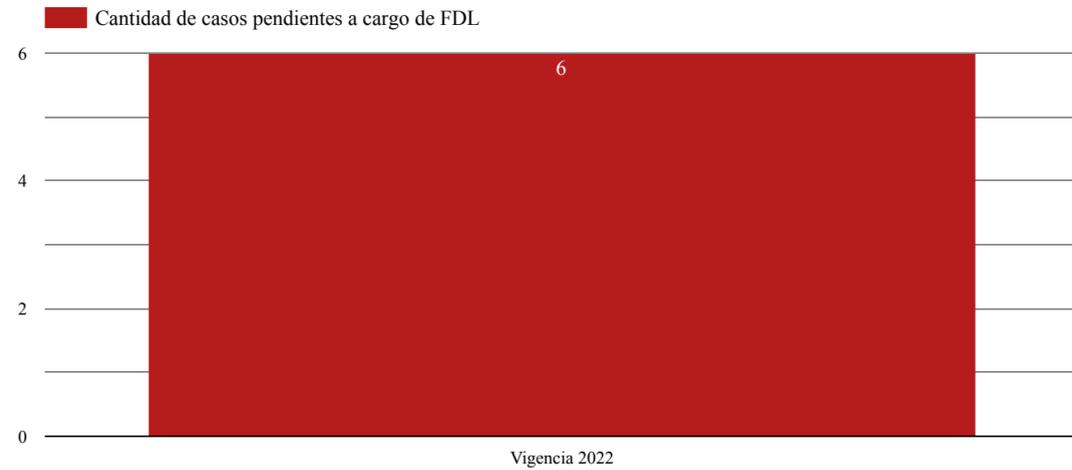

## Número de casos presentados por mes por Alcaldías locales

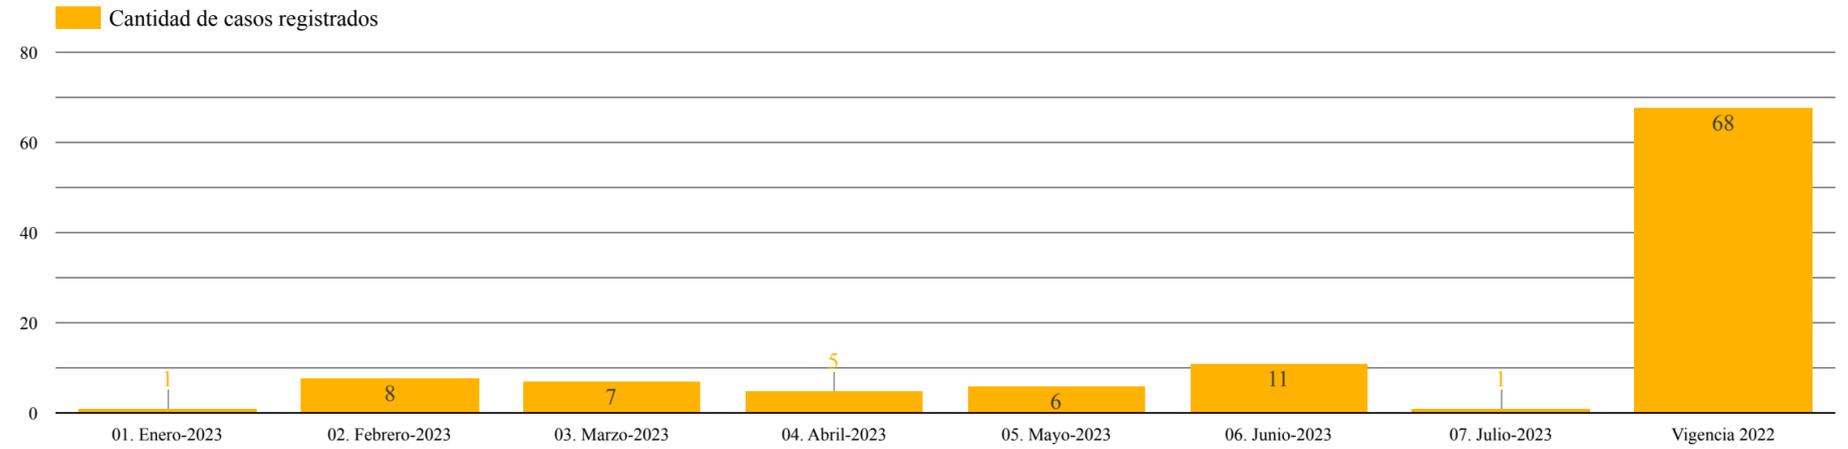

## Casos presentados por Alcaldía local

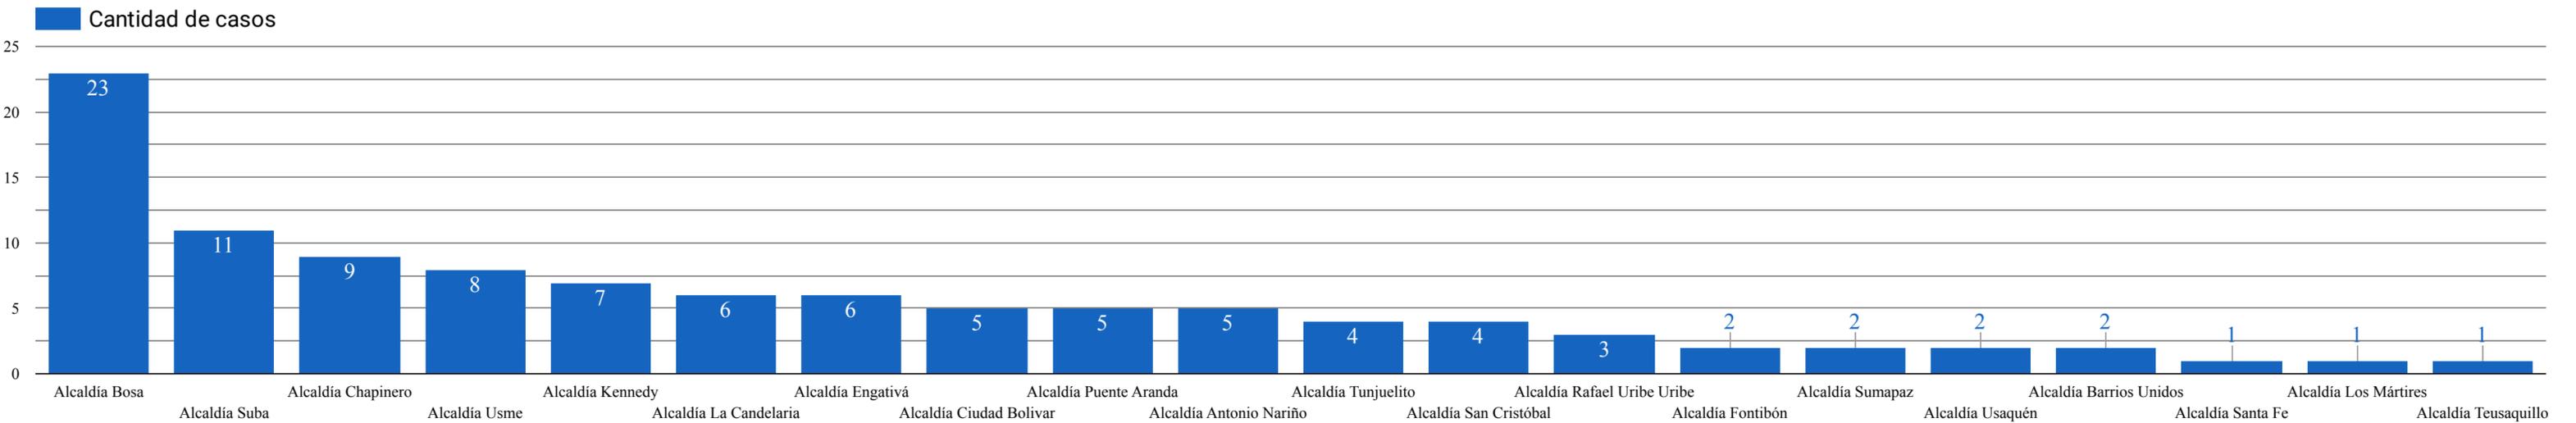

## Registro de los casos

MES REPO...	SOLICITUD	ENTIDAD ...	ESTADO DE...
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero-2023	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	IDU	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta.	IDU	PENDIENTE



Nº. de casos resueltos

45

Nº. de casos registrados

107

Nº. de casos pendientes

62
