# COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

# ACTA No. 38 de 2023 SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 19 de octubre de 2023

HORA: 08:30 am a 9:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

#### **INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

	_			ste	
Nombre	Cargo	Entidad	Sí	No	Observaciones
William Rodríguez	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	Х		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	Х		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	Х		
Juan Sebastián Acevedo Iriarte	Profesional SDA			Х	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50435
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		Х		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-57564
Martha Cecilia Bayona G.	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-57564
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		Х	Entidad no respondió solicitud de delegación.
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa		Х	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	Х		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		Х	Entidad no respondió solicitud de delegación.

#### **SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

#### **INVITADOS PERMANENTES:**

No. of co		<b>F</b> .01.1	Asiste			
Nombre	Cargo	Entidad	Sí	No	Observaciones	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X			
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	Х		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328	
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		Х	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	Х		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522	
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	Х		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522	
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	Х		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522	
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		Х	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151	
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)		Х		
Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		Х		
Oscar Fernando Escobar Alvarado	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		Х		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ЕТВ	Х		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-41750	
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	Х			
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		Х	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916	
Luis Enrique Abril	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		Х	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916	
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional Movistar	Movistar Colombia	Х			

#### **OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Manulana	0	Pottded	As	iste	
Nombre	Nombre Cargo Entidad		Sí	No	Observaciones
Manuel Eduardo Álvarez Vanegas	Profesional FDL de Antonio Nariño	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Χ		
Yenis Acevedo	Profesional FDL de Antonio Nariño	Alcaldía Local de Antonio Nariño	X		
Valentina Rocha Vega	Profesional FDL de Antonio Nariño	Alcaldía Local de Antonio Nariño	X		

Nambro	60	Fatidad	As	iste	01
Nombre	Cargo	Entidad	Sí	No	Observaciones
Juan Antonio Zafra Ruiz	Profesional FDL de Antonio Nariño	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Х		
Luis Alfredo Quezada Aldana	Profesional FDL de Antonio Nariño	Alcaldía Local de Antonio Nariño	Χ		
Juan Alfredo Torres Prieto	Profesional FDL de Puente Aranda	Alcaldía Local de Puente Aranda	Х		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

- 1. ORDEN DEL DÍA:
- 2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
- 3. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
- 4. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
- 5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (37 DE 2023).
- 6. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
- 7. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
- 8. TOMA DE DECISIONES.
- 9. COMPROMISOS.
- 10. CONCLUSIONES.

#### **DESARROLLO:**

#### 1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

#### 2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. Álvaro Reinoso Guerra en su calidad de encargado de la presidencia del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión treinta y ocho (38) del año 2023, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

#### 3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se coordina con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, el orden de intervención de las Alcaldías Locales de Antonio Nariño y Puente Aranda, siendo invitadas a esta sesión, se da la palabra a Manuel Álvarez:

#### 3.1 Manuel Álvarez – Alcaldía de Antonio Nariño:

Se señala que se tiene un caso para presentar:

 Caso nuevo: Para SDM, a inicios de octubre se solicitaron unos diseños de señalización para que sean implementados en el desarrollo de un contrato del Fondo de Desarrollo Local, se requiere información al respecto. **Intervención SDG – Jacqueline Friede:** Por favor, indicar número de radicado y fecha a SDM, para que la delegada nos apoye con la verificación del requerimiento ante la Entidad.

Respuesta Manuel Álvarez – Alcaldía de Antonio Nariño: Señala que no cuenta con el radicado de SDM, remite radicado del Fondo de Desarrollo Local con número 20236520225211.

#### 3.2 Luis Alfredo Quezada - Alcaldía de Antonio Nariño:

Precisa que se tiene un caso para presentar:

 Caso nuevo: Para SDA, se solicita apoyo para dar cierre a PIN ambiental, con radicado SDA 2023ER161367 del 17 de julio de 2023 y PIN 22203 del contrato de obra 214-2022.

#### 3.3 Juan Alfredo Torres – Alcaldía de Puente Aranda:

Se indica que el Fondo de Desarrollo Local tiene próximo el inicio de un contrato para intervenir malla vial, por lo cual requiere acompañamiento de las ESP, se harán invitaciones por escrito en los próximos quince (15) días.

#### 4 LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (37 DE 2023).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 12 de octubre de 2023, correspondiente a la sesión número **37** del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se reciben observaciones, por tanto, procede a firma en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

También se menciona, que el **acta 34** está publicada en página Web de Planeación, mientras que el **acta 35** y **36**, así como el **informe trimestral III** se encuentran en proceso de firma en el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes en los últimos dos meses:

N°. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Radicado SDP Respuesta Publicación	Fecha de publicación
32	07/09/2023	Х	Х	Х	Х	3-2023-33573	3-2023-34946	05/10/2023
33	14/09/2023	Х	Х	Х	Х	3-2023-33573	3-2023-34946	05/10/2023
34	21/09/2023	Х	Х	Х	Х	3-2023-34372	3-2023-34948	05/10/2023
35	28/09/2023	Х	Х	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
INFORME	TRIMESTRE III	Х	Х	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

N°. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Radicado SDP Respuesta Publicación	Fecha de publicación
36	05/10/2023	Х	Х	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
37	12/10/2023	Х	х	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

#### 5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el Ingeniero Álvaro hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, EAAB, SDM, ETB.

#### 5.1 IDU - Álvaro Reinoso:

Solicita realizar seguimiento a los casos que se tienen asignados por Empresas de Servicio Público y Entidades, actualmente se han generado herramientas que facilitan efectuar rastreo y control de los casos, como la matriz de seguimiento y el tablero de control, los cuales se encuentran en línea, se actualizan de manera semanal y son dinámicos, lo que hace posible verificar los avances que se registran, así mismo, se informa que se incorporaron tableros específicos por empresa y entidad para que se pueda revisar la información de manera rápida.

En adición, se indica que la sesión del 09 de noviembre de 2023 se realizará de manera presencial en el piso 7 del edificio del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

#### 5.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se informa que el **caso 447** se encuentra resuelto, se agradece la gestión realizada al respecto. Así mismo, se expone un caso nuevo, el cual fue remitido vía WhatsApp el día de ayer.

 Caso nuevo: Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 92, se presenta un desnivel importante respecto a la rasante de la vía, la cual afecta la movilidad y la seguridad vial.



A su vez, se señala que este tema fue llevado a la Mesa Distrital de Monitoreo, y allí no se obtuvo respuesta, por lo cual se trae a la actual instancia de coordinación, por lo cual, se solicita

a Oscar Escobar (delegado de ENEL) que emita respuesta y realice las gestiones pertinentes para solucionar este caso.

#### 5.3 EAAB Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez:

Se informa al respecto de los siguientes casos:

- Caso 467: Resuelto, correspondía a un cambio de rejillas.
- Caso 468: Resuelto, se solicitaba la revisión por parte de la EAAB sobre hundimientos en la calle 21 entre carrera 91 y 93, se verificó y no hay daños asociados a redes.
- Caso 480: Resuelto.
- Caso 519: Resuelto, se requería la respuesta a un radicado, se remitió mediante consecutivo S-2023-243837.

#### 5.4 EAAB Zona 4 – Juan Carlos López:

Se informa que se efectuó revisión sobre tres (3) casos presentados por la Arq. Carmen Rocío López:

- Caso 395: Realizada la visita de campo, se observa que la cámara referenciada no es de EAAB, sino de ETB.
- Caso 416: Es un caso de la zona 3, se hizo visita con Francisco Rodríguez y se observó una filtración de aguas residuales.
- Caso 417: Corresponde a una filtración de aguas residuales, realizando verificación de campo, se observa que proviene del Colegio Misael Pastrana, la EAAB informó a la institución para que arreglen la situación, ya que se está afectando la vía pública. Se recomienda trasladar al Fondo de Desarrollo Local para que haga los controles respectivos con inspección de policía al colegio.

Finalmente, se solicita a Humberto Ramírez de la UAERMV, información de contacto con profesional que desarrolla intervenciones en la Calle 48A Sur con Carrera 28 – Barrio Samore – Localidad de Tunjuelito.

**Intervención ETB – Carmen Rocío López:** Se agradece a Juan Carlos la verificación de los casos, y se indica que se volverá a revisar la cámara del caso 395, ya que se reportó inicialmente que no era propiedad de ETB, por otro lado, se revisará el tema del colegio (caso 417) para ratificar las acciones a seguir.

#### 5.5 SDM – Martha Helena Silva:

Se solicita el cierre de los siguientes casos:

- Caso 525: Resuelto, se solicitaba mesa de trabajo con el Ing. Henry Cruz.
- Caso 529: Resuelto, respecto a solicitudes de PMT, se remitió respuesta a Jacqueline Friede con trazabilidad de los radicados.

#### 5.6 ETB – Carmen Rocío López:

Para las entidades y ESP presentes se reiteran los casos que continúan pendientes han sido expuestos.

#### 6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
366	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a realizar intervención de cambio de carpeta en este tramo vial y se requiere evaluar infraestructura de redes húmedas.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
367	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	IDU	PENDIENTE
370	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA, SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto Línea Techo Veraguas, adicionalmente se solicita lograr la viabilidad de inicio de actividades de modernización sobre el tramo 2 - Calle 3 entre cra 50 y Av 68 para el primer trimestre de 2023	Entidades participantes en el Comité	SDP emitió respuesta con radicado SDP N°. 2-2023-18434
372	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los incovenientes general soluciones y reactivar el contrato	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
373	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliairia del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
374	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carreras 7 y 9 se realizó visita e inspección y se evidenció que corresponden a acometidas domiciliarias de la empresa de acueducto, se hace el llamado a la zona 1 de la Empresa de Acueducto para que por favor revise, se deja trazabilidad del caso en chat de grupo de trabajo y registro fotográfico	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
375	Se reporta hundimeinto en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
376	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, Cl26 con KR 69 y el tercer punto Cl 26 cerca a la Av Boyaca	IDU	PENDIENTE
378	Solicitud de priorización al FDL de Usme sobre una intervención en la Calle 99 Sur No. 1A- 61, se remitió solicitud mediante correo eléctronico	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE, Acta 05 :SDG indica que el correo fue remitido al fondo de desarrollo local sin embargo no se ha dado respuesta
379	Requerimiento de respuesta a la Zona 1 EAAB del radicado 3133002 -S-2022-317611 por concepto de instalación de tuberia en acero de 14 pulgadas en la Carrera 62 entre Calle 169 B y Calle 167	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
380	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A. En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Álvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	IDU	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
381	Requerimiento respecto a 110 puntos objetados por el IDU ni el IDPC ni el IDRD dan respuesta, lo que ha generado problematicas para atender el proyecto de fibra optica para la ciudad, solicita priorizar el caso	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
387	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
388	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
391	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
392	solicitud a la EAAB respecto a daños en proximidad al pozo de inspección, posibles daños en la red de alcantarillado. Se solicita evaluación por parte de la EAAB en la Carrera 52 C desde la Calle 41 Sur hasta la Calle 41 A Sur.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
395	Caso de una cámara localizada en la Carrera 23D No. 60A - 10 Sur que está sin tapa, una señora tuvo un accidente en dicha cámara	EAAB - Zona 4	EAAB Zona 4 – Juan Carlos López: Realizada la visita de campo, se observa que la cámara referenciada no es de EAAB, sino de ETB.
396	requerimiento respecto a una consultoría del 2018 sobre dos salones comunales, indica que en 4 años no se ha obtenido resultado alguno, sin embargo menciona que de la consultoría de ambos salones comunales el que se encuentra ubicado en la Carrera 35A con Calle 9 Sur detrás de la Iglesia de Santa Matilde requiere apoyo referente a un contacto para agilizar el trámite de disponibilidad de servicios públicos con Acueducto, Vanti y Enel Colombia (Codensa), indica que con Vanti ya se tuvo la primera audiencia sin embargo la idea es volver a solicitarla.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
398	otro caso es el del CIV 16002083 vamos a iniciar su intervención, es un callejón cerrado en pavimento flexible pretendemos hacerlo en pavimento rígido, pero por esa misma proyección que tenemos necesitamos la definición del acueducto si allá se van a cambiar o no las redes para poder definir tiempos de trabajo en conjunto. Dirección a intervenir Carrera 51 entre Calles 37 Sur y Calle 28 Sur	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
400	En la noche del 6 de marzo de 2023 se hizo un recorrido con la UAESP para el tema de las expansiones que necesitamos en un parque porque es un punto crítico de venta de estupefacientes y de habitabilidad de calle, en este momento se está generando un sendero con la comunidad a partir de la iniciativa juntos cuidamos Bogotá, pero necesitamos las expansiones de esa luminaria, la UAESP nos indicó que cuando termináramos el sendero hiciéramos otro recorrido para solicitarle a Enel el tema de la expansión, nos gustaría darle celeridad a ese tema porque es un punto crítico de la localidad y la comunidad lo ha pedido mucho	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE Acta 14-2023: Se efectuó recorrido el 6 de marzo, se está gestionando a través del comité de expansiones.
404	solicitud al acueducto zona 5 sobre un caso reportado en marruecos Calle 50 A Sur No. 7 – 64, requiere que atienda visita en este sector.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
406	solicitud para las empresas ENEL Colombia, Vanti, ETB y Acueducto, están por iniciar dos proyectos un parque de bolsillo en la Calle 7 con Carrera 3 y uno de espacio público en la Calle 12C entre 1A y Carrera 3 desde la Calle 12B hasta la Calle 12D, requerimos acompañamiento de las empresas con el objetivo de	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	generar un diagnóstico de redes para que el contratista las tenga en cuenta, la semana pasa se enviaron las solicitudes, pero no se ha obtenido respuesta, pregunta que si por medio de este comité se puede generar la cita.		
408	presenta requerimiento para la zona 1 de acueducto con el ing. Mauricio Mahecha, donde un ciudadano reporta una queja indicando que hace más de dos meses la empresa de acueducto rompió e hizo una zanja frente al predio de la Carrera 46 No. 138 – 53 y no se ha recuperado, para que por favor zona 1 investigue a que contrato pertenece.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
410	En la Carrera 62 con Calle 62 hasta la Calle 64 en el barrio Santa Rosa Sur hay cuatro segmentos viales que no cuentan con alcantarillado pluvial, se solicita apoyo a la EAAB, la comunidad manifiesta que en ocasiones se ha generado inundación en sus predios.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
411	El año pasado se presentaron unas solicitudes de factibilidad a ENEL para el servicio en Betania y San Juan. Se hicieron visitas técnicas y nos informaron que para Betania se tenían que hacer unas adecuaciones eléctricas que ya se están estudiando dentro de una formulación. Sin embargo, quedó pendiente el tema de San Juan, indica que de esas visitas no recibió acta, adicionalmente desconoce si la información fue recibida por ingenieros y arquitectos que ya no están en el fondo, es decir que se perdió la trazabilidad del caso, pregunta si es posible que de parte de ENEL que le remitan las actas de esas visitas técnicas.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
412	El FDL de Chapinero el marco del Decreto Distrital 168 del 2021 ha solicitado la asistencia técnica tanto a empresas de Servicios Públicos como entidades distritales, sin embargo algunas de estas entidades no nos han dado respuesta, es muy importante contar con los delegados de cada entidad para poder llevar a cabo las mesas de trabajo de asistencia técnica teniendo en cuenta que en los estudios y diseños que existen en el banco del FDL de Chapinero se prevé la subterranización, traslado y protección de redes de servicios públicos perteneciente a los activos de cada empresa. Se han adelantado algunas mesas de trabajo con algunas entidades distritales, sin embargo en este momento estamos a la espera de los delegados de la Secretaría Distrital de Planeación por parte de la Secretaria Jurídica, IDU, Claro, ENEL Colombia, IDPC, Movistar, Promo ambiental, Catastro, Une EPM, Grupo Energía Transición, DADEP, Requerimiento N. 2 Al IDU y Secretaría Distrital de Hábitat. En el mismo correo donde se envió la invitación a la convocatoria se va a enviar estos oficios con los acuses de recibido por parte de cada una de estas empresas y entidades, con el objetivo de contar con la asistencia tecina y respuesta oportuna a los procesos de formulación del FDL de Chapinero.	IDU	PENDIENTE
415	Solicitud al Ing. Pablo Ponce para que por favor nos ayude a evaluar el cobro de energía de la planta la esmeralda, la sede de producción, nos llegó un cobro por 235 millones de pesos, estamos un poco ilíquidos, de acuerdo con una revisión que hizo uno de los contratistas de ENEL para avaluar el cobro se dio cuenta que en algún momento el consumo de energía había bajado y establece que como es una sede industrial entonces nosotros producimos todos los días las mismas cantidades y no es así, hay meses donde no tenemos la mezcla de agregados y donde la producción baja, ya le escribí al Ing. Pablo Ponce no me ha contestado voy a reiterar a ver cómo nos puede ayudar para ver a quien le respondemos el requerimiento y si nos dan plazo para pagar eso.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
416	Corresponde a la filtración de aguas residuales entre la transversal 19 y calle 46 sur donde se ubica la central de ETB San Carlos, hay una filtración de aguas residuales que está llegando a la red de ETB y está ingresando al predio San Carlos y está generando malos olores adicionalmente está afectando	EAAB - Zona 3	PENDIENTE EAAB Zona 4 – Juan Carlos López: Es un caso de la zona 3, se hizo visita con Francisco Rodríguez y se observó una filtración de aguas residuales.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	al colegio Bernardo Jaramillo, no sabemos si hay un tubo roto conexión errada o alguna que está ocasionando esta problemática.		
417	Para EAAB – Zona 4, tenemos una filtración en una caja de paso en la Calle 36H Sur N°. 11A-08, se requiere una visita conjunta con la empresa para verificar los daños, se precisa de manera urgente pues corresponde al desagüe de una caja de paso sencilla y sobre la misma se ha presentado derecho de petición.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE Acta 13: Se indica que se remitió respuesta por correo, se informa reenvío de información el 20 de abril. Acta 38: Corresponde a una filtración de aguas residuales, realizando verificación de campo, se observa que proviene del Colegio Misael Pastrana, la EAAB informó a la institución para que arreglen la situación, ya que se está afectando la vía pública.  Se recomienda trasladar al Fondo de Desarrollo Local para que haga los controles respectivos con inspección de policía al colegio.
418	En la calle 127 con 13A, la semana pasada se informó al delegado de EAAB - Zona 1, sobre una filtración de agua, allí enviaron personal, pero dijeron que no era del alcance de ellos. Sin embargo, ETB está preparando la cámara y arreglando todo lo que le corresponde, no obstante, la filtración continúa. Por lo cual, se le requiere a la EAAB que revise la filtración y solucione este inconveniente.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
421	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	ЕТВ	ACta 32: ETB indica que no encuentran información asociada a dicho contrato, van a elevar una comunicación al FDL de Kennedy para informarle que no se obtuvo ninguna información sobre el caso.
423	Para EAAB – Zona 1, se solicita realizar visita y medidas tendientes a reparar socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente – occidente.	EAAB - Zona 1	Reiterado por IDU en el Comité N°. 18: Para EAAB – Zona 1, se reporta hueco en la calle 134 entre carrera 19 y carrera 19A - CIV 1003972 PK 510728. Indican que hay una importante socavación de aproximadamente un metro de profundidad, que se observa una tubería al parecer de alcantarillado. Reiterado por IDU en el Comité N°. 23: Para EAAB – Zona 1, EAAB INFORMA: Respecto a los requerimientos presentados por el IDU – Onisalba Segura de Arbeláez, se debe precisar que la recuperación del espacio público en zona 1 se realiza a través de un contrato de obra, por lo cual la información se remitió al contratista para que se efectuará las labores correspondientes y así presentar los soportes de atención a los casos.
426	Se solicita acta de coordinación al Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB - Zona 3, se ha requerido de manera reiterativa desde enero, toda vez que se está solicitando por una acción de tutela y a la fecha no se ha tenido respuesta al respecto.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE Acta 15-2023 - IDU – Álvaro Reinoso: Se envió directamente al director de acueducto Carlos Rivera y él se lo remitió al ingeniero Juan Rafael Osorio de la Zona 3. De igual manera, ayer se reiteró, porque de VANTI se recibió nuevamente requerimiento.
428	Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.	SDA	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
429	Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.	SDA	PENDIENTE
431	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una reunión que se llevó a cabo ayer (10-mayo-2023), en el tramo de la carrera 18 B entre calle 145 y 146. Allí la UMV va a intervenir, pero según lo informado por la dirección de la obra (Ing. Rafael Pérez) hay problemas de drenajes, entonces, se solicita a la EAAB evaluar el caso de manera conjunta y llegar a una posible solución. En la reunión estuvo José Casallas y Jairo García de la EAAB, por lo que conocen este caso y se solicita sea comunicado al Ing. Mauricio Mahecha.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
432	Para ENEL Colombia, se relaciona con una cámara localizada en la calle 147 # 9-60, presencia de hueco que al observar con más detalle se encuentra que la base donde se apoya la tapa en dicha cámara se encuentra dañada generando una diferencia de altura, la cual al pasar un vehículo produce un efecto de rebote y a su vez las vibraciones dañando tanto la estructura de la cámara como la del pavimento adyacente a la misma.	ENEL COLOMBIA	Acta 23 del 29 de junio de 2023: se informa que SDM va a instalar esta semana unos semáforos provisionales para regularizar el tránsito en este sector, y posteriormente si se aprobaría el PMT para realizar la intervención pertinente. Acta 32: ETB solicita avance del caso a lo que ENEL no tiene respuesta al respecto, pero va a reiterar el seguimiento correspondiente.
435	Para IDU, el requerimiento presentado consiste en la obra que requiere adelantar Movistar frente a una de sus oficinas, el día de ayer la interventoría del contrato 1791, respondió que el acta de recibo definitivo no ha sido emitida para el inicio de la garantía, por tanto, no se pueden ejecutar obras adicionales. En adición, se observa que la ejecución se realizó sobre la ciclorruta y se requiere intervenir en un área diferente a este sector.	IDU	Acta 17: Existe una opción a través del acta de coordinación, si se indica por parte del contratista que ya terminaron la obra, esta es una información valiosa, y quizás exista una posibilidad de autorización, así mismo, la situación debe ser resuelta desde el área ejecutora, para advertir formas de avanzaba y coordinar las obras entre las dos entidades tal como se quería siempre  Acta 18: Se tiene visita el día 26 de mayo para verificar en campo con Interventoría, es posible que se efectué acta de coordinación.
437	Para ETB, sobre la calle 4F se tiene un cámara al parecer de telefonía, no obstante, se encuentra con marcación de EPM, la cual afecta la red pluvial del proyecto. Se solicita apoyo al respecto. Se encuentra cercano al CIV 16001178 – KR 44 entre CL 4F y CL 4F Bis y el contrato del cual hace parte es el 263 de 2022, contratista CONSORCIO INGESEM 2022.	MOVISTAR	FDL informa en sesión 28 de 2023 que la infraestructura no es propiedad de ETB, una vez revisada visita conjunta.
440	Para EAAB, en la carrera 69B con calle 17 en el costado nororiental se encontraron dos cámaras con cables y canalizaciones afectadas por obras de la EAAB. Se solicita visita para verificar y atender los daños.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
443	Para SDA, frente al contrato FDL RU 281 de 2019, se realizó radicación N°. 2021ER143989, donde se programan y efectúan visitas con funcionario de la SDA, contratista e interventoría. De estos recorridos se solicita generar modificaciones, y nuevamente se radica a la Entidad con número 2022ER173992, no obstante, a la fecha no se ha generado respuesta y desde el Fondo de Desarrollo Local se han remitido diversas comunicaciones sin pronunciamiento por parte de SDA. Este contrato lleva aproximadamente suspendido desde febrero del año pasado porque se requiere respuesta de Secretaría Distrital de Ambiente, para definir lineamientos y precisar la terminación.	SDA	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
444	Para ENEL Colombia SA ESP, se solicita recorrido para expansión de alumbrado público en el parque Sarasota de la localidad de Rafael Uribe, se remitió comunicación de manera previa a través de radicado 20216823134.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
448	Para EAAB – Zona 1, respecto a la Avenida Ciudad de Cali con calle 134, se informa que son obras de redes donde su contratista dejó abandonada la intervención, son alrededor de 80 metros y la EAAB está solicitando que la UAERMV apoye con la terminación de esta obra. Se realizará la visita, pero la posición de apoyar el requerimiento en el momento es casi nula.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
452	Se solicita a ENEL Colombia SA ESP, que por favor deleguen a una persona para llevar a cabo las coordinaciones y los acercamientos a los que haya lugar en cumplimiento del principio de planeación y ley de infraestructura, frente a la etapa de formulación de los proyectos que tiene en curso el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
453	En el desarrollo del contrato 289, se llegó a la etapa de liquidación, y se están tramitando los certificados de "paz y salvo" con la EAAB, el día 16 de mayo de 2023 se remitió comunicación, pero no se ha logrado una coordinación con el líder de zona 1 y 2, el número de radicado es E-2023-047187, se solicita una respuesta oportuna. Se requiere visita de manera efectiva, para lograr liquidar, se han recibido recomendaciones de hacer nuevamente un oficio y radicar una reiteración en la EAAB, especialmente para zona 1, no obstante, se espera coordinar a través de esta instancia.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
454	En el marco de la ejecución del contrato 327 de 2023, se realizó la solicitud de visita técnica en campo a ENEL Colombia SA ESP, y a la fecha no se ha recibido respuesta, por lo cual se solicita un contacto para gestionar los requerimientos del contrato. Adicionalmente se informa que el radicado de la solicitud a ENEL es 000537380 del 23 de mayo de 2023.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
455	Para EAAB-Zona 1, el FDL de Usaquén se encuentra liquidando el contrato N°. 175 de 2022, por lo cual se encuentran en proceso de obtener los certificados de "paz y salvo" por parte de las empresas de servicios públicos, de tal manera, se requiere respuesta por parte de la EAAB-Zona 1, el radicado es E-2023-045253 del 10 de mayo de 2023.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
456	Para ETB, en la carrera 75 con calle 24, la UAERMV está realizando trabajos de rehabilitación, en una actividad se generó daño en red de fibra óptica de ETB que se encontraba superficial, se requiere conocer si la Gerencia de Intervención se comunicó con Benjamín Ochoa para efectuar reparación temporal.	ETB	Acta 34: El Ingeniero Benjamín informa que en este tramo hubo una afectación a la canalización pero que la UAERMV no ha manifestado la intención de realizar la reparación. Se da número de contacto al Ingeniero Humberto Ramírez de la UAERMV para que se ponga en contacto con Benjamín Ochoa y se de claridad respecto a la reparación de la red. Acta 35: UAERMV – Humberto Ramírez solicita contacto de correo electrónico de Benjamín Ochoa para continuar gestión del caso expuesto, ya que no se ha podido establecer comunicación vía telefónica, es remitido por Carmen Rocío López.
457	Para EAAB-Zona 5, se compartió el día de ayer un reporte correspondiente a daño sobre una cámara telefónica de ETB localizada en límite entre Bosa y Soacha, se solicita socializar situación con delegado correspondiente, para que se realice la reparación o se reciba factura con costo de los daños, adicionalmente se señala que al tener expuesto los cables telefónicos, pueden ser objeto de vandalismo y/o generar algún tipo de accidente.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
458	Para EAAB-Zona 5, se reporta segmento vial que salió en las noticias, está ubicado en la CL 26 S Entre KR 73 B BIS Y KR 73 C, se evidenció una socavación aparentemente por daño de redes, se intervino en marzo de 2022 en el Convenio 389 de	EAAB - Zona 5	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	2020 entre el Fondo De Desarrollo Local de Kennedy y UMV, no obstante, no se puede adelantar parcheo hasta tanto se realice revisión y reparación de redes.		
459	Para EAAB – Red Matriz, se requiere validación de daños generados por las obras de la manija de Tibitoc, en la Av. Boyacá con Calle 10B, se envió correo electrónico a Fabián Restrepo (contratista de la obra), pero no se ha obtenido ningún tipo de respuesta, por tanto, se requiere escalar con delegado de EAAB.	EAAB – Red Matriz	PENDIENTE
462	Para SDA, se realizaron varios requerimientos para cierre de PINES AMBIENTALES: 19817 con radicado 2023ER977455, 19879 con radicado 2023ER97478, 18724 con radicado 2023ER97479, 21178 con radicado 2023ER97480, la solicitud se efectuó hace más de tres meses, lo cual representa un valor de aproximadamente 3000 millones, afectando las obligaciones por pagar, y siendo contratos que están próximos a fenecer, es un tema urgente para el FDL. Se hizo reunión en la Alcaldía Mayor hace 8 días, invitando a Secretaría Distrital de Ambiente, pero no se muestra ninguna disposición para avanzar.	SDA	PENDIENTE
464	Se presenta requerimiento para VANTI, respecto al traslado de una red de polietileno de 1" en el sector de Gualoche que se instaló sobre la vía. Se han realizado visitas por parte de VANTI, pero se requiere consolidar el traslado de la red a un costado del andén, generando retrasos en el proceso constructivo.	VANTI GAS NATURAL	Acta 34: VANTI solicita a Jacqueline contactar a FDL-Bosa para que se precise localización del sector Gualoche.
465	Para IDU, Requerimiento respecto al contrato 1311 correspondiente a sumideros, del cual no se ha podido cerrar el recibo de vías por parte del IDU, el contratista ya entregó los documentos radicados de acuerdo con lo conversado. Coordina una visita al IDU con el ing. Álvaro Reinoso ya que para ese contrato se vencen los términos próximamente.	IDU	PENDIENTE
469	Para ENEL, se tiene solicitud por parte de contratista S y S ingeniería, que termino contrato el 21 de mayo de 2023 con el FDL de Fontibón, ha solicitado certificación de "paz y salvo" y no ha recibido respuesta.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
471	Para SDA, se solicita apoyo del delegado para realizar cierre de los siguientes pines ambientales, los cuales cursan trámite en la Entidad: COP 314-2021: 2022ER150964, COP 290-2018: 2022ER320627, COP 291-2018: 2022ER295400, COP 317-2021: 2022ER168259.	SDA	PENDIENTE
472	Para SDA, respecto al contrato 391 de 2022, se presentan una serie de observaciones con el permiso de ocupación de cauce (Radicado SDA 2023EP74478 del 30 de marzo de 2023), el cual es requerido para intervenir puentes peatonales y vehiculares que cruzan por cauces de agua. Se precisa una revisión previa, puesto que al contrato le queda solo un mes de ejecución y se solicita información especializada.	SDA	PENDIENTE
473	Para EAAB-Zona 2, se solicita respuesta a requerimiento de "paz y salvo" para parques donde se efectuó mantenimiento por parte del FDL, el radicado de entrada es E-2023-038775 del 25 de abril de 2023.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
474	Para SDA, se solicita respuesta a requerimiento de "cierre del PIN Ambiental N°. 21870" para parques donde se efectuó mantenimiento por parte del FDL, el radicado de entrada es 2023ER129015.	SDA	PENDIENTE
477	Para EAAB-Zona 4, respecto a un daño evidenciado en la calle 55 sur con carrera 17 – CIV 6001412 PK 324192, la UAERMV está realizando intervención en el marco del programa de barrios vitales en la localidad de Tunjuelito, se observó un escape de agua, se solicita atención por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 4	Se reitera el caso en la sesión del 31 de agosto de 2023 Acta 32: EAAB indica que ya se repararon los daños, solicita a la UMV la recuperación del espacio público

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
478	Para IDU, se solicita el cierre de la licencia de excavación N°. 173 de 2020, así mismo, se requiere informar al delegado de la EAAB si hay alguna observación o respuesta al contratista, se anexa radicado IDU 20235260604902.	IDU	PENDIENTE
479	Para EAAB-Zona 1, se indica que existe una filtración de agua potable sobre cámara de ETB ubicada en la Autopista Norte con Calle 125, se requiere atender con urgencia y que se realice la recuperación respectiva por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
481	Para la Alcaldía de Engativá, el área operativa de la EAAB encontró unas obras que ejecutó un particular, se observa conexión de una domiciliaria de alcantarillado en la KR 90 Bis N°. 69A-18 de la localidad de Engativá, se presentó afectación del espacio público sobre calzada e intervención no autorizada sobre las redes.	Alcaldía Engativá	PENDIENTE
484	Se presenta tema pendiente con VANTI – Gas Natural, y que se ha venido adelantando con el profesional Mauricio García, se informa que se encontró una red de 4" en acero, instalada posiblemente a través de perforación dirigida, afectando una descarga de domiciliaria de 6" en un predio localizado en la Calle 5B con carrera 73C, aunque ya se tiene conocimiento de la situación a resolver, se solicita quede consignado en el acta y se dé seguimiento al caso, ya que se pueden generar situaciones de riesgo a los ciudadanos y daños mayores sobre el sector.	VANTI GAS NATURAL	PENDIENTE
486	Para EAAB – Zona 4, en la calle 55 sur con carrera 17 se reitera solicitud para que la EAAB repare daño en una zona por intervenir de la UMV.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
487	Para EAAB – Zona 2, en la carrera 56 entre calle 5 y calle 5B, se presenta red de alcantarillado con obstrucción, se requiere apoyo sobre este tramo ya que la UMV realizará intervención.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
490	Para EAAB – Zona 3, evento SIRE 5419922, localizado en la calle 5C entre KR 70 y 70C, se presenta daño en calzada por posible daño en redes que genera lavado de finos.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
492	Para la EAAB-Zona 4, se solicita respuesta de los radicados E-2023-062631 y E-2023-076559, correspondiente a solicitud de NO objeción a los diseños cercanos al Canal Río Seco.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
497	Para IDU, solicitud de información para revisar el contrato en donde se realizó la intervención del espacio público en la calle 53 con carrera 25 en el sector de Galerías, en ese punto hay dos predios identificados con nomenclaturas 25-35 y 25-los cuales están presentando problemas de drenaje, ya que al parecer el IDU en su momento afectó las conexiones. Requieren apoyo por parte del IDU para obtener información de los contratos y así mismo de quien ejecutó la obra en su momento.	IDU	Acta 32: IDU informa al ingeniero Wilson Porras de la EAAB que copió el correo que envió el área ejecutora la cual indica que el contrato ya no lo tiene dicha área y se encuentra en póliza desde el mes de abril.
499	Para ENEL, en el sector de Zona rosa en un predio de la AV CRA 15 # 82 30 el cual presenta problemas de drenaje de Aguas residuales en donde al momento de realizar la inspección no se encontró la caja de conexión domiciliaria. En dicha inspección se encontró al parecer una cámara de ENEL la cual también funciona como caja de conexión domiciliaria de alcantarillado. Solicita conocer quién es el responsable de las redes y coordinar una visita para verificar si la caja está siendo utilizada con una doble función ya que está en riesgo la prestación de los servicios públicos.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
501	Para Movistar, se están realizando trabajos en el barrio San Luis en la localidad de Chapinero en donde se van a intervenir unas vías, pero hay infraestructura de Movistar, solicita coordinar una visita técnica para ejecutar la obra de manera efectiva y no afectar las redes de Movistar.	MOVISTAR	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
502	Para IDU, en el predio de la AV carrera 68 # 68B – 61 el cual pertenece al concesionario de Motoriza solicita por medio del contratista hacer la reubicación de una caja que hace parte del sistema de alcantarillado de dicho predio. Indica que en el año 2022 gracias a la verificación de Google Maps, se puede observar que la caja se encontraba ubicada dentro del andén pero que debido a obras de ampliación realizadas por IDU en la calzada oriental para el proyecto Avenida 68, este dejó la caja domiciliaria en la calzada. La caja no está hecha para soportar cargas de tráfico y por lo tanto debe estar ubicada sobre el andén.	IDU	PENDIENTE
506	Para UMV, solicita una reunión con UMV para tratar el reporte de un daño en calle 78C # 17 f - 47 vía al Mochuelo ya que hay un daño en la acometida de EAAB	UMV	PENDIENTE
508	Para ENEL, solicita información respecto a unas cámaras de Enel que no tienen tapas, requiere un correo de contacto para hacer la gestión.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
509	Para VANTI, en el contrato FDL RUU 281 de 2019, que compete a estudios y diseños para la construcción de malla vial, se requieren aprobaciones de los diseños, la única ESP que no se ha pronunciado es VANTI y se solicita su respuesta.	VANTI GAS NATURAL	PENDIENTE
510	Para ENEL Colombia SA ESP, en la Quebrada Yomasa se está presentando una socavación en área cercana a infraestructura de ENEL, y se requiere acercamiento con delegado de la empresa para efectuar visita y realizar las acciones pertinentes, por tanto, se solicita información de un profesional en ENEL para remitir la información correspondiente.	ENEL COLOMBIA	Acta 29: Intervención ENEL Colombia SA ESP – Pablo Ponce de León: Se informa que para el caso de la Quebrada Yomasa, se puede remitir la información al correo electrónico: pablo.poncedeleon@enel.com y de allí se enviará al jefe de zona - Leonardo Garcés, así como a Mauricio Arenas, para que se realice el debido seguimiento y atención.
511	Para EAAB, se está tramitando un certificado de viabilidad y disponibilidad del servicio para un salón comunal que se está construyendo en la localidad, radicado EAAB E-2023-1030279, se solicita respuesta al requerimiento y el contacto de un funcionario que pueda brindar información al respecto.	EAAB - Zona 4	El requerimiento referenciado ya cuenta con respuesta, se emitió el 14 de junio 2023, al señor Giovanni Rosso, el predio se localiza en la calle 42 sur N°. 72J- 25, Se remitirá por correo electrónico y ya están claras las instrucciones para hacer el trámite ante la EAAB.
513	Para ENEL, en el mismo parque Carbonero (TV 79 entre CL 81 y CL 71A Sur) se tiene una solicitud para ENEL respecto al traslado de dos postes que están ubicados en el eje de la vía, se requiere respuesta a la solicitud radicada, para ajustar cronograma.	ENEL COLOMBIA	Acta 34: Respuesta ENEL – Mauricio Arenas: Se solicita el número de radicado para darle seguimiento a la solicitud
516	Para VANTI, en el desarrollo de la consultoría del contrato FDL-E N°. 402 de 2022, se requirió un enlace con las empresas de servicios públicos para coordinar las actividades a ejecutar, el radicado con el cual se radicó la solicitud es el N°. 11248071 del 13 de septiembre de 2023, por lo cual se solicita respuesta al respecto.	VANTI GAS NATURAL	Respuesta VANTI – Mario Insuasty en acta 35: Se remite correo electrónico de contacto solicitando comunicación, y se informa que se revisará en el sistema interno de la compañía, para dar orientación frente al estado y respuesta de la comunicación.
517	Para ENEL Colombia SA ESP, en el desarrollo de la consultoría del contrato FDL-E N°. 402 de 2022, se requirió un enlace con las empresas de servicios públicos para coordinar las actividades a ejecutar, el radicado con el cual se radicó la solicitud es el N°. 000612718 del 13 de septiembre de 2023, por lo cual se solicita respuesta al respecto.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
518	Para EAAB – Zona 2, se solicita para el contrato de obra FDL-E N°. 396 de 2022 correspondiente a ejecución de parques, certificación de "paz y salvo" de la EAAB, toda vez que se encuentra en etapa de liquidación desde el 17 de abril. Los radicados de la solicitud son E-2023-038775 y E-2023-1053973.	EAAB - Zona 2	Acta 35 - Respuesta EAAB - Wilson Porras: Se informa que se revisará al interior de la EAAB con la persona encargada de Alcaldías Locales.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
520	Para la Alcaldía de Suba, respecto del contrato 541 de 2021, se señala que frente al predio calle 155 N°. 99A-42 se requiere traslado de poste, el contratista indicó que asumía los costos, no obstante, se solicita coordinar con apoyo a la supervisión del contrato.	Alcaldía Suba	Pendiente
521	Para Tigo, se reporta hueco en una cámara en la Av. Carrera 15 por Av. Calle 116, costado noroccidental. El contratista del IDU de los andenes de la AC 116 puso un maletín encima, pero lo van a quitar en estos días, por lo cual se requiere que se coloquen la respectiva tapa para evitar riesgo de siniestralidad.	TIGO	Pendiente
522	Para EAAB – Zona 1, se encuentran adelantando un contrato para el mantenimiento de parques, por lo cual realizaron diversas consultas a la ESP, para el caso de EAAB con el radicado E-2023-060273 del 22 de junio, a la fecha no se ha obtenido respuesta.	EAAB - Zona 1	Pendiente
523	Para ENEL Colombia SA ESP, se está adelantando la ejecución del contrato N°. 460 de 2023, se solicitó a la Ing. Luz Miriam Moreno el acompañamiento en un recorrido para ver unos segmentos viales en donde se presentan redes superficiales y unas cámaras llenas de basura. El contratista le envió correos haciendo el requerimiento, en uno se obtuvo respuesta por parte de ENEL requiriendo el número de los CIV. El correo ya fue contestado con la información requerida, pero a la fecha no se ha podido realizar la visita. Se solicita programar con urgencia el recorrido.	ENEL COLOMBIA	Se informa que el Ing. Oscar Fernando Escobar de ENEL hará el seguimiento correspondiente para direccionar la solicitud.
524	Para SDM, se solicita la colaboración de la SDM para dar respuesta a la radicación 202361204185062 del 15 de septiembre en donde se atienden observaciones realizadas de unos diseños de señalización.	SDM	Pendiente
526	Para SDA, se solicita dar cierre a los pines ambientales con radicado 2023ER163597 correspondiente al PIN 21093 y al radicado No. 2023ER163585 correspondiente al PIN 21639. Así mismo cierre a los pines 21789 y 22533.	SDA	Se informa que el delegado de SDA toma los datos para dar alcance a la solicitud ya que en el momento no tiene la información. Se le dará respuesta mediante correo electrónico.
527	Para SDG, reporta un inconveniente respecto al Consorcio Bolívar 05 quienes se encuentran realizando obras con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante el contrato N°. 337 de 2019. El ingeniero Nelson Arturo Ortiz ha venido haciendo el proceso desde el principio de año y se le informó cuales eran los pagos que debía hacer por daños y así tramitar el "paz y salvo" pero a la fecha no ha efectuado avances en el trámite.	SDG	Acta 36-2023: Respuesta SDG – Jaqueline Friede: Se remiten los datos de Mario Leandro Castro - Coordinador de infraestructura del Ciudad Bolívar para hacer la solicitud con copia a Jacqueline. mario.castro@gobiernobogota.gov.co - Celular: 3043820280.

#### **6.1 Balance Compromisos:**

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
-Casos presentados	365	100,00%	164	100,00%
-Casos resueltos al corte	275	75,34%	76	46,34%
-Casos pendientes al corte	90	24,66%	88	53,66%

#### 7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver siete (07) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 447, 467, 468, 480, 519, 525 y 529.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

# Icono Decisión Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

**Síntesis:** Se lograron resolver siete (07) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 447, 467, 468, 480, 519, 525 y 529, así mismo se presentaron avances en los casos de EAAB – Zona 4.



Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital

**Síntesis:** Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, especialmente EAAB-Zona 1.

#### **COMPROMISOS** 8

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 26-octubre de 2023
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 26-octubre de 2023
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (presencial).	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 26-octubre de 2023

#### **CONCLUSIONES**

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye la sesión número treinta y ocho (38) del Comité para la vigencia 2023, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: jueves, 26 de octubre de 2023 a las 8:30 am, de manera virtual.

En constancia se firman,

**PRESIDENTE** 

PAOLA ANDRÉA GÁMEZ TABIMBA SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba-SDP.

Anamaría Solano Monroy - SDP.

Álvaro Reinoso Guerra - IDU. Revisó:

1. Tablero de control - COISP - Corte Acta 38 de 2023. Anexo:

2. Atención SDM - Caso 529.

Subserie 2131-2.14




# Comité Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. - 2023

# Número de casos registrados por mes 200 150 100 50 8 19 10 10 101 Enero-2023 02. Febrero-2023 03. Marzo-2023 04. Abril-2023 04. Abril-2023 06. Junio-2023 08. Agosto-2023 09. Septiembre-2023 09. Septiembre-2023 Vigencia 2022




# Número de casos resueltos por mes

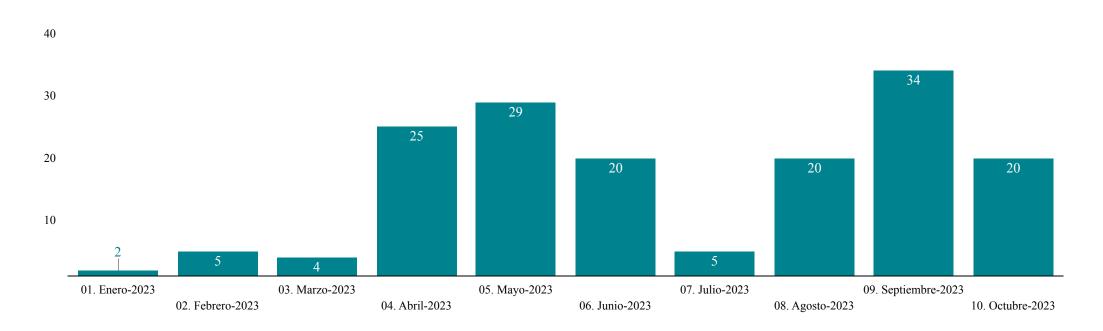




# Número de casos pendientes por mes

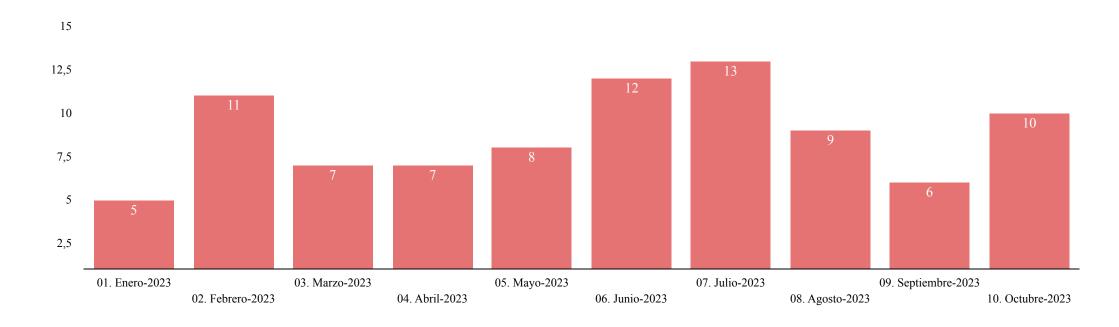



# Recuento de casos

N°. SESIÓN DE	N°. DE CA	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO
02 - Enero 26 de 2023	366	UMV	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a rea	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	369	IDU	Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero qu	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
02 - Enero 26 de 2023	368	MOVISTAR	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontr	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
02 - Enero 26 de 2023	367	MOVISTAR	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se pres	IDU	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de	372	SDG	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contr	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de	371	Alcaldía San Cristóbal	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de	373	EAAB - Zona 4	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliairia del predio car	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de	370	ENEL COLOMBIA	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA, SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyect	Entidades participantes en el Co	PENDIENTE
04- Febrero 09 de 2	374	UMV	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carrera	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05- Febrero 16 de 2	376	MOVISTAR	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos:	IDU	PENDIENTE
05- Febrero 16 de 2	375	UMV	Se reporta hundimeinto en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05- Febrero 16 de 2	377	Alcaldía Kennedy	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully	IDU	ATENDIDO
06- Febrero 23 de 2	380	VANTI GAS NATURAL	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón	IDU	PENDIENTE
06- Febrero 23 de 2	383	ETB	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Es	SDP	ATENDIDO
06- Febrero 23 de 2	382	ETB	Se reporta novedad en cámara de ETB con filtración de aguas negras en la Calle 20 No. 13 - 29 se deja registro en video por e	EAAB - Zona 3	ATENDIDO
6- Febrero 23 de 2	384	ETB	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	ATENDIDO

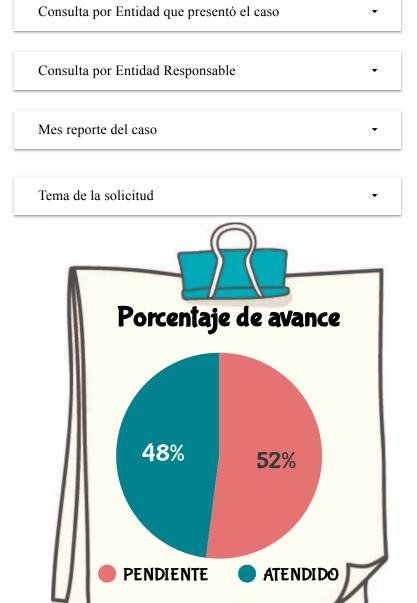

		ar .	
0	000	0000	ŀ
Te	9P - Entidades ma	ás casos asignados	
	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD ·	١
1.	ENEL COLOMBIA	61	١
2.	EAAB - Zona 2	35	١
3.	EAAB - Zona 1	29	
	Total	342	
T		1 - 32 / 32 〈	







# Casos:

# Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB


N°. de casos registrados

153


N°. de casos resueltos

77

# Número de casos registrados por mes

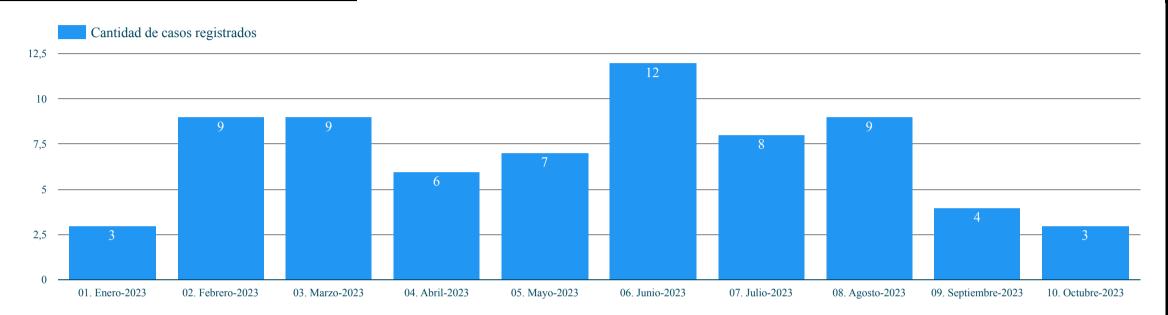

# Número de casos por zona o área pendientes

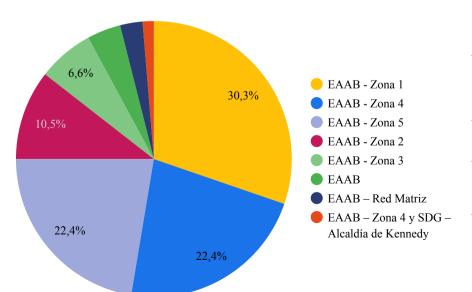

N°. DE CASO	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EABB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021)	PENDIENTE
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	ATENDIDO
29	Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021)	PENDIENTE
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	ATENDIDO
40	CILCIII COMPONE TO SEC	DENIDIENTE 1 100 / 152 /











# Secretaría Distrital de Ambiente

N°. de casos resueltos

1

# Número de casos registrados por mes

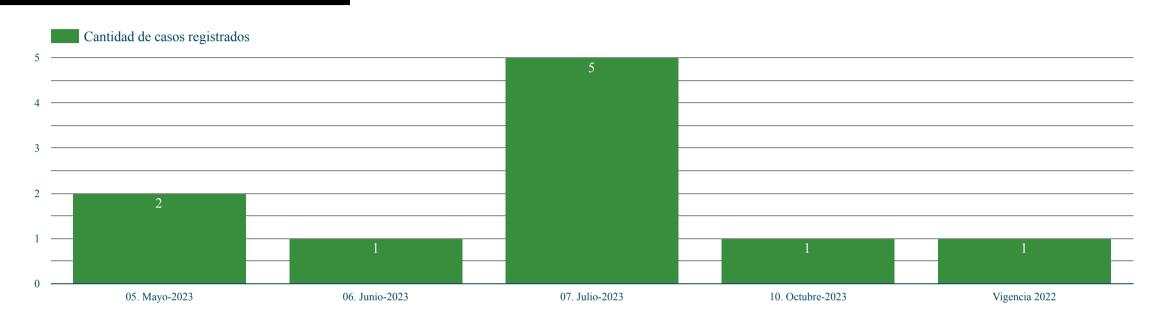

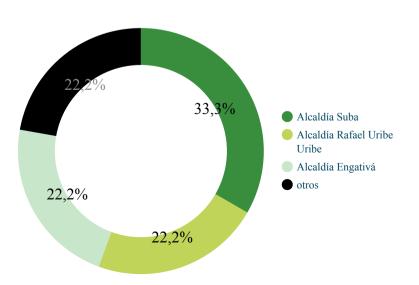

N°. DE CASO 🔺	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
94	En el tema de malla vial, se encuentra PENDIENTE resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – IX Sesión 2022)	PENDIENTE
428	Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.	PENDIENTE
429	Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.	PENDIENTE
443	Para SDA, frente al contrato FDL RU 281 de 2019, se realizó radicación N°. 2021ER143989, donde se programan y efectuan visitas con funcionario de la SDA, contratista e interventoría. De estos recorridos se solicita generar modificaciones, y nuevamente se radica a la Entidad con número 2022ER173992, no obstante, a la fecha	PENDIENTE
		1 - 10 / 10 <
		<b>A</b> *







# **Casos:** Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

4

# Número de casos registrados por mes

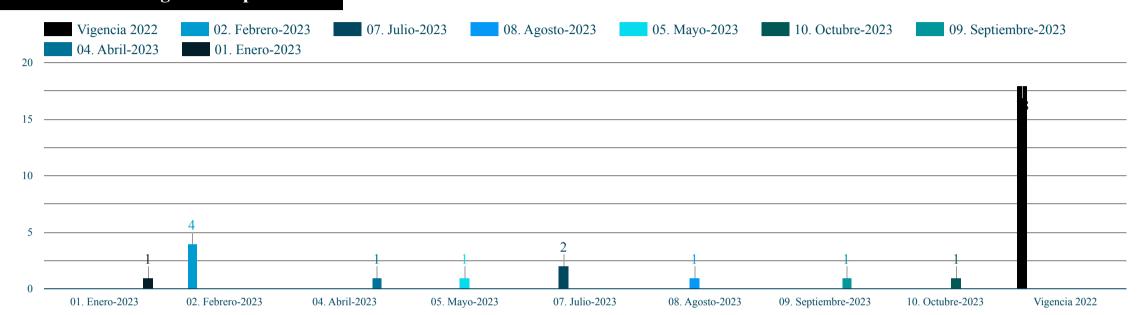

#### Número de casos pendientes por solicitante

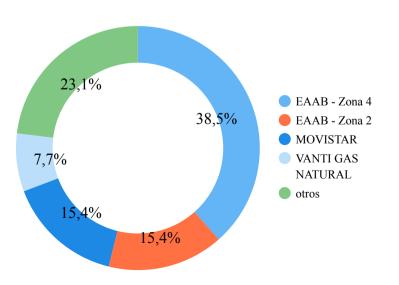



MES REP	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero- 2023	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	PENDIENTE
02. Febrero- 2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	PENDIENTE
02. Febrero- 2023	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, Cl26 con KR 69 y el tercer punto Cl 26 cerca a la Av Boyaca	PENDIENTE
02. Febrero- 2023	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado	PENDIENTE
		1 - 30 / 30



Umidad de Mantenimiento Vial - UMV

# Número de casos registrados por mes

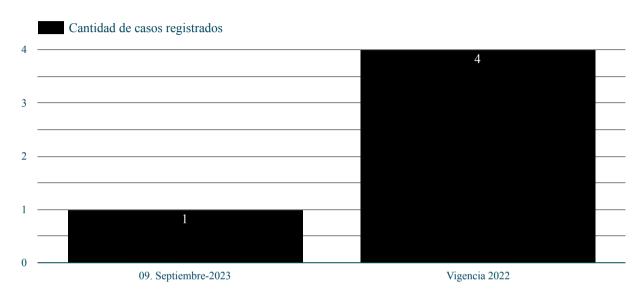

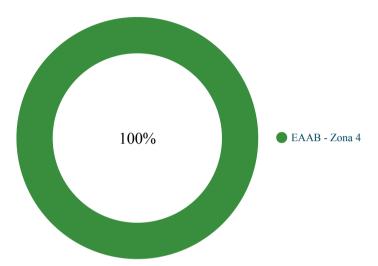

MES REPORTE DE CAS	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
09. Septiembre-2023	Para UMV, solicita una reunión con UMV para tratar el reporte de un daño en calle 78C # 17 f - 47 vía al Mochuelo ya que hay un daño en la acometida de EAAB	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para UMV, en la localización TV 19 con CL 44 sur y CL 47 sur, la calzada está bastante afectada ocasionando alto riesgo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para la UMV, para las intervenciones en el barrio "20 de julio", se requiere contacto del área de intervención, en aras de realizar proceso de coordinación al respecto de las obras adelantadas en este sector.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para UMV, se le consulta al Ing. Humberto frente a la intervención realizada en el barrio el Tuno – Calle 118 Bis Sur N°. 0-61, se reportó que la reserva del tramo corresponde a la UMV, por lo cual se requiere verificar si al efectuar labores de mantenimiento en carpeta de rodadura, se taparon dos pozos de alcantarillado, se requiere ingresar a los pozos para hacer mantenimiento a la red.	
Vigencia 2022	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	ATENDIDO




# Casos: Secretaría Distrital de Movilidad - SDM

N°. de casos registrados N°. de casos resueltos


16

15

# Número de casos registrados por mes

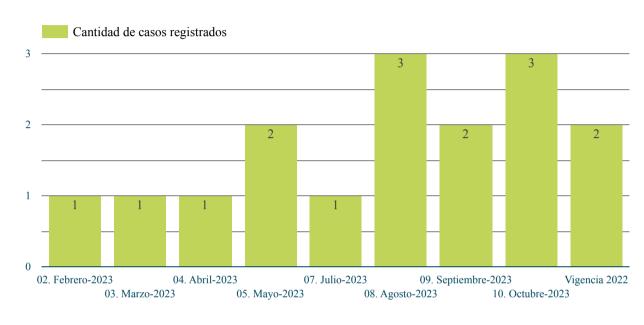

recursos para poderlo hacer.

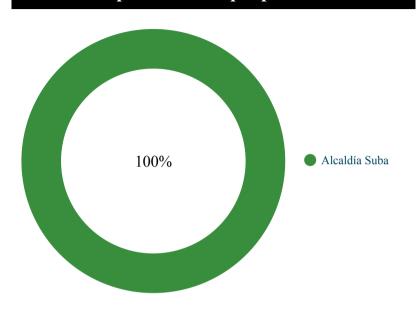



MES REPORTE DE CASO •	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	ATENDIDO
03. Marzo-2023	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	ATENDIDO
04. Abril-2023	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para SDM, respecto de la respuesta a solicitud de aprobación de PMT, se indica que en el mes de febrero se radicaron 76 puntos, en marzo 265 y en abril 150, para un total de 491 puntos pendientes, sobre los cuales no se ha recibido respuesta, es importante precisar que no nos han hecho observaciones, entonces queremos saber que ha pasado con la respuesta, ya que se cuenta con aprobación del IDU y pagos.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalizarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con	ATENDIDO



# **Casos:** ENEL Colombia ESP

# Número de casos registrados por mes

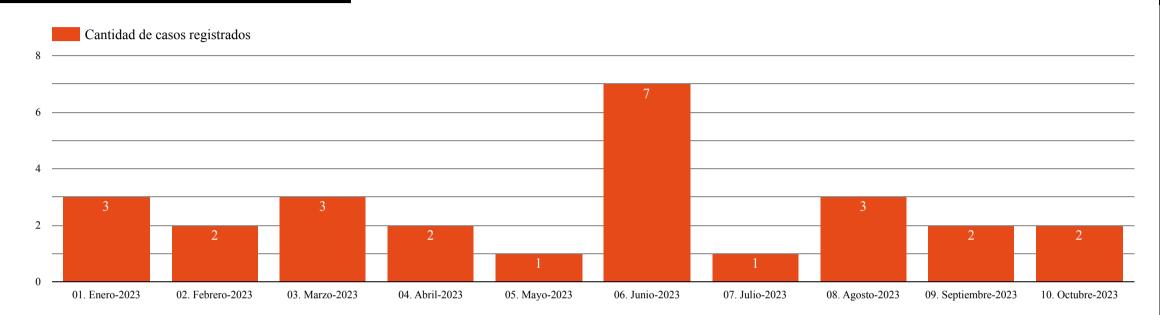


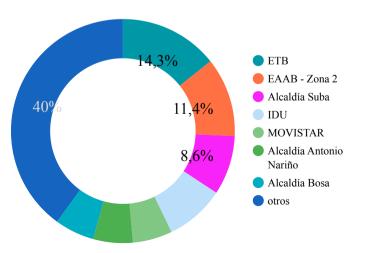


MES REPORT	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ATENDIDO
01. Enero-2023	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliairia del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	PENDIENTE
01. Enero-2023	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los incovenientes general soluciones y reactivar el contrato	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Solicitud para Enel, referente a un poste con riesgo de caída y obstrucción de acceso al predio de la Calle 25B No. 74 50	ATENDIDO
00 F 1	P. S. J. PART C. J. L	ATENDIDO



# Número de casos registrados por mes

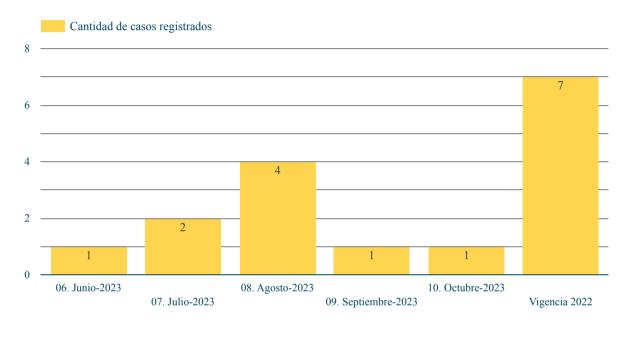



MES REPORTE DE CAS	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
06. Junio-2023	Para VANTI, con respecto a un CIV en Alameda en la CL 63 Bis Sur entre carrera 74 H y 74F, solicita coordinar una visita de acompañamiento para tratar temas especificos en el punto. La obra fue reportada por medio de un oficio via correo electrónico informando las intervenciones y ubicación al inicio del contrato.	ATENDIDO
	Por otro lado, se realiza requerimiento frente a cinco puntos más en donde se van a abrir nuevos frentes de obra y solicita coordinar aspectos con VANTI. Se enviará correo electrónico para programar las visitas respectivas.	
07. Julio-2023	Para VANTI, se tiene solicitud por parte de contratista S y S ingeniería, que termino contrato el 21 de mayo de 2023 con el FDL de Fontibón, ha solicitado certificación de "paz y salvo" y le han informado que no es posible emitir certificación de "paz y salvo" porque se tiene pendiente el pago de un daño, se ha solicitado factura, pero no se ha emitido respuesta.	ATENDIDO
07. Julio-2023	Se presenta requerimiento para VANTI, respecto al traslado de una red de polietileno de 1" en el sector de Gualoche que se instaló sobre la vía. Se han realizado visitas por parte de VANTI, pero se requiere consolidar el traslado de la red a un costado del andén, generando retrasos en el proceso constructivo.	PENDIENTE
08. Agosto-2023	Para VANTI, se tiene a cargo la supervisión de un contrato de obra pública, el número 410 de 2022, el cual compete a la construcción de malla vial y espacio público de la localidad, actualmente se tiene en ejecución un tramo en el barrio La Merced, se esta realizando conformación de vía, no obstante se evidenció que aproximadamente diez (10) casas del sector no cuentan con servicio de gas, por lo cual se generó comunicado con ESP, se efectuó recorrido con funcionario de VANTI, pero no se ha tenido	ATENDIDO






# Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB


13

N°. de casos resueltos

10

# Número de casos registrados por mes

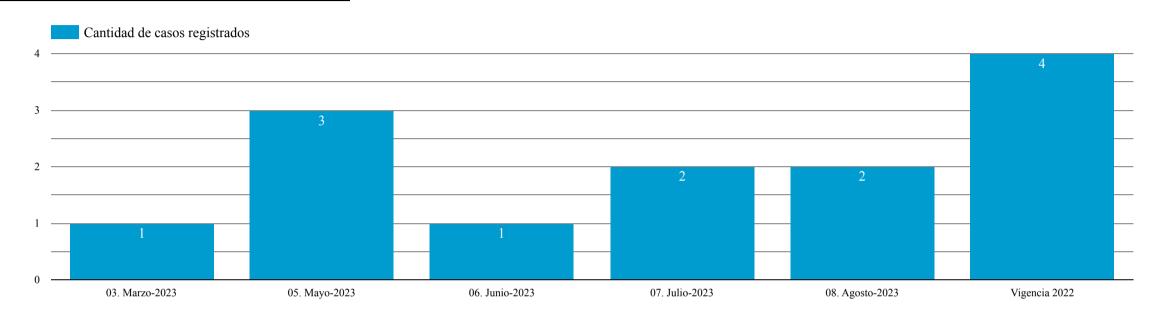

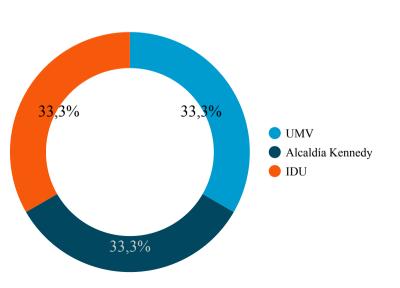

MES REPORT	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
03. Marzo-2023	Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renivelación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle.  Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal	ATENDIDO
		1 - 13 / 13





5

# Número de casos registrados por mes



# Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

MES REPORTE DE CAS	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
07. Julio-2023	Para Claro, se solicita respuesta a requerimiento de "paz y salvo" para contrato 396 de 2022 de INCITECO.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de "paz y salvo" de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopuente del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	ATENDIDO





# Número de casos registrados por mes



# Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

MES REPORTE DE CAS	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
07. Julio-2023	Para Claro, se solicita respuesta a requerimiento de "paz y salvo" para contrato 396 de 2022 de INCITECO.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de "paz y salvo" de CLARO para el contrato Nº. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopuente del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	ATENDIDO



Casos:
Alcaldías locales

Número de casos pendientes por mes a cargo de Alcaldías locales


ENTIDAD RESPONSABLE RESPUESTA


MES REPORTE DE CASO

¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?

ESTADO DEL CASO

# Número de casos presentados por mes por Alcaldías locales

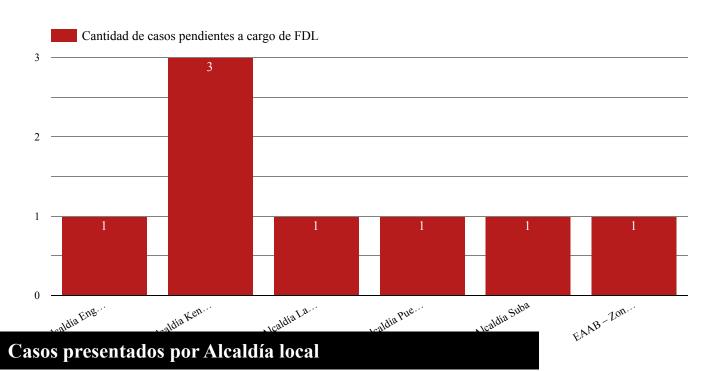

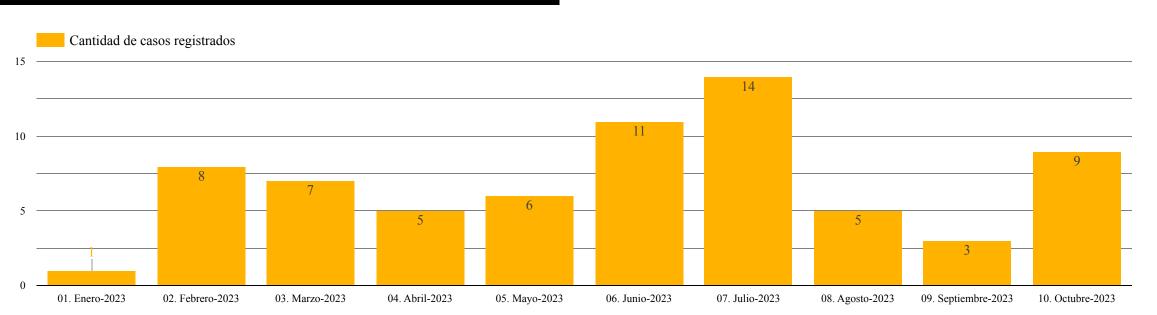

#### Cantidad de casos Alcaldía Bosa Alcaldía Tunjuelito Alcaldía Sumapaz Alcaldía Barrios Unidos Alcaldía Engativá Alcaldía Fontibón Alcaldía Kennedy Alcaldía Puente Aranda Alcaldía Ciudad Bolivar Alcaldía Los Mártires Alcaldía Suba Alcaldía Rafael Uribe Uribe Alcaldía Chapinero Alcaldía Usme Alcaldía La Candelaria Alcaldía San Cristóbal Alcaldía Antonio Nariño Alcaldía Usaquén Alcaldía Santa Fe Alcaldía Teusaquillo

# Registro de los casos

MES REPO	SOLICITUD	ENTIDAD	ESTADO DE
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero- 2023	Solicitud para Enel, referente a un poste con riesgo de caída y obstrucción de acceso al predio de la Calle 25B No. 74 50	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero- 2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	IDU	ATENDIDO
02. Febrero- 2023	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
02. Febrero- 2023	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE



137

N°. de casos resueltos

N°. de casos pendientes

N°. de casos registrados

75

62



1 mensaje

#### Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

#### Fwd: Solicitud información PMTS Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño

Martha Helena Silva Morales <mhsilva@movilidadbogota.gov.co>

17 de octubre de 2023, 12:16

Para: Jacqueline Friede Villa Roel <Jacqueline.Villa@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Martha Cecilia Bayona Gomez <mbayona@movilidadbogota.gov.co>, Alvaro Enrique Reinoso Guerra <alvaro.reinoso@idu.gov.co>, Paola Andrea Gamez Tabimba pgamez@sdp.gov.co>

#### Buen día:

En atención a los compromisos adquiridos en el comité de obras de servicios públicos, de manera atenta se remite información solicitada:

RADICADO	DIRECCIÓN	ESTADO
202361204405162	KR 19 ENTRE CL 4 SUR Y CL 10B SUR	PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ATIENDA OBSERVACIONES REMITIDAS EL 13-OCT-23
202361204406982	CL 15 SUR ENTRE KR 24 Y KR 22	PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ATIENDA OBSERVACIONES REMITIDAS EL 12-OCT-23
202361204411132	TV 24I 30m AL SUR DE LA CL 15 SUR - TV 24I 30m AL NORTE DE LA CL 15 SUR	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE ANÁLISIS DE TRÁNSITO.

Quedo atenta a cualquier inquietud al respecto,

----- Forwarded message -----

De: Jacqueline Friede Villa Roel < Jacqueline. Villa@gobiernobogota.gov.co>

Date: jue, 12 oct 2023 a la(s) 12:11

Subject: Solicitud información PMTS Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño

To: Martha Helena Silva Morales <mhsilva@movilidadbogota.gov.co>

Buenos días; De conformidad con la solicitud realizada en el comité del día de hoy, te adjunto la relación de los PMTs radicados en la SDM del contrato 170 de 2022 del FDL de Antonio Nariño.

	CONTRATO 170 DE 2020 CONSORCIO INNFRA DISTRITO					
PMT	CIV	Tramo	Desde	Hasta	# de Radicado SDM	Fecha de Radicación SDM
2	15000400 15000446 15000492 15000538 15000570 15000624 15000679	ANDENES KR 19	CL 4 SUR	10B SUR	202361204405162	9/08/2023
10	15000842	CL 15 SUR	KR 24	KR 22	202361204406982	5/08/2023
14	15000468- 15000388	CL. 15 SUR TV. 24	TV 24I ENTRE 30m AL SUR DE LA CL 15 SUR	30 m AL NORTE DE LA CL 15 SUR	202361204411132	3/10/2023

Cordial Saludo,

#### JACQUELINE FRIEDE VILLAROEL





# Jacqueline Friede Villa Roel CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Tel: (571) 3820660 - 3387000 www.gobiernobogota.gov.co





No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Cordialmente,





#### **MARTHA HELENA SILVA MORALES**

Contratista
Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
Secretaría Distrital de Movilidad
Tel: (+571) 364 9400 Ext. 7200

Carrera 28A No 17A-20
