

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 34 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 15 de septiembre de 2022

HORA: 8:30 am a 9:27 am.

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO		X	
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Cesar Augusto Quintero	Profesional ETB	ETB		X	
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Jorge Alberto Giraldo Botero	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Emma Viviana Bermúdez Garzón	FDL Bosa	Alcaldía de Bosa	X		
Frank Cuadros	FDL Fontibón	Alcaldía de Fontibón	X		

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Edwin Mauricio Alfonso Maldonado	FDL Kennedy	Alcaldía de Kennedy	X		
Rosa Gómez	FDL Bosa	Alcaldía de Bosa	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (33 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

Se abre la sesión número **34** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

Así mismo, se señala que para esta sesión se tienen invitadas las Alcaldías de Bosa, Kennedy y Fontibón.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

Se coordina con Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, el orden de intervención de las Alcaldías Locales, se realiza presentación e inicia su intervención la Alcaldía de Bosa:

3.1 ALCALDÍA DE BOSA – Emma Bermúdez:

Se indica que se está ejecutando la construcción de 12 parques, que fueron contratados con la entrega de los estudios y diseños del contrato 225 de 2018.

Actualmente, uno de los constructores tiene en intervención 3 de los 12 parques, y se espera que para el 2023 se realice la ejecución de otros 4.

Se observó que la validación de ENEL COLOMBIA frente a los diseños tiene una vigencia de 2 años, por tanto, en este momento se encuentran vencidos los diseños eléctricos.

El profesional Fernando Soler ha prestado apoyo al Fondo de Desarrollo Local de Bosa, pero no se ha podido avanzar al respecto con el proceso de revalidación, a la fecha no se tiene claro el alcance de ENEL y la UAESP. ¿Cuál es el alcance y pasos a seguir? **(Caso nuevo)**.

Responde ENEL COLOMBIA – Pablo Ponce:

La UAESP tiene el papel de aprobar el diseño fotométrico de los parques o vías, ellos tienen responsabilidad con este tema y este es el primer paso en el proceso de revalidación. Se precisa que por parte de ENEL COLOMBIA se desconoce la duración del trámite en UAESP.

Cuando se realiza la validación o se aprueba el diseño fotométrico por UAESP, se presenta a ENEL para la aprobación del diseño eléctrico, que responde a localización de la alimentación del alumbrado y a la potencia requerida.

Así mismo, se señala que ENEL es contratista del Distrito, para este caso se presta un servicio a la UAESP referente a la validación del diseño eléctrico, de igual manera se aclara que si ya surtió aprobación previa, la revalidación no va a cambiar.

Depende el tipo de proyecto, Pablo realizará la consulta al interior de ENEL. Si el diseño del parque no cambia, puede continuar la aprobación.

Finalmente, el Ing. Pablo remite correo electrónico para que se remitan antecedentes desde el Fondo de Desarrollo Local.

3.2 ALCALDÍA DE BOSA – Juan Vargas:

Respecto a los contratos en malla vial, para el contrato 336 de 2022, se solicita recorrido con las Empresas de Servicios Públicos para revisión y atención de proceso constructivo de las redes secas y húmedas, ya que el proyecto está próximo a iniciar etapa de ejecución.

Se manifiesta que se ha realizado invitación por correo electrónico.

Por parte de las Empresas de Servicios Públicos, se requiere que se realice invitación formal para efectuar delegación de personal y programación de actividades, así mismo, precisar cuáles son los temas a tratar.

3.3 ALCALDÍA DE KENNEDY – Mauricio Alfonso: (Caso nuevo)

Indica que tiene varios proyectos que se encuentran en etapa de formulación, para esta oportunidad tiene una solicitud frente al proyecto que viene desarrollando la Alcaldía de mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares, donde se requirió información frente a intervenciones que se estén realizando o se vayan a ejecutar en el canal Tintal II a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – Zona 5, y a la fecha no ha recibido respuesta.

La solicitud fue efectuada con radicado FDLK - 20225822501741 y radicado EAAB E-2022-068907.

Responde EAAB – Zona 5 – Javier Patiño:

Desde la zona 5, se realizan respuestas a redes menores, para el caso de canal Tintal II, que hace parte de las obras de Red Troncal (Sistema Maestro), se debe elevar la solicitud a Red Troncal y Gerencia Ambiental para que ellos respondan desde su competencia al respecto.

Así mismo, en consulta interna se responde que en este momento no existe canal, existe un Box Couvert, y que las intervenciones sobre esta área o aledañas deben coordinarse con el área de Gerencia Ambiental.

Finalmente, el Ing. Javier realizará revisión en detalle con el área encargada en la EAAB, por lo cual se pondrá en contacto con el profesional Mauricio para revisar el tema.

3.4 ALCALDÍA DE FONTIBÓN – Frank Jamir Cuadros:

- Se efectúa solicitud puntual frente a contrato 313 de 2021, donde se ha requerido a VANTI certificado de “Paz y Salvo”, con radicado VANTI 01522CR0011574. **(Caso nuevo)**.
- Se realiza reporte de la Calle 22D Bis A con carrera 111A, donde se observa poste inclinado sobre andén en concreto el cual esta fracturado, se solicita atención por parte de Empresas de Servicios Públicos para que sea atendido **(Caso nuevo)**.



Responde VANTI – Jorge Giraldo:

Se comparte correo de contacto del delegado de VANTI y se adelantará gestión pertinente frente a contrato 313 de 2021.

4 LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (33 de 2022)

La Ingeniera Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número 33 del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha 8 de septiembre de 2022, ante la cual, se presentan observaciones por parte de la Ingeniera Onisalba para incluir información de los casos pendientes en el acta N°. 29.

También se menciona, que el acta N°. **30 y 31** de 2022, ya están publicadas en la página Web de la SDP, así mismo, que el acta N°. **32** está en proceso de firma, para dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 IDU – Álvaro Reinoso:

Se reporta hundimiento de pozo, que actualmente se encuentra afectando la calzada y movilidad frente al predio KR 6H Este CL 114-42 Sur.

Ilustración 2 Reporte de daño en calzada por afectación de pozo - KR 6H con CL 114 Sur



Así mismo, se indica que desde el IDU se realizó verificación de cada uno de los casos que se tienen reportados en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos, generando el siguiente balance:

- **Caso 43:** El oficio se generó por parte del IDU, pero no llegó al correo correspondiente, se volverá a remitir a la dirección electrónica correcta.
- **Caso 44:** Se efectuaron campañas al interior del IDU, para que la correspondencia hacia ETB llegué a los correos oficiales dispuestos por esta ESP. **(Resuelto)**
- **Caso 73:** Se presenta intervención en la KR 73 con CL 70, la cual correspondió a una intervención de EAAB y a la fecha se encuentra finalizada. **(Resuelto)**
- **Caso 86:** Se realiza citación a Secretaría Distrital del Hábitat y Empresa de Renovación Urbana. **(Resuelto).**
- **Caso 106:** Se revisó y corresponde al Contrato IDU 113, se solicitó renivelación de pozo.
- **Caso 107:** **(Resuelto).**

5.2 IDU – Onisalva Segura de Arbeláez:

Se revisan los temas que se tenían pendiente para el acta 29:

- **Caso 5:** Se debe coordinar con Gina Urresta si se puede cerrar el caso, queda a cargo del Ing. Juan Carlos reunirse con Gina Urresta.
- **Caso 166:** El Ing. Juan Carlos tiene a cargo realizar averiguación.
- **Caso 187:** **(Resuelto).**
- **Caso 225:** Mantenimiento a las estructuras de sumideros en el tramo de la Av. Boyacá, y Av. Américas, el Ing. Javier indicó que se iba a revisar el tema, se obtuvo respuesta de Zona 4 y Zona 5, esta semana el IDU estará remitiendo respuesta del alcance de intervención y puntos precisos que se requieren sean atendidos por EAAB.

5.3 EAAB – Nubia Riaño Abril:

- **Caso nuevo:** Se requiere a la ETB verificación en la CL 29 sur - KR 9 Este y CL 29 sur - KR 7 Este, para realizar traslado de redes. Se informó a ETB y se asignó delegado. Queda pendiente indicar el contrato de obra, Nubia remite información de contacto para comunicarse con Rocío López.

Responde ETB – Rocío López: Si se informó a ETB de las obras. No obstante, se requiere el número de contrato para dar continuidad a las actividades de traslado.

5.4 EAAB Zona 2 – Wilson Javier Porras:

Se revisaron los casos que corresponden a EAAB – Zona 2, estableciendo que:

- **Caso 30:** Para la Calle 67 No 4A-67, se reparó filtración, se requiere revisión de parte de ETB.
- **Caso 71 y 81:** Se reporta interferencia de redes, se informa que no se pudo coordinar con el contratista de ENEL, se requiere retomar el tema, para que por favor se remita contacto del personal operativo para organizar actividades.
- **Caso 42:** Se solicitó traslado de redes, pero no se tiene referenciada la dirección, se requiere a ENEL Colombia para que realice claridad al respecto.

- **Caso nuevo:** Se requiere apoyo de la UMV o Alcaldía Local para realizar reparación a nivel de carpeta asfáltica frente al predio KR 9 N°. 62A-06, ya que se efectuó atención a red domiciliaria que presentaba daños.
- **Caso nuevo:** Se requiere apoyo para realizar mantenimiento de la vía CL 23A con KR 59 antes de realizar demarcación, actualmente SDM tiene un contrato de señalización horizontal y vertical, y se está ejecutando sobre vías deterioradas. Lo anterior, para que la demarcación tenga funcionalidad y durabilidad.

Responde UMV - Humberto Ramírez:

Se solicita al Ing. Wilson Porras remitir fotos de la reparación de la KR 9 #62A-06.

Responde SDM - Martha Helena Silva:

Se solicita remitir información de la vía CL 23A con KR 59, para realizar contacto con Mario Carbonell, en aras de revisar estado del tramo.

5.5 ENEL Colombia – Pablo Ponce de León:

Desde la Subgerencia de PM&C de ENEL Colombia, se requiere:

- **Caso nuevo:** Se requiere desde Zona 2 – EAAB, prestar apoyo en queja de la señora María Rozo Jurado, para que se realice visita con José de Jesús Vergara – supervisor de Zona. Se remite celular de contacto del señor José de Jesús.
- **Caso 256:** Se realizó contacto con la división de seguridad frente a acciones con telemáticos y terceros, el jefe de la división Fernando Murcia, indica que se han realizado reuniones con Claro, Movistar. Etc., a través de curso virtual para que llegué a los trabajadores, de igual manera se abre espacio para realizar formaciones presenciales.
Así mismo, se precisa que se han elaborado procedimientos para reportar casos de infraestructura sub estándar y emergencia, se encuentra infraestructura en casos sub estándar, en los procesos de normalización y se tiene filosofía de mejorar condiciones de seguridad, ya que para ENEL priman las condiciones de seguridad, por tanto, también se invita a recibir formación en seguridad desde varios institutos como el SENA.
Así las cosas, ENEL Colombia está dispuesto a retomar charlas presenciales. Se coordinará el espacio para tratar temas de seguridad desde el punto de vista eléctrico.
- Se indica a ETB que no se ha recibido respuesta de los casos pendientes.

Responde EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:

Se organiza visita conjunta, para revisar cámaras y puntos de filtración en el predio de la señora María Rozo Jurado.

5.6 SDM – Martha Silva:

Se revisaron casos que se tienen reportados en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos, generando el siguiente balance:

- **Caso 217:** El caso expuesto ya cuenta con PMT por emergencia, fue autorizado el día 14 de septiembre, si se requiere más tiempo se recomienda realizar trámite por PMT regular, así mismo se clara que el tiempo tomado para resolver este caso no corresponde a retrasos por parte de SDM. **(Resuelto).**

Se establece que SDM no tiene casos pendientes por resolver en el Comité.

5.7 EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:

- **Caso 129:** Se realizó visita en la calle 159 N°. 10-67, el día 27 de julio de 2022, se observaron filtraciones en cámara de ENEL, a la fecha fue atendida la reparación, se espera validación por parte de ENEL Colombia.

5.8 VANTI – Mario Alejandro Insuasty:

- **Caso nuevo:** Se solicita al Ing. Pablo, el acta de coordinación para el proyecto de intervención PTAR Salitre, se solicita contacto para realizar validación.

Responde ENEL Colombia – Pablo Ponce de León:

Se remite contacto, por tanto, queda atendido el caso por parte de ENEL durante el Comité. **(Resuelto).**

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 33 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado a chat esta semana (2021)	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE Se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar. Comité XXX: El Ing. Juan Carlos López de la Zona 4 de la EAAB, que por la información de Gina Urresta, ya quedó intervenido. Se debe coordinar con Gina Urresta si se puede cerrar el caso, queda a cargo del Ing. Juan Carlos reunirse con Gina Urresta.
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; ¿adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EAAB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021)	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
14	En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo. (2021)	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (2021)	EAAB - Zona 1	Oscar Moreno	Informa EAAB que se drenaron por acumulación de aguas lluvias. Debe revisarse información de Contratista.
22	Para ENEL COLOMBIA en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de ENEL COLOMBIA que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara. (2021)	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	Está en revisión por ENEL COLOMBIA.
23	Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la KR 4 entre CI 12 y CI 10 ya que son con especificación antigua. (2021)	Alcaldía La Candelaria	Delegados	Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
25	Para ENEL COLOMBIA en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB - 2021)	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	Debe hacerse un cárcamo de protección en la canalización.
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	En cuanto a zona 2-EAAB, ya fue atendido; se tiene pendiente visita con el Ing. Javier Patiño de la EAAB – Zona 5.
29	Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021)	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	Se traslada a la EAAB – Zona 2 para su atención.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por CLARO S. A. – I Sesión 2022)	IDU CODENSA	Delegados	PENDIENTE
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	Debe enviarse registro fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por UMV – II Sesión 2022)	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE
40	Caso IDU , de la calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, donde DELTEC, informó que no se hizo intervención alguna; debe revisarse si fue una intervención anterior y si se hace una visita, ya que se trata de redes eléctricas. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	Pablo Ponce se compromete a escalar el caso al interior de CODENSA, en la zona respectiva. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso ETB , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste; apoyo en este tema. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE Se solicitó traslado de redes, pero no se tiene referenciada la dirección, se requiere a ENEL Colombia para que realice claridad al respecto.
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, donde ya se hizo la solicitud a CODENSA y se respondió que se cobraba por el traslado del poste, pero no ha salido el recibo y sigue estancado el tema; la dirección es Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por EAAB – II Sesión 2022)	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
48	Paz y salvo de ENEL COLOMBIA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022)	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	A la fecha no se tiene el paz y salvo.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL COLOMBIA, cobra Veintidós millones de pesos por hacer ese traslado, por lo que solicita un contacto de CODENSA. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022)	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022)	EDELCOLOMBIA	Pablo Ponce de León	Se tienen avances pero pendiente finalización de caso. Se requiere agilizar trámite de paz y salvo, que fue radicado por el contratista Consocio Vial Usme 2019, el día 4 de abril con radicado EDELCOLOMBIA 00261344, se expresa que este es el último paz y salvo requerido para liquidar contrato de obra. A la fecha no se tiene respuesta por parte de EDELCOLOMBIA.
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022)	ETB	Carmen Rocío López	Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022)	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	No se ha tenido respuesta.
53	Devolución de documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por Alcaldía Tunjuelito – III Sesión 2022)	EDELCOLOMBIA	Pablo Ponce de León	Se está a la espera del permiso de CODENSA para la reiniciación de dicho parque.
54	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste por parte de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU - EAAB – III Sesión 2022)	EDELCOLOMBIA	Pablo Ponce de León	Pendiente de validación final del caso.
56	En la Avenida de la Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se han venido desarrollando unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla, para señalar e indicar a qué corresponde la obra; también por el tema comunitario. (Presentado por UMV – III Sesión 2022)	Entidades Participantes en el Comité	Delegados	Se instaló una poli sombra, como medida temporal.
59	Menciona un caso para EAAB: Se vienen adelantando unas obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, ya que se hizo un radicado hace 20 días. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022)	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE. Se enviará Radicado FDL Bosa. El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales - Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022)	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE. Se enviará Radicado FDL Bosa. La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022)	EDELCOLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE. Se enviará Radicado FDL Kennedy. La red eléctrica del salón California está pendiente.
62	Se ha identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por CLARO – IV Sesión 2022)	Alcaldía Kennedy	Delegados	PENDIENTE
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de agua. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022)	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	UMV	Humberto Ramírez Gómez	PENDIENTE Debe revisarse por parte de la EAAB zona 5, si se hizo con las especificaciones para cerrar el caso.

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE
71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc, estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE Pendiente una visita con ENEL Colombia (CODENSA). Se reportó interferencia de redes, se informa que no se pudo coordinar con el contratista de ENEL, se requiere retomar el tema, para que por favor se remita contacto del personal operativo para organizar actividades.
76	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60 (C caso 57), se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por UMV – V Sesión 2022)	EAAB - Zona 1	Humberto Madrid	PENDIENTE. Debe enviarse el resultado de la Topografía.
80	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A - 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por IDU – VI Sesión 2022)	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE. Se hizo comunicación con el jefe de la zona, para atender el caso. Ya está en programación de maniobras.
83	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunto del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	CLARO	José Ricardo Velasco	PENDIENTE. Se envió información por correo. Debe enviarse información solicitada por CLARO.
85	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022)	EAAB – Red Matriz	Delegado	Se comunicará con la Arq. Carmen Rocío López de la ETB.
89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022)	UAESP	Delegado	PENDIENTE
92	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por ETB – VIII Sesión 2022)	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE Se tiene prevista la visita para el 10 de junio
93	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022)	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
94	En el tema de malla vial, Pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – IX Sesión 2022)	SDA	Delegado	PENDIENTE
98	Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el "paz y salvo" respectivo. (Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022)	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE. Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA
103	Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022)	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE.

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
106	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato de IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022)	IDU	Álvaro Reinoso Onisalba Segura	PENDIENTE. ya se entregó la información respectiva sobre el contratista para que se haga la gestión. Se revisó y corresponde al Contrato IDU 113, se solicitó renovación de pozo.
110	Se han realizado coordinaciones por traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA) CLARO	Delegados	PENDIENTE. Ya se envió la información por parte de MOVISTAR y CLARO.
113	Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDRD y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	EAAB - Zona 2 ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Delegados	PENDIENTE
114	Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por IDU – XI Sesión 2022)	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE.
115	Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022)	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
119	Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por IDU – XII Sesión 2022)	Entidades Participantes en el Comité	Delegados	PENDIENTE. El IDU enviará oficio solicitando la delegación.
121	Se tienen muchos parques en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDRD, pero se requiere articular con la EAAB y la SDA, para revisar la posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022)	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE. Debe articularse con red troncal EAAB.
124	Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorías y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022)	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE.
128	Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas. (Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022)	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE
129	Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua y está saliendo bastante agua, cayendo acho entro de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XII Sesión 2022)	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE Se realizó visita en la calle 159 N°. 10-67, el día 27 de julio de 2022, se observaron filtraciones en cámara de ENEL, a la fecha fue atendida la reparación, se espera validación por parte de ENEL Colombia.
131	Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE.

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
133	Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servicio; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio.	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE
134	Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP.	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE
135	La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido.	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE
141	Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
142	Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE Se radicará la solicitud de manera formal.
143	Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE Radicados números 1001904837 y el 1001905014
144	Durante la ejecución del Contrato 244 de 2017, de conservación de malla vial, en el barrio Santa Cecilia, se intervinieron 2 segmentos viales, los cuales cuentan con un problema en la red sanitaria para la evacuación de aguas negras; con colmatación en las domiciliarias y los residuos no llegan al colector principal; por esta situación, se hizo solicitud de inspección a la EAAB y se informó que se iba a adelantar dicha inspección en febrero de este año; ya se hizo la inspección, pero a la fecha la EAAB, no ha presentado el informe técnico oficial como insumo para requerir al contratista o requerir por medio de las pólizas por estabilidad de la obra.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE Alcaldía de Engativá enviará información al correo.
152	Se tienen varios segmentos viales que están pendientes de subterranización de redes secas; por lo cual en días pasados se envió una comunicación a ENEL COLOMBIA (CODENSA), donde se indagaba sobre el estado de dicha subterranización y/o la programación para la intervención. Se menciona por parte de Francisco Granados que el radicado es el 00274087 del 26 de abril de 2022.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
153	Se solicita la respuesta sobre una solicitud que se hizo referente a la actualización de reservas; para poder adelantar un proceso de conservación. Se menciona por parte de Francisco Gradados del FDL Suba, que el radicado ante el IDU, es el 2022-526074-1582.	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE
155	Llegó una comunicación del contrato 1723 de 2021; y la remite el contratista y está solicitando un acompañamiento para levantar Tapas y hacer un recorrido; es un contrato de diseño para hacer obras de pavimento; por lo que requiere hacer levantamiento de las tapas para ver si están funcionando; pero no se ha enviado un oficio del IDU y no contestan el teléfono de contacto incluido en la mencionada comunicación, ni dan respuesta a un correo electrónico enviado.	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE
156	Sobre el contrato 1746 de 2021, que corresponde al área del Ing. Oscar Roberto Acevedo; en la calle 13 Sur con carrera 12 al Este; no se tiene designación de ese contrato por lo cual se requiere coordinar con el Ing. Francisco Higua; pero no ha sido posible contactarlo; en dicho contrato se plantea la recuperación de espacio público.	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE
159	Se envió un correo el día 6 de mayo de 2022, donde se solicita la información del contratista que adelanta trabajos en la transversal 68 D por calle 44 Sur en el barrio San Andrés; para requerir la reparación de una cámara afectada, pero no se ha recibido respuesta; por lo que se solicita la colaboración del Ing. Patino de la Zona 5 de la EAAB, ya que se requiere esta información con urgencia.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
161	Situación con el Contrato 101-35100-1458 de 2019, suscrito con la firma Consorcio Alcantarillado Kennedy, el cual se encuentra en proceso de siniestro por parte de la EAAB, pues pasaron más de 20 meses y su ejecución fue muy baja; por lo que se adelantará una reclamación. Con éste Contrato se buscaba intervenir unos sectores con rehabilitación de alcantarillado, pero quedaron unos frentes abandonados y la EAAB está adelantando un plan de choque para disminuir la afectación a la comunidad y la emergencia sanitaria por devolución de aguas; por lo que también la EAAB tiene un contrato para adelantar ciertos tramos pero no todos; por lo cual se pregunta a ala UMV si es posible hacer un trabajo conjunto en algunos frentes de los sectores intervenidos y que ya estaban casi listos solamente quedando pendiente la estructura vial.	UMV	Humberto Ramírez Gómez	PENDIENTE Debe enviarse listado de tramos a intervenir.
164	Solicitud sobre el tema del alumbrado del parque de Santa Isabel y se está culminando una obra de adecuación de un espacio y carece de iluminación adecuada; está ubicado en la carrera 29 con calle 12 A Sur. Así mismo se solicita la poda de césped de un parque que está en condiciones complejas de crecimiento de césped, ubicado en la calle 1 con carrera 22 que es un triángulo.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
166	Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la EAAB llevó a cabo la renovación de la tubería entre la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la EAAB llevó a cabo la renovación de la tubería en la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU. Se solicita dar la respuesta, o si es posible un contacto de la EAAB para adelantar esta gestión. El Ing. Juan Carlos López de la Zona 4 – EAAB, hará las averiguaciones respectivas e informará en el Comité.
171	Se tiene filtración de agua potable en la Subestación Usme, ubicada en la Diagonal 68 A Sur número 14 L - 29, se está llenando de agua el sótano y los cables de media tensión; por lo que se solicita una visita al sitio para coordinar el equipo técnico de ENEL COLOMBIA y revisar el caso.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE
172	Fue colocado esta mañana en el Chat; ya que se necesita el ingreso a predio Tequendama que queda en Soacha, para la corrección de un punto caliente en la línea de alta tensión; por lo que se solicita la información de la dependencia se puede enviar un correo.	EAAB	Delegado	PENDIENTE

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
173	Se tiene un contrato de consultoría de estudios y diseños para 12 parques; de los cuales ya fueron aprobados los diseños hidráulicos de 7 parques, pero los otros 5 que son de la zona 3 de la EAAB, no se ha recibido la respuesta definitiva y están muy atrasados para poder finalizar ese proceso de consultoría. Por lo que se solicita cuadrar una mesa para tratar el tema.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
175	Se menciona que se tienen 3 contratos de vigencias anteriores, dentro de los cuales hay uno con una situación rotura en un andén de la transversal 72D con calle 69 sur, ocasionada por una intervención de la EAAB, la cual debe ser reparada.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE
176	Se tiene un trámite con ENEL COLOMBIA, para una factibilidad, sobre el cual ya se dio respuesta y se están atendiendo las observaciones; sin embargo, solicita la designación de un profesional para que apoye el proceso de factibilidad de servicio de energía en lo corregimientos de Betania y San Juan, para la adecuación de las sedes de la Alcaldía de Sumapaz.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
177	En el mes de enero se presentó una solicitud para visita para suministro de energía para todas las infraestructuras de la Alcaldía de Sumapaz, pero no ha sido posible avanzar en el tema; por lo que se busca el apoyo en el diseño de redes eléctricas y sacar la licitación respectiva; se ha estado en contacto con Patricia Garavito; con el número de solicitud, 00113394.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
178	Se tiene una cámara sin tapa en la carrera 27 con calle 5, donde hay un pozo de aparentemente de Acueducto que genera riesgo, para que se haga la verificación por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
179	Caso reportado por ETB, donde se hizo la validación y hay unas redes de MOVISTAR allí, pero también hay unas redes de energía, por lo que posiblemente sea una cámara de alumbrado público; por lo que solicita al Ing. Pablo Ponce, se verifique si es así (cámara de alumbrado público), en la avenida el dorado con carrera 18, en el deprimido delante de la Caracas, igualmente se envió al chat, esta información.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE
180	Se tiene una emergencia por una rotura en una red de acero de alta presión, en La Estancia en la carrera 75 con calle 58 A Sur; donde el personal de la EAAB rompió la tubería de acero de 4 pulgadas, pero se retiraron sin darle solución al tema; esta tubería maneja unas 200 libras de presión, por lo que solicita con quien se puede hablar para atender esta situación.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE
182	Se solicita una mesa de trabajo con respecto al contrato 142 de 2018, en particular para la revisión de los diseños de redes que ya se han entregado y así mismo, el trámite de paz y salvo, por lo cual se estará convocando próximamente dicha mesa de trabajo.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE
183	Caso de un hundimiento que se presenta en la calle 28B Bis Sur con carrera 2; se tiene entendido que la EAAB ya hizo una inspección visual, pero debe revisarse nuevamente, por lo que se manifestó que la EAAB hará una nueva inspección con cámara.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE
184	Caso en la Calle 9 A entre carreras 66 A y 67; en el barrio Salazar Gómez, donde en la UMV está adelantando unas obras y se requirió de emergencia, la limpieza de unas tuberías y se envió directamente al Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 – EAAB; quien colaboró con el tema y está pendiente el suministro de 2 rejillas para terminar el trabajo.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
185	En este momento se dio inicio al contrato de obra de construcción de parques y tuvo estudios y diseños en el 2018 y al hacerse una revisión de estos diseños por parte del especialista eléctrico, se notó que debía hacerse una actualización; por lo que solicita al delegado de CODENSA (ENEL COLOMBIA), su ayuda para esta revisión.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
186	Se tiene pendiente unos "paz y salvos" de la EAAB, para unos contratos que se acabaron de terminar; por lo que se aporta la información sobre el contrato 596 de 2020 con el radicado EAAB número radicado E-2022-047031.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	Ya está en proceso, a la espera de la firma del Ing. Jorge Barriga que regrese y se dé salida.
188	Caso en la carrera 10 entre calles 12 y 12 B en la localidad de la Candelaria, donde hay una cámara en mal estado caso, al parecer de la EAAB; con faltante de la tapa, es un caso que fue reportado por el IDIGER.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
189	Caso de una cámara de redes secas que estaba sin tapa en la calle 70 con carrera 77, y alguien le colocó una tapa de material no reciclable de la EAAB y como esta tapa no corresponde a la aerobase de la cámara, está prácticamente suelta y entonces puede sacarla un carro cuando pase; por lo que debe ser revisada por las empresas de redes secas; por lo que la Arq. Carmen Rocio López de la ETB, solicita la información para verificar.	ESP participantes en el Comité	Delegados	PENDIENTE Se informa que luego de una verificación en terreno, se identificó que dicha cámara no es propiedad de MOVISTAR.
190	En la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la calle 50 D entre carreras 12 B y 12 C; hay dos cámaras de la ETB, a las cuales se les colocaron unas tapas de la EAAB; las cuales deben retirarse, por lo que solicita a la ETB cuando se puede adelantar esta gestión.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE Se informa por parte de la ETB, que la cámara es de ENEL COLOMBIA (CODENSA), por lo tanto pasa a su revisión.
191	ENEL COLOMBIA (CODENSA) viene desarrollando desde hace un par de años, un proyecto sobre la carrera 16 entre las calles 34 y 42 en Teusaquillo; el cual se ha demorado mucho por los permisos (CAR; IDPC, Ministerio, entre otros) y por un proyecto IDU que también se desarrolla allí. El día de ayer se encontró otra situación y es que en uno de los tramos que está reservado por ellos, en la Diagonal 40 A Bis con la carrera 16 y 17; se están haciendo trabajos sobre esta vía, que queda sobre el canal o quebrada arzobispo; y se requiere cruzar y se encuentra fresada la vía y allí hay un proyecto de la EAAB que es el "Corredor Ambiental del río Arzobispo"; pero también puede ser una intervención de la UMV; por lo que solicita que se revise por parte de dichas Empresas, esta situación; ya que se requiere coordinar esta intervención para no duplicar acciones y esfuerzos.	EAAB - Zona 2	Delegados	PENDIENTE Se informa por parte del Delegado de la UMV, que no se tienen intervenciones en este sector.
192	Se tiene pendiente el paz y salvo del contrato 173, que se está liquidando en este momento, para el tema de la iluminación del parque 073, se ha radicado en varias ocasiones y nuevamente esta semana se volvió a radicar; pues ya se tienen problemas con la comunidad porque el parque está sin iluminación, y se requiere también dicho paz y salvo para la liquidación del mismo.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE Debe enviarse información por parte de Camilo Riaño.
193	Tiene que ver con una solicitud para una visita con la EAAB - Zona 2, sobre la cual, ya había sido enviada al Ing. Wilson Porras; donde la UMV va a intervenir en la carrera 96 entre calles 63 y 63 A y se van a hacer unas obras de rehabilitación parcial y antes de intervenir, se pide a la EAAB que revise unos problemas de aguas superficiales y sumideros, para que se puedan coordinar las intervenciones.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
194	Se presentó un daño en la Localidad de Puente Aranda, en la carrera 67 entre Diagonal 2 y calle 4B; donde la UMV atendiendo la solicitud del IDIGER, se hizo presente en el sector y encontró un escape en la red de la EAAB; por lo cual, solicita a la EAAB su atención.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
195	Para Menciona que entendía que el IDU intervenía las rutas SITP; pero que la semana antepasada se estuvo revisando un tema de vías, y la Ing. Jacqueline Guevara, mencionó en un oficio que el IDU no va a realizar reparaciones e igualmente el Ing. Luis Bernal, en una nota mencionó que no es competencia del IDU y da traslado a la EAAB. Actualmente la EAAB, inicia un contrato para intervenir en el barrio Juan Rey, sobre la antigua "Vía al Llano" (carrera 15 al Este con 84 Sur), por lo que solicita al IDU aclaración sobre este tema.	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
196	Menciona que el día de ayer se envió vía chat una fotografía sobre una cámara de ETB, en el área de intervención del contrato en el barrio La Belleza, sobre en la carrera 11 Este, al parecer trataron de robarse la tapa, la partieron y la dejaron allí; por lo que solicita su reposición. Sobre lo cual la Arq. Carmen Rocío López, menciona que ya se envió al área respectiva, para verificar.	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE
197	Pregunta al Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), sobre el avance del poste reportado que está presentando riesgo en la infraestructura ETB de la carrera 17 Este, por lo que el Ing. Pablo Ponce menciona que se está haciendo la indagación respectiva y se informará al respecto.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE El Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), menciona que el trabajo se hizo el pasado 12 de agosto; por lo tanto, el trabajo quedó listo y que enviará el registro fotográfico del mismo al correo de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, para que se verifique y pueda sacarse del Comité.
198	Para Presenta una consulta para Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, sobre la Alcaldía de Kennedy, donde hay unos contratos de esta alcaldía que los dejaron abandonados con cámaras de aguas negras sin tapa; por lo cual pregunta cómo sería la reposición; porque también se han dañado andenes y hay riesgo para niños pues se puedan caer en estas infraestructuras.	Alcaldía Kennedy	Delegado	PENDIENTE Debe enviarse información por parte de CLARO.
200	Se hizo una solicitud de fecha 19 de abril pasado, sobre los parámetros que requiere dicha Empresa para la aprobación de estudios y diseños de la malla vial; para evitar que este proceso se alargue en el tiempo; agrega que dicha solicitud se volvió a reiterar el 09 de mayo, pero no se ha tenido respuesta, por lo que solicita que la colaboración en este espacio para la respuesta respectiva.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
201	Cuál sería el trámite para realizar una revalidación de diseños eléctricos para parques que en su momento el consultor presentó en el 2019; y que en este momento son objeto de construcción para la presente vigencia; por lo cual pregunta cuál es el referente de dicha empresa a quién se pueda contactar para tratar este tema.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
202	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; pues se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	MOVISTAR CLARO	Delegados	Ya fue atendido por parte de VANTI GAS NATURAL. Pendiente verificación de Claro.
203	Hace referencia a que se tiene el contrato 508; donde se ha venido haciendo gestiones para una visita en un segmento vial con la EAAB, donde se tiene algunas problemáticas relacionadas con redes de Acueducto y Alcantarillado y se está a la espera de dicha visita hace más de un mes; por lo que solicita la ayuda para concertar dicha visita y poder encontrar la solución y terminar la intervención sobre ese tramo.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
204	Menciona que se va a retomar la formulación de un proyecto de mantenimientos de puentes y luego de una reunión con la alcaldía Local de Kennedy, se identificaron 3 puentes sobre cuerpos de agua, por lo cual se va a realizar las consultas para conocer los elementos o aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta en la formulación; por lo que en cuanto sean radicados los oficios, se informará al respecto para tener celeridad en la respuesta.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
205	Sobre un tema enviado el pasado 5 de julio, relacionado con una central telefónica MOVISTAR que esta presentado malos olores, después de una intervención de rehabilitación vial, frente al predio en la carrera 72 G número 40 – 59 Sur, fue enviado a José Quiroga y a Janeth Echavarría y A Felipe Peña; con el fin que se pueda realizar una visita, para revisar el tema.	Alcaldía Kennedy	Delegado	PENDIENTE
208	La UMV, en la jornada de Puertas abiertas del día de ayer, recibe queja de un ciudadano que manifiesta que la EAAB, intervino con traslado de redes para el METRO en la Carrera 73D No. 38 – 02 Sur y está vía no ha sido recuperada ocasionando molestias para la ciudadanía. Por lo que solicita a la EAAB su atención.	EAAB	Delegado	PENDIENTE EAAB – Proyecto Metro

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
209	Solicita ayuda para programar una reunión con María Inés Guantiva, ya que a través del contratista CONZAL, para el próximo 18 de Julio, se tiene pensado energizar la subestación del terminal; por lo que se requiere una reunión con ella, para revisar los temas pendientes en la subestación terminal.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
210	Solicita una visita técnica conjunta con el Ing. Javier Patiño; para la revisión de unas cajas de ENEL por la Autopista Sur, que se están llenando de agua y se requiere adelantar las obras para los buses de SITP.	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
212	Caso en la calle 57 No. 8B – 20, allí se está adelantando la construcción del edificio del SENA, y la división de Acueducto de la EAAB atendió un reclamo por "tubo roto", y se encontró que el constructor está haciendo una caja de ENEL COLOMBIA (CODENSA), pero dejando el tubo dentro de la Caja; por lo cual se había enviado esta información al Ing. Pablo Ponce de León.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
214	Se presentó al IDU una petición sobre una autorización en los predios de la ALO; y en varias mesas de trabajo, se informó que por sentencia, esos predios ya hacían parte del IDU; y en uno de los radicados que respondió el IDU, donde se pidió autorización para hacer eliminación del retamo espinoso en la carrera 96 entre la calle 83 y calle 86; se remite nuevamente la solicitud al DADEP; por lo que solicita una mesa de trabajo entre el IDU y el FDL Engativá, pues ya que se tiene el recurso para hacer la eliminación del retamo espinoso en ese sector. El número de radicado de respuesta IDU, 2022-3251240471 tiene fecha 1º. de julio.	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE
215	Se presentó una solicitud ciudadana y se hizo visita técnica el día 08 de julio, a la carrera 14 entre calle 76 Sur y Calle 76 A Sur, en la localidad de Usme, y se evidenció el alto grado de deterioro que presenta la obra de drenaje existente (sumidero trasversal) ocasionando un peligro latente; por lo cual solicita la atención de la zona 4 de la EAAB.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE
216	Se presentó la solicitud de limpieza de sumideros en la calle 3 entre la Avenida Boyacá (72) y Carrera 72A, por lo cual se requiere su pronta atención.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
218	Es un caso que se ha venido trabajando a través de correos, con el Ing. Juan Carlos López, donde se confirma por parte de la zona operativa de ENEL, que en la Autopista Sur con carrera 77 se presentan aguas residuales en las cámaras; finalmente el cable se logró tender, pero debe revisarse porque se siguen presentando inundaciones en los empates de la línea de 34.000 voltios que suplente a varias empresas; por lo que se solicita dicha revisión.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE
219	Es un caso donde se tiene unas filtraciones en la subestación de San José; y se ha estado en contacto con el Ing. Lucas Olivella de dicha zona; pues al parecer los sumideros no tienen conexión por alguna razón y se está entrando el agua y en esta subestación están los cables de media tensión, lo que representa un riesgo alto; por lo cual solicita su pronta atención.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
220	Es una consulta para la Zona 2 de la EAAB; pues necesitan enviar una comunicación, a raíz de un daño de un contratista de la EAAB que rompió un cable de media tensión del circuito de Pablo VI, para tener la evidencia y el soporte, para descontar el caso de los indicadores de calidad; por lo cual pregunta si la comunicación se puede enviar por correo o directamente a la EAAB.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE
223	Se presentó en el mes de abril pasado, una solicitud a ENEL COLOMBIA (CODENSA), ya que se tienen programadas ejecutar intervenciones en algunos CIV; pero a la fecha no se tiene respuesta; por lo cual, se entrega la información de los radicados CODENSA números 00273534 de fecha 25 de abril de 2022, y, 00274087 de fecha 26 de abril de 2022.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
225	En el contrato IDU 1718 de 2021, se debe hacer algún mantenimiento rutinario y/o periódico a la Av. Boyacá, por lo que el contratista ha solicitado al IDU que se gestione ante la EAAB, la limpieza de sumideros en la Avenida Boyacá entre la Autopista Sur y la Avenida de las Américas; ya que dichos sumideros están tapados y/o colmatados; por lo cual se solicita a estas tres zonas de la EAAB, para su revisión.	EAAB	Delegados	PENDIENTE En el contrato IDU 1718 de 2021, se debe hacer algún mantenimiento rutinario y/o periódico a la Av. Boyacá, por lo que el contratista ha solicitado al IDU que se gestione ante la EAAB, la limpieza de sumideros en la Avenida Boyacá entre la Autopista Sur y la Avenida de las Américas; ya que dichos sumideros están tapados y/o colmatados; por lo cual se solicita a estas tres zonas de la EAAB, para su revisión. Al respecto, el Ing. Javier Patiño Pérez de la zona 5 de la EAAB, menciona que debido a la capacidad operativa no será posible atenderlo muy rápidamente; y que este tipo de actividades se hacen a través de un convenio con Aguas Bogotá y el cual en este momento se está en proceso de renovación; sin embargo, que se revisará al interior de la Entidad.
226	Tal como se informó en el chat del comité, en la carrera 13 número 155-88, hubo una intervención y se ha tenido problemas con los cargues de los pozos y han causado inconvenientes en la comunidad; por lo tanto, se debe identificar quien intervino la vía, para articular las acciones necesarias para atender dicha situación.	ESP participantes en el Comité	Delegados	PENDIENTE Se está avanzando en la revisión con Alcaldía Local, a ver si es de ellos. Así mismo, la UMV, revisará el caso.
227	Se solicita la recuperación unos ductos que fueron afectados en la caja de paso de ETB en la carrera 7ª, frente al Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ya que CODENSA paso una red por los ductos de la ETB y aunque retiraron la tubería fueron dañados los ductos; por lo cual, se solicita la recuperación de los mismos.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
228	Para ENEL COLOMBIA (CODENSA): Es un caso en el edificio 7/24, donde CODENSA está pasando unos ductos de 6 pulgadas con red por cajas de ETB, por lo cual se solicita el retiro de dicha red, por el peligro que representa.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
229	Se reporta la afectación de las paredes de una cámara en la calle 2 número 30 A – 09, por lo que solicita la recuperación de las paredes de dicha con las especificaciones de ETB.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
230	Se presenta un hundimiento en un andén en el Restrepo, en la calle 19 Sur con carrera 19, a causa de un sumidero que presenta fallas o está colapsado; por lo que se requiere verificar el estado del sumidero para ver si está ocasionando ese hundimiento; esta información ya fue enviada a Lucas Olivella de la EAAB.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE El Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 - EAAB, verificará el tema.
231	Se solicita el apoyo de las zonas 3 y 4 de la EAAB, para la inspección con CCTV, en los segmentos del listado que se muestra a continuación; donde tienen prioridad los segmentos marcados en color rojo: No. PK_ID CIV 1 - 417259 - 18002688 2 - 416705 - 18002493 3 - 417026 - 18002604 4 - 416981 - 18002587 5 - 417256 - 18002687 6 - 415995 - 18002187 7 - 91103507 - 18001225 8 - 417029 - 18002605	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE
232	Se relaciona con el evento SIRE 5400483 y tiene que ver con una losa de concreto en mal estado (fracturada), con una socavación de una profundidad entre 1,00 -1,50 m; en el área afectada también se observa un pozo de inspección; aparentemente el daño se presenta debido a la filtración de agua de la red de alcantarillado, la cual ha generado lavado de finos, representando un peligro latente para los actores de tránsito del sector.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE El Ing. Juan Carlos López de la zona 4 - EAAB, verificará el caso.
233	Se envió un correo sobre un caso crítico por unos malos olores en la central de MOVISTAR en Asturias y según SIGIDU, se informa que fue una intervención de la Alcaldía de Kennedy, por lo que se quiere coordinar una visita las 3 entidades; al parecer con la intervención de la Alcaldía se afectaron las infraestructuras de la EAAB, generando la problemática.	EAAB – Zona 4 y SDG – Alcaldía de Kennedy	Delegados	PENDIENTE La visita se prevé para el viernes 12 de agosto a las 9:00 am.
234	Se tiene una situación en la central Morato en la carrera 70, cerca de la avenida Suba, sobre una cámara de MOVISTAR en vía y se requiere intervenirla porque al parecer, durante su intervención generó afectación sobre redes de la EAAB y está ocasionando problemas a los predios del sector, tiene entendido que se están generando	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	los permisos para dicha intervención, por lo que una vez tenga los radicados, serán enviados al Ing. Álvaro reinosos del IDU; según el SIGIDU, al parecer es una vía intervenida por la Alcaldía local por lo que se pregunta si es necesario coordinar con dicha Alcaldía Local.			
235	Se solicita la entrega de la paz y salvo para el Contrato 321, que es de obra pública, por lo cual se están en este momento en recorridos y hay algunas observaciones para el contratista; por lo cual se espera la culminación de este tema de manera prioritaria.	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
236	Se tiene un par de requerimientos ciudadanos, sobre cajas de inspección que están en mal estado o sin tapas, por lo cual se formalizarán las solicitudes a dicha empresa.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
237	Se tiene igualmente requerimientos de reparación de cajas de inspección que están en mal estado y/o se encuentran sin tapas; por lo cual se formalizarán las solicitudes a esta empresa.	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE
238	Se recibió en la UMV, un derecho de petición por parte de la Señora Regina Álvarez, manifestando que ENEL COLOMBIA (CODENSA), rompió el andén para subterranizar redes y la recuperación quedó en mal estado causando daños a los tanques subterráneos y el acceso al conjunto en la calle 161 número 16B-10; por lo cual solicita la verificación.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE ENEL ya envió la información para la revisión respectiva.
239	Se encuentran a la espera de la liquidación y pago de los daños por parte del Contrato 101 de 2018, donde se intervino la Carrera 4ª. Por lo que se solicita su atención.	Alcaldía La Candelaria	Delegado	PENDIENTE
242	Se solicita a ENEL COLOMBIA atender solicitud de factibilidad que fue remitida por primera vez el 9 de junio de 2022, para Betania y San Juan; por lo cual se crearon el día 13 de junio, dos números de factibilidad de Servicio, para San Juan, la número 1500173395 y para Betania la número 1500173403	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE El Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), menciona que recibió los correos y se hizo la gestión al interior con la persona encargada; por lo que nuevamente hará la gestión respectiva; igualmente, solicita los números de factibilidad al correo: pablo.poncedeleon@enel.com
243	Se ha presentado una solicitud por parte de un contratista del FDL de Ciudad Bolívar, relacionado con el contrato de obra pública 388 de 2019 con intervenciones en el barrio Villa Gloria; dicha solicitud se refirió al cambio de unas redes de acueducto, y hasta la fecha no se han hecho presentes para atender esta petición; por lo cual, solicita la atención del caso porque ya tiene atraso el contrato.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE Ing. Juan Carlos López de la zona 4 de la EAAB, solicita la información del radicado vía WhatsApp, para hacer la gestión respectiva.
247	Se quiere conocer el estado de los certificados de "paz y salvo" del contrato de obra N°. 142 de 2018, considerando que actualmente el contratista radicó las solicitudes de certificación ante las empresas de servicios públicos. Se conoce que a la fecha el contratista tiene pagos pendientes con las empresas VANTI y EAAB. Por tanto, se solicita revisar el estado actual de las solicitudes, para que se efectúen los requerimientos correspondientes frente a situaciones que se deban aclarar con el contratista y llevar a buen término el proceso de liquidación. A continuación, el Ing. Jorge Abreo relaciona los números de radicado de las solicitudes: <ul style="list-style-type: none"> • Claro 2021-N001-E408883. • Movistar 20210000208596. • Vanti - 01521cr0020257. • ETB 4347220000130648. • ENEL COLOMBIA 03042916. • EAAB E-2021-087469. 	ESP participantes en el Comité	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
248	Se requiere realizar verificación técnica en redes respecto a lo referido en los estudios y diseños propuestos para la intervención de tramo vial IP8 localizado en el Barrio Mariscal Sucre sector de Villa Anita, que hace parte del Contrato de Obra N°. 167-2019, ya que se presenta posible problemática por redes en CIV. Se informa que el Ing. Wilson Rojas de la Zona 2 de la EAAB fue informado de este caso, así mismo se remitió desde la Alcaldía Local correo electrónico con estudios y diseños de este	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	<p>segmento. Se indica que el problema principal está en redes de alcantarillado. Adicionalmente, se señala que el contrato se encuentra en proceso de presunto incumplimiento, por tanto, se requiere realizar la revisión en campo para dar celeridad a la gestión de este proyecto.</p> <p>Desde la semana pasada se viene gestionando con la EAAB Zona 2, no obstante, se solicita pronunciamiento por parte de la ESP.</p>			
249	<p>La UMV realizó cambio de carpeta sobre CIV 2001580 – en calzada frente a predio localizado en la calle 57 N°. 8-24, y hace unos días se observó hundimiento en pavimento como se puede verificar en registro fotográfico, se señala que pudo ser causado por filtración de agua que ocasionó un lavado de finos en la superficie de apoyo de la carpeta asfáltica. La UMV realizó visita con Luis Eduardo Suarez de la EAAB – Zona 2, pero se determinó en terreno que debería efectuarse inspección de campo de manera conjunta con ETB y ENEL COLOMBIA, para determinar intervención y paso a seguir.</p>	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE Visita conjunta, ENEL y ETB informaron que quedaban sujetos a la disponibilidad de programación de la EAAB.
250	<p>Evento SIRE 5401828, se presenta caso sobre AC 3 entre KR 56ª y KR 57 – CIV 16001005 – PK_ID 513861, donde se observa hueco sobre la calzada de aproximadamente 1,50 x 1,00 m, con socavación de una profundidad entre 0,80 a 1,00 metro, aparentemente el daño corresponde a filtración de agua del canal adyacente, ocasionando lavado de fino y daños superficiales sobre carpeta asfáltica. Se solicita evaluación por parte de la EAAB, para que desde su competencia realice inspección e intervención requerida.</p>	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE
251	<p>Evento SIRE 5402211, donde se reporta hundimiento en la carrera 14A entre CL 127A y CL 127B, CIV 1004377, se observa que en el área afectada se encuentran dos pozos de inspección, aparentemente el daño fue ocasionado por filtración de agua de la red de alcantarillado, generando lavado de finos y daños sobre carpeta asfáltica. Se requiere evaluación por parte de la EAAB, para que desde su competencia se realice la inspección e intervención requerida.</p>	EAAB - Zona 1	Humberto Madrid	PENDIENTE
252	<p>Evento SIRE 5402180, para la TV 1 entre CL 24A sur y CL 25 sur - CIV 4001175 – PK_ID 203192, donde se reporta grieta sobre segmento vial que puede generar accidentes, se observa hueco sobre la calzada con un área aproximada de 0,70x0,70 m2 y una profundidad de 0,60-0,70 metros; el cual está en línea con los pozos de inspección; igualmente se visualiza socavación aparentemente causado por filtración de agua de la red de alcantarillado generando hundimiento sobre tramo vial, se solicita evaluación por parte de la EAAB, para que desde su competencia se realice la inspección e intervención requerida.</p>	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE
253	<p>Magally Leal (EAAB - Zona 4) realizó contacto con ENEL para solicitar desenergización de una red en la CL 3 - KR 38, porque al parecer ENEL COLOMBIA construyó una cámara, y quedó una red de acueducto dentro, se indicó que se realizaría una intervención prioritaria, ya que se están presentando filtraciones en un predio vecino. Por tanto, se propone realizar un desvío de esta red y se cobrará a ENEL COLOMBIA</p>	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE ENEL COLOMBIA señala que podrá realizar la desenergización hasta el 16 de septiembre de 2022 para poder realizar el trabajo. El Ing. Luis Francisco realizará consulta con Magally y se pondrá en contacto con el Ing. Pablo Ponce, para coordinar actividades de intervención.
254	<p>Que se coordine entre todos los operadores a organizar las redes sobre el corredor de la calle 80 desde el Puente de Guadua hasta la glorieta de Siberia, porque existen muchísimas estructuras y elementos que ya no están en uso. Por lo que debe realizarse retiro de las mismas, siendo este un beneficio para todos evitando este tipo de accidentes.</p>	ESP participantes en el Comité	Carmen Rocío López	PENDIENTE
255	<p>Revisar el derecho de petición que se trasladó al Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB, respecto a tomar medidas correctivas de la filtración de agua en una cámara que está afectando el predio de la KR 55 con CL 160.</p>	EAAB - Zona 1	Humberto Madrid	PENDIENTE
256	<p>Realizar capacitación para entidades, ESP, ejecutores del Distrito. Etc., a través del área HSEQ de ENEL Colombia, ciclos específicamente sobre riesgos eléctricos, se coordinará con presidente del Comité para realizar espacio.</p>	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE Se realizó contacto con la división de seguridad frente a acciones con telemáticos y terceros, el jefe de la división Fernando Murcia, indica que se han realizado reuniones con Claro, Movistar. Etc., a través de curso virtual para que llegué a los trabajadores, de igual manera se abre espacio para realizar formaciones presenciales. Así mismo, se precisa que se han elaborado procedimientos para reportar casos de infraestructura sub estándar y emergencia, se encuentra infraestructura en casos sub estándar, en los procesos de normalización y

No. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				se tiene filosofía de mejorar condiciones de seguridad, ya que para ENEL priman las condiciones de seguridad, por tanto, también se invita a recibir formación en seguridad desde varios institutos como el SENA. Así las cosas, ENEL Colombia está dispuesto a retomar charlas presenciales. Se coordinará el espacio para tratar temas de seguridad desde el punto de vista eléctrico. • Se indica a ETB que no se ha recibido respuesta de los casos pendientes.
257	Se realizó visita por parte de ENEL Colombia a uno de los parques sobre los cuales se está ejecutando (RUPI 06173), no obstante, en esta oportunidad nuevamente se presentaron observaciones y tendrá que realizarse corrección que no se había requerido en las tres visitas anteriores.	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
258	Se presenta nuevo caso respecto del parque – RUPI 06065, donde la UAESP tiene pendiente realizar revalidación del diseño fotométrico y eléctrico del parque, para tener la intervención final de la parte eléctrica, y sobre la cual no se ha tenido respuesta a la fecha.	UAESP	Delegado	PENDIENTE
259	Se requiere agilizar trámite de paz y salvo, que fue radicado por el contratista BYR Construcciones SAS, el día 10 de febrero con radicado VANTI 01522CR0002435. A la fecha no se tiene respuesta por parte de VANTI.	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuasty	PENDIENTE
260	Frente al Contrato FDLU 351-2019: Se ha radicado solicitud de paz y salvo el 20 de enero de 2022, con radicado ETB 000335, se han realizado 3 recorridos para 65 segmentos viales, no obstante, se encuentran pendiente por visitar 2 barrios, en Sucre y Monteblanco, se asignó visita el 13 de septiembre, por lo que se requiere expedir rápidamente el documento de paz y salvo, teniendo en cuenta el tiempo que ha llevado realizar las visitas y finalizar gestión con la ESP.	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE
261	Frente al Contrato FDLU 351-2019: Se solicitó paz y salvo desde el 20 de enero de 2022, y a la fecha no se ha dado respuesta a requerimiento con radicado Movistar 2022120101320472.	MOVISTAR	Luis Enrique Gómez	PENDIENTE
262	Frente al Contrato FDLU 351-2019: Se solicitó paz y salvo desde enero, se han realizado visitas de entrega, pero no se ha recibido respuesta oficial frente a requerimiento con radicado EAAB E-2022-003208.	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE
263	En el barrio Brazuelos (Esquina calle 104 sur con ingreso a conjunto residencial Bella Flora, dirección aproximada calle 104 Sur # 14-50), en visita sobre la vía hay una cámara de ETB sobre el espacio público que no está a nivel del andén, generando problemas con la comunidad, esto ha producido acumulación de residuos sobre este sector.	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE
264	En la KR 9 entre CL 69 y CL 70, donde se presenta un hundimiento, al realizar visita se observa que fue causado por la pérdida de finos a razón de un daño en la red de alcantarillado. Así las cosas, se solicita la atención de la EAAB sobre este sector, y se reafirma la disposición de la UMV a colaborar.	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE

6.1 Balance Compromisos:

- Casos presentados hasta la fecha (2022):	265	100%
- Casos Resueltos hasta la fecha (2022):	120	45%
- Casos pendientes hasta la fecha (2022):	145	55%

7 TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver cinco (5) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número 73, 107, 187, 217 y 265; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: Se lograron resolver cinco (5) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número 73, 107, 187, 217 y 265; así mismo, se presentan avances en otros casos, sobre los que se espera efectuar verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.</p>	
	<p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

8 COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 22-septiembre de 2022
2	Revisar delegación de Claro – Sustituye a José Ricardo Velasco.	Presidente y Secretaria Técnica	IDU - SDP	Jueves, 22-septiembre de 2022

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos vía Google Meet.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 22-septiembre de 2022, manera presencial y/o virtual

9 CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye esta trigésima cuarta sesión del Comité, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 22 de septiembre de 2022 a las 8:30 am, de manera presencial y/o vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE**



**PAOLA ANDRÉA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA**

Proyectó: Paola Andrea Gámez T. - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU
Aprobó: William Orlando Luzardo Triana -IDU

Anexo: 1-Tablero de control – COISP – Corte del Acta 34 del 8 de septiembre de 2022.

Número de casos registrados por mes



Nº. de casos registrados

265




Consulta por Entidad que presentó el caso

Consulta por Entidad Responsable


Trimestre en qué se presentó el caso

Número de casos resueltos por mes

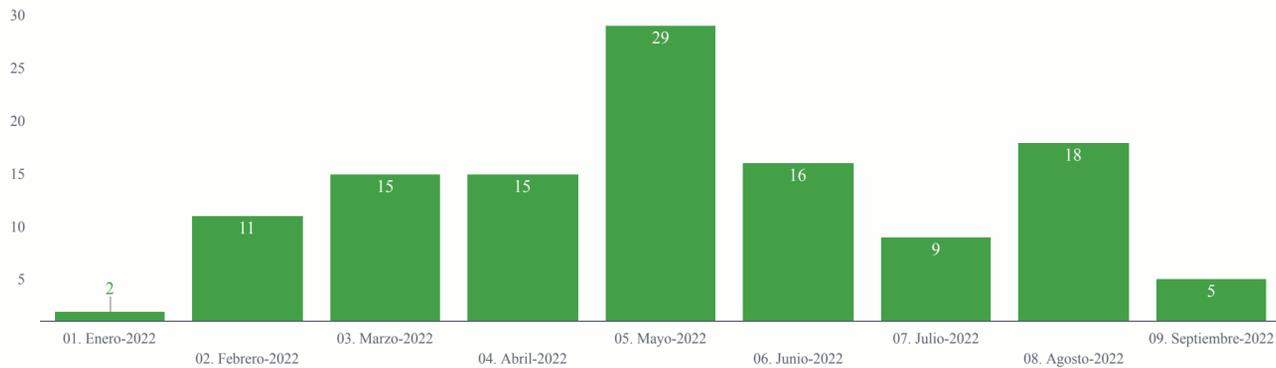


Nº. de casos resueltos

120

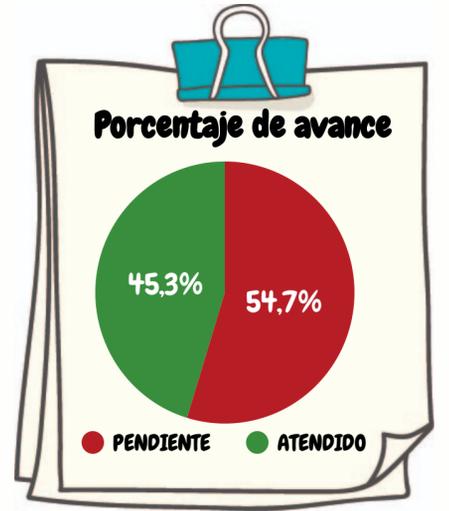

Número de casos pendientes por mes



Nº. de casos pendientes

145



TOP - Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPONSABLE	No. DE CASO
1. ENEL COLOMBIA	49
2. EAAB - Zona 2	34
3. EAAB - Zona 3	28
Total	265

TOP - Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	No. DE CASO
1. EAAB - Zona 2	21
2. ENEL COLOMBIA	17
3. EAAB - Zona 1	14
Total	120

Recuento de casos

No. DE CASO	Nº. SESIÓN DE REGISTRO CASO ...	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE
1. 1	II Sesión - 27-Ene-22	IDU	Caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ve...	EAAB - Zona 1
2. 2	II Sesión - 27-Ene-22	IDU	Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afec...	EAAB - Zona 2
3. 3	II Sesión - 27-Ene-22	IDU	Intervención EAAB de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 sin recuperación de la parte intervenida (2021)	EAAB - Zona 1
4. 4	II Sesión - 27-Ene-22	IDU	Intervención EAAB, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29 (2021)	EAAB - Zona 2
5. 5	II Sesión - 27-Ene-22	IDU	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur numero 10-19, donde fueron retirados los escombros pero no fue re...	EAAB - Zona 4
6. 6	II Sesión - 27-Ene-22	IDU	Los faltantes de tapas en Autopista Norte Calle 207 en el andén contiguo al puente peatonal y lo referente...	ENEL COLOMBIA
7. 7	II Sesión - 27-Ene-22	IDU	Faltante de tapa en el puente de la avenida 1º. de mayo o transversal 78N por calle 51 A Sur (2021)	ENEL COLOMBIA
8. 8	II Sesión - 27-Ene-22	SDP	Revisión caso de poste en la Carrera 8 G Bis A No. 164 A - 76 Barrio Torcoroma, por solicitud ciudadana de...	ETB, CODENSA, CLARO, MOVISTAR
9. 9	II Sesión - 27-Ene-22	VANTI GAS NATURAL	Redes de gas expuestas, -Calle 43C BIS SUR con 3B Esquina; - Calle 43 C Sur con 13 Bis Este Esquina; - Cal...	EAAB - Zona 3
1... 10	II Sesión - 27-Ene-22	EAAB - Zona 4	Desestabilización de poste de alumbrado público, con dirección Calle 66 Sur No. 10 B - 02 Este. (1era. Se...	ENEL COLOMBIA
1... 11	II Sesión - 27-Ene-22	ETB	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtraci...	EAAB - Zona 3
1... 12	II Sesión - 27-Ene-22	ETB	Se pregunta sobre las cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que l...	EAAB - Zona 2
1... 13	II Sesión - 27-Ene-22	EAAB - Zona 4	Se esta construyendo en el barrio La Belleza, una red de alcantarillado pluvial y se esta desestabilizando u...	ENEL COLOMBIA
1... 14	II Sesión - 27-Ene-22	ETB	En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización ...	EAAB - Zona 3
1... 15	II Sesión - 27-Ene-22	ETB	Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un c...	EAAB - Zona 2
1... 16	II Sesión - 27-Ene-22	ETB	En calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva (presentado por ETB -...	ENEL COLOMBIA

TOP - Entidades con casos pendientes

ENTIDAD RESPONSABLE	No. DE CASO
1. ENEL COLOMBIA	32
2. EAAB - Zona 4	19
3. EAAB - Zona 3	17
Total	145
