COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 33 de 2023

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 14 de septiembre de 2023

HORA: 08:30 am a 9:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Rodríguez	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Juan Sebastián Acevedo Iriarte	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50435
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-57564
Martha Cecilia Bayona G.	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-57564
Wilmer Esneider Lozada Bonilla	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Anamaria Solano Monroy	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)	X		
Oscar Fernando Escobar Alvarado	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		X	
Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-41750
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Lorena Alejandra Jiménez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Abril	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
	Profesional FDL de Tunjuelito	Alcaldía Local de San Tunjuelito		X	No asistió delegado
	Profesional FDL de Usme	Alcaldía Local de Santa Usme		X	No asistió delegado

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

1. ORDEN DEL DÍA:
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
3. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
4. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (32 DE 2023).
6. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
7. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
8. TOMA DE DECISIONES.
9. COMPROMISOS.
10. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. Álvaro Reinoso Guerra en su calidad de encargado de la presidencia del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión treinta y tres **(33)** del año 2023, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se coordina con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, el orden de intervención de las Alcaldías Locales de Tunjuelito y Usme.

3.1 No se presentan delegados de los Fondos de Desarrollo Local invitados.

4 LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (32 DE 2023).

La profesional Anamaria Solano Monroy de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 07 de septiembre de 2023, correspondiente a la sesión número **32** del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, no se realizan observaciones.

También se menciona, que las **actas 28, 29, 30, 31, 32** y **33** se encuentran en proceso de revisión y firma. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes en el último mes:

N°. Acta	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación
26	27/07/2023	X	X	X	X	Proceso SIPA 2243282	**Pendiente**
27	03/08/2023	X	X	X	X	Proceso SIPA 2243282	**Pendiente**
28	10/08/2023	X	X	En trámite	**Pendiente**	**Pendiente**	**Pendiente**
29	17/08/2023	X	En trámite	En trámite	**Pendiente**	**Pendiente**	**Pendiente**
30	24/08/2023	X	En trámite	En trámite	**Pendiente**	**Pendiente**	**Pendiente**
31	31/08/2023	X	En trámite	En trámite	**Pendiente**	**Pendiente**	**Pendiente**
32	07/09/2023	X	En trámite	En trámite	**Pendiente**	**Pendiente**	**Pendiente**
33	14/09/2023	X	En trámite	En trámite	**Pendiente**	**Pendiente**	**Pendiente**

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el Ingeniero Álvaro hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, UMV, EAAB, ETB, MOVISTAR

5.1 Secretaría de Gobierno – Jaqueline Friede:

Seguimiento **Casos 414 y 427**, informa que ya hizo el requerimiento a los Fondos de Desarrollo Local con respecto a los casos mencionados, pero aún no ha recibido respuesta.

- **Caso nuevo:** Para Vanti, La Alcaldía de Rafael Uribe solicita la instalación de servicio de gas para unas viviendas y no se han realizado. El FDL de Rafael Uribe hizo la solicitud por correo electrónico, pero no han obtenido respuesta.
-

Respuesta Álvaro Reinoso: Indica que el delegado de Vanti no se encuentra en la reunión sin embargo suministra los datos de contacto.

- **Caso nuevo:** Para SDM, por accidente en el FDL de Suba, en la calle 152 B con carrera 14, solicitan PMT para la intervención de la vía de manera inmediata ya que dicho accidente se presenta debido a un hueco dejando una persona fallecida. Requiere

coordinar una mesa de trabajo con SDM para acordar lo mas pronto posible la intervención de la vía.

Respuesta SDM – Martha Helena Silva: La SDM indica que, para atender este requerimiento, propone que el contratista solicite el PMT por emergencia al correo gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co para atender el requerimiento con prioridad y recomienda que plantee en la propuesta del PMT un manejo de paso alterno (paso uno a uno) para el tramo especifico donde ocurrió el accidente (Calle 152B entre Carrera 113C y Carrera 114), adicionalmente se debe presentar el aval de Transmilenio ya que por este corredor transita SITP y sin esta firma o aval no se puede autorizar el PMT.

Se aclara que para el tramo de la Calle 152B entre Carrera 114 y Carrera 115, se deben atender las observaciones realizadas por correo electrónico al PMT, para atender en la publicación del COI conforme los tiempos establecidos en la ley.

Respuesta Secretaría de Gobierno – Jaqueline Friede: Informará al FDL de Suba y coordinará vía WhatsApp

5.3 SDM – Martha Helena Silva:

- Reporta el cierre del **Caso 493** ya se realizó reunión con la subdirección de señalización y el FDL de Sumapaz, les explicaron cómo es el trámite de los diseños así mismo les indicaron que el tiempo estimado es de dos meses en elaborando y sacando la aprobación de los diseños.

5.4 IDU – Álvaro Reinoso:

Se solicita realizar seguimiento a los casos que se tienen asignados por Empresas de Servicio Público y Entidades, actualmente se han generado herramientas que facilitan efectuar rastreo y control de los casos, como la matriz de seguimiento y el tablero de control, los cuales se encuentran en línea, se actualizan de manera semanal y son dinámicos, lo que hace posible verificar los avances que se registran, así mismo, se informa que se incorporaron tableros específicos por empresa y entidad para que se pueda revisar la información de manera rápida.

Por otra parte, reporta el cierre del **caso 498** , indica que ya se realizó la visita solicitada por parte de EAAB Zona 2 y quedó solucionado.

5.5 IDU – Onisalba Segura:

- Solicita información del caso presentado el 25 de mayo vía chat de WhatsApp, indica que al parecer el daño ya fue arreglado por parte de EAAB requiere información para cerrar el caso.

Respuesta EAAB - Mauricio Mahecha: Va a confirmar la información y reporta el estado del caso.

- Reitera a ENEL avance del **caso 432** correspondiente a la cámara de la calle 147

Respuesta ENEL - Mauricio Arenas: Continúan gestionando el trámite para el pmt ya

que les están requiriendo unos elementos para garantizar la movilidad, se encuentran tramitando y haciendo la gestión.

5.6 UMV– Humberto Ramírez:

- **Caso nuevo:** Para VANTI**,** solicita tener acceso a algunos de los planos de redes de VANTI para obras a ejecutar. Se hará la solicitud vía correo electrónico.

5.7 EAAB Zona 4 – Juan Carlos López:

- **Caso nuevo:** Para UMV, solicita una reunión con UMV para tratar el reporte de un daño en calle 78C # 17 f - 47 vía al Mochuelo ya que hay un daño en la acometida de EAAB

- **Respuesta UMV - Humberto Ramírez:** Solicita en la medida de lo posible el registro fotográfico y se contactará con EAAB para coordinar fecha y hora de la reunión.

5.8 ETB – Carmen Rocío López:

Reporta el cierre del **caso 476,** ya fue atendido. ETB ya entregó el acta de paz y salvo y de verificación final al contratista mediante el oficio 863 del 13 de junio de 2023.

Requiere el **cierre de los 463 y 496** ya que indica que ya se adelantó la gestión correspondiente por parte de ETB. Las intervenciones pendientes le corresponden a la Alcaldía Local.

5.9 Movistar – Lady Salamanca:

- **Caso nuevo:** Para SDM, solicita aclaración para unos trámites de pmt que están realizando ya que han recibido varias objeciones respecto al los sectores patrimoniales los cuales hacen parte del IDPC.

- **Respuesta SDM – Martha Silva:** Indica que de acuerdo con reunión semanal con IDU e IDPC se estableció que ahora el IDPC según la normatividad y competencias, la entidad está abarcando todo el CIV que tenga algo de afectación de patrimonio cultural, quien realizó la revisión de esa normatividad fue el IDPC, solicita a MOVISTAR dirigirse directamente al IDPC para que den la información de la normatividad y el sustento legal. Remite el correo electrónico para la consulta subintervencion@idpc.gov.co.

5.10 Claro – Nohora Victoria:

- **Caso nuevo:** Para ENEL, solicita información respecto a unas cámaras de Enel que no tienen tapas, requiere un correo de contacto para hacer la gestión.

- **Respuesta ENEL – Mauricio Arenas:** Requiere el listado de la solicitud por correo electrónico para dar alcance.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE
01. Enero-2023	**366**	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a realizar intervención de cambio de carpeta en este tramo vial y se requiere evaluar infraestructura de redes húmedas.	EAAB - Zona 1
01. Enero-2023	**367**	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	IDU
01. Enero-2023	**368**	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontró una acometida de agua que está dentro de una cámara de Movistar que se debe renivelar.	EAAB - Zona 2
01. Enero-2023	**369**	Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero que posiblemente se desempato o por daño en la conexión de la tubería, se adjunta registro fotográfico.	EAAB - Zona 2
01. Enero-2023	**370**	Se solicita coordinación con entidades como Acuecuto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto Línia Techo Verguas, adicionalmente se solicita lograr la viabilidad de inicio de actividades de modernización sobre el tramo 2 - Calle 3 entre cra 50 y Av 68 para el primer trimestre de 2023	Entidades participantes en el Comité
01. Enero-2023	**371**	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ENEL COLOMBIA
01. Enero-2023	**372**	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los incovenientes general soluciones y reactivar el contrato	ENEL COLOMBIA
01. Enero-2023	**373**	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliairia del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	ENEL COLOMBIA
02. Febrero-2023	**374**	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carreras 7 y 9 se realizó visita e inspección y se evidenció que corresponden a acometidas domiciliarias de la empresa de acueducto, se hace el llamado a la zona 1 de la Empresa de Acueducto para que por favor revise, se deja trazabilidad del caso en chat de grupo de trabajo y registro fotográfico	EAAB - Zona 1
02. Febrero-2023	**375**	Se reporta hundimeinto en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1
02. Febrero-2023	**376**	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, Cl26 con KR 69 y el tercer punto Cl 26 cerca a la Av Boyaca	IDU
02. Febrero-2023	**377**	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	IDU
02. Febrero-2023	**378**	Solicitud de priorización al FDL de Usme sobre una intervención en la Calle 99 Sur No. 1A- 61, se remitió solicitud mediante correo eléctronico	Entidades participantes en el Comité
02. Febrero-2023	**379**	Reqeuerimiento de respuesta a la Zona 1 EAAB del radicado 3133002 -S-2022-317611 por concepto de instalación de tuberia en acero de 14 pulgadas en la Carrera 62 entre Calle 169 B y Calle 167	EAAB - Zona 1
02. Febrero-2023	**380**	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A . En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing.	IDU

		Alvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	
02. Febrero-2023	**381**	Requerimiento respecto a 110 puntos objetados por el IDU ni el IDPC ni el IDRD dan respuesta, lo que ha generado problematicas para atender el proyecto de fibra optica para la ciudad, solicita priorizar el caso	Entidades participantes en el Comité
02. Febrero-2023	**382**	Se reporta novedad en cámara de ETB con filtración de aguas negras en la Calle 20 No. 13 - 29 se deja registro en video por el chat del grupo	EAAB - Zona 3
02. Febrero-2023	**383**	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Este y 1 Bis C, realizo obras dejando las cámaras de la ETB tapadas, solicita información para ver si por medio del IDU se pude contactar con ellos para que realice los correctivos sobre la infraestructura, queríamos saber si estas constructoras adelantan algún trámite ante el IDU para el recibido sobre el espacio público. Se deja reporte fotográfico por el chat del grupo.	SDP
02. Febrero-2023	**384**	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3
02. Febrero-2023	**385**	Solicitud de respuesta por parte de la EAAB respecto a los requerimientos E-2022-008905, E-2022-012772 del año pasado y uno realizado en enero de este año, indagando sobre unos tramos viales que están reservados por el consorcio Alcantarillado de Occidente, al momento no se ha dado respuesta	EAAB
02. Febrero-2023	**386**	Solicitud para Enel, referente a un poste con riesgo de caída y obstrucción de acceso al predio de la Calle 25B No. 74 50	ENEL COLOMBIA
02. Febrero-2023	**387**	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1
02. Febrero-2023	**388**	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU
02. Febrero-2023	**389**	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 20236120058209 2 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM
02. Febrero-2023	**390**	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa.	ENEL COLOMBIA
02. Febrero-2023	**391**	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB
02. Febrero-2023	**392**	solicitud a la EAAB respecto a daños en proximidad al pozo de inspección, posibles daños en la red de alcantarillado. Se solicita evaluación por parte de la EAAB en la Carrera 52 C desde la Calle 41 Sur hasta la Calle 41 A Sur.	EAAB - Zona 5
03. Marzo-2023	**393**	Carrera 96 por Avenida Calle 63 hasta la Calle 66 A, en este corredor vial la UMV tiene proyectado iniciar obras en un proyecto piloto el día 15 de marzo, se solicita a través de este comité el apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado para lo que tiene que ver con el desarrollo de esta obra.	EAAB - Zona 2
03. Marzo-2023	**394**	Filtración de Cámaras en la Carrera 13 A No. 101 - 09 Edificio Oikos, se recibió una tutela por parte del dueño del predio ETB procedió a impermeabilizar la cámara luego de realizar visita conjunta con la empresa de Acueducto, sin embargo persiste la filtración en el sótano del edificio. El ingeniero Jhon del acueducto programo visita en el edificio. Se deja trazabilidad del caso en el comité	EAAB - Zona 1
03. Marzo-2023	**395**	Caso de una cámara localizada en la Carrera 23D No. 60A - 10 Sur que está sin tapa, una señora tuvo un accidente en dicha cámara	EAAB - Zona 4
03. Marzo-2023	**396**	requerimiento respecto a una consultoría del 2018 sobre dos salones comunales, indica que en 4 años no se ha obtenido resultado alguno, sin embargo menciona que de la consultoría de ambos salones comunales el que se encuentra ubicado en la Carrera 35A con Calle 9 Sur detrás de la Iglesia de Santa Matilde requiere apoyo referente a un contacto para agilizar el trámite de disponibilidad de servicios públicos con Acueducto, Vanti y Enel	Entidades participantes en el Comité

		Colombia (Codensa), indica que con Vanti ya se tuvo la primera audiencia sin embargo la idea es volver a solicitarla.	
03. Marzo-2023	**397**	Tienen 2 CIVs, en compañía del Ingeniero Francisco Rodríguez hemos venido trabajando nos encontramos terminando el primero del cual está pendiente solamente asfalto, había un compromiso de renovar la red de acueducto que se encuentra en asbesto cemento, antes de iniciar los trabajos la situación reportada había sido otra el compromiso con el acueducto era hacer el trabajo nosotros con el contratista realizar las zanjas y el acueducto hacer su trabajo, para eso en particular son el CIV 10002609 Y 16002550 poder tener una fecha definida con el Acueducto porque estamos en este momento frenados dependemos de esa tarea	EAAB - Zona 3
03. Marzo-2023	**398**	otro caso es el del CIV 16002083 vamos a iniciar su intervención, es un callejón cerrado en pavimento flexible pretendemos hacerlo en pavimento rígido pero por esa misma proyección que tenemos necesitamos la definición del acueducto si allá se van a cambiar o no las redes para poder definir tiempos de trabajo en conjunto. Dirección a intervenir Carrera 51 entre Calles 37 Sur y Calle 28 Sur	EAAB - Zona 4
03. Marzo-2023	**399**	solicita una mesa de trabajo para un tema a nivel distrital sobre una intervención en la ladera del rio Fucha, ya se solicitó mediante oficio, se hicieron unas propuestas de diseño para mitigar la habitabilidad de calle en ese lugar, se solicita concepto y reunión para solucionar eso.	EAAB - Zona 3
03. Marzo-2023	**400**	En la noche del 6 de marzo de 2023 se hizo un recorrido con la UAESP para el tema de las expansiones que necesitamos en un parque porque es un punto crítico de venta de estupefacientes y de habitabilidad de calle, en este momento se está generando un sendero con la comunidad a partir de la iniciativa juntos cuidamos Bogotá, pero necesitamos las expansiones de esa luminaria, la UAESP nos indicó que cuando termináramos el sendero hiciéramos otro recorrido para solicitarle a Enel el tema de la expansión, nos gustaría darle celeridad a ese tema porque es un punto crítico de la localidad y la comunidad lo ha pedido mucho	ENEL COLOMBIA
03. Marzo-2023	**401**	se remitió al chat de trabajo un caso por la Avenida Calle 3 por Carrera 56 para la cual no se observó señalización alguna, fue enviado para verificación a quien está haciendo esa inervación con el objetivo de que se recupere el espacio.	Entidades participantes en el Comité
03. Marzo-2023	**402**	el día 6 de marzo se envió al chat un caso en la Calle 3 con 60 donde se solicitó la limpieza del canal	EAAB
03. Marzo-2023	**403**	nos encontramos haciendo una revisión en el proyecto Demarcación Cartográfica de la zona de reserva para el desarrollo de los proyectos “Nodo de equipamiento Altamira” y Nodo de equipamiento La Gloria, nosotros hacemos una revisión urbanística de la estructura funcional y del cuidado para poder generar este tipo de reservas, en temas de servicios públicos lo que aparece reportado por Enel es que hay una red de media tensión es aérea cuando se hace la verificación de visores, pregunta para Enel es si existe una impresión geográfica para esta área o si la red fue traslada y no fue reportada, solicita confirmación a Pablo Ponce.	ENEL COLOMBIA
03. Marzo-2023	**404**	solicitud al acueducto zona 5 sobre un caso reportado en marruecos Calle 50 A Sur No. 7 – 64, requiere que atienda visita en este sector.	EAAB - Zona 5
03. Marzo-2023	**405**	Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU	ETB
03. Marzo-2023	**406**	solicitud para las empresas ENEL Colombia, Vanti, ETB y Acueducto, están por iniciar dos proyectos un parque de bolsillo en la Calle 7 con Carrera 3 y uno de espacio público en la Calle 12C entre 1A y Carrera 3 desde la Calle 12B hasta la Calle 12D, requerimos acompañamiento de las empresas con el objetivo de generar un diagnóstico de redes para que el contratista las tenga en cuenta, la semana pasa se enviaron las solicitudes, pero no se ha obtenido respuesta, pregunta que si por medio de este comité se puede generar la cita.	Entidades participantes en el Comité
03. Marzo-2023	**407**	Requerimiento para Enel Colombia, estamos en ejecución de un proyecto de mantenimiento de andenes Calle12B entre Carrera 2 y Carrera 3 hay una caja de una tapa de Codensa que está en pésimo estado, quisiera saber cómo hacemos el requerimiento para tener esa tapa en buen estado.	ENEL COLOMBIA
03. Marzo-2023	**408**	presenta requerimiento para la zona 1 de acueducto con el ing. Mauricio Mahecha, donde un ciudadano reporta una queja indicando que hace más de dos meses la empresa de acueducto rompió e hizo una zanja frente al predio de la Carrera 46 No. 138 – 53 y no se ha recuperado, para que por favor zona 1 investigue a que contrato pertenece.	EAAB - Zona 1
03. Marzo-2023	**409**	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área	SDM

		específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	
04. Abril-2023	**410**	En la Carrera 62 con Calle 62 hasta la Calle 64 en el barrio Santa Rosa Sur hay cuatro segmentos viales que no cuentan con alcantarillado pluvial, se solicita apoyo a la EAAB, la comunidad manifiesta que en ocasiones se ha generado inundación en sus predios.	EAAB - Zona 4
04. Abril-2023	**411**	El año pasado se presentaron unas solicitudes de factibilidad a ENEL para el servicio en Betania y San Juan. Se hicieron visitas técnicas y nos informaron que para Betania se tenían que hacer unas adecuaciones eléctricas que ya se están estudiando dentro de una formulación. Sin embargo, quedó pendiente el tema de San Juan, indica que de esas visitas no recibió acta, adicionalmente desconoce si la información fue recibida por ingenieros y arquitectos que ya no están en el fondo, es decir que se perdió la trazabilidad del caso, pregunta si es posible que de parte de ENEL que le remitan las actas de esas visitas técnicas.	ENEL COLOMBIA
04. Abril-2023	**412**	El FDL de Chapinero el marco del Decreto Distrital 168 del 2021 ha solicitado la asistencia técnica tanto a empresas de Servicios Públicos como entidades distritales, sin embargo algunas de estas entidades no nos han dado respuesta, es muy importante contar con los delegados de cada entidad para poder llevar a cabo las mesas de trabajo de asistencia técnica teniendo en cuenta que en los estudios y diseños que existen en el banco del FDL de Chapinero se prevé la subterranización, traslado y protección de redes de servicios públicos perteneciente a los activos de cada empresa. Se han adelantado algunas mesas de trabajo con algunas entidades distritales, sin embargo en este momento estamos a la espera de los delegados de la Secretaría Distrital de Planeación por parte de la Secretaria Jurídica, IDU, Claro , ENEL Colombia, IDPC , Movistar, Promo ambiental, Catastro, Une EPM, Grupo Energía Transición, DADEP, Requerimiento N. 2 Al IDU y Secretaría Distrital de Hábitat. En el mismo correo donde se envió la invitación a la convocatoria se va a enviar estos oficios con los acuses de recibido por parte de cada una de estas empresas y entidades, con el objetivo de contar con la asistencia tecina y respuesta oportuna a los procesos de formulación del FDL de Chapinero.	IDU
04. Abril-2023	**413**	El contrato 159 de 2022 etapa preliminar, necesitamos iniciar unos trámites: Acueducto, ENEL Colombia y IDPC, por parte del IDPC estamos en trámite, al Acueducto se solicita visita para revisar el tema de CCTV de las redes.	EAAB - Zona 2
04. Abril-2023	**414**	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	SDM
04. Abril-2023	**415**	Solicitud al Ing. Pablo Ponce para que por favor nos ayude a evaluar el cobro de energía de la planta la esmeralda, la sede de producción, nos llegó un cobro por 235 millones de pesos, estamos un poco ilíquidos, de acuerdo con una revisión que hizo uno de los contratistas de ENEL para avaluar el cobro se dio cuenta que en algún momento el consumo de energía había bajado y establece que como es una sede industrial entonces nosotros producimos todos los días las mismas cantidades y no es así , hay meses donde no tenemos la mezcla de agregados y donde la producción baja, ya le escribí al Ing. Pablo Ponce no me ha contestado voy a reiterar a ver cómo nos puede ayudar para ver a quien le respondemos el requerimiento y si nos dan plazo para pagar eso.	ENEL COLOMBIA
04. Abril-2023	**416**	Corresponde a la filtración de aguas residuales entre la transversal 19 y calle 46 sur donde se ubica la central de ETB San Carlos, hay una filtración de aguas residuales que está llegando a la red de ETB y está ingresando al predio San Carlos y está generando malos olores adicionalmente está afectando al colegio Bernardo Jaramillo, no sabemos si hay un tubo roto conexión errada o alguna que está ocasionando esta problemática.	EAAB - Zona 4
04. Abril-2023	**417**	Para EAAB – Zona 3, tenemos una filtración en una caja de paso en la Calle 36H Sur N°. 11A-08, se requiere una visita conjunta con la empresa para verificar los daños, se precisa de manera urgente pues corresponde al desagüe de una caja de paso sencilla y sobre la misma se ha presentado derecho de petición.	EAAB - Zona 4
04. Abril-2023	**418**	En la calle 127 con 13A, la semana pasada se informó al delegado de EAAB - Zona 1, sobre una filtración de agua, allí enviaron personal, pero dijeron que no era del alcance de ellos. Sin embargo, ETB está preparando la cámara y arreglando todo lo que le corresponde, no obstante, la filtración continúa. Por lo cual, se le requiere a la EAAB que revise la filtración y solucione este inconveniente.	EAAB - Zona 1

04. Abril-2023	**419**	Evento SIRE 5414763, frente al predio ubicado en la calle 63A #68G-30, barrio Bosque Popular, localidad de Engativá, CIV 10009654 PK ID 1475178, se reporta socavación de 1.00X1.00 metro cuadrado y profundidad de aproximadamente 1.00 metro, es posible que se deba a un daño en la red de la EAAB, lo cual potencia la ocurrencia de accidentes. Se solicita visita de esta ESP, y que se tomen las medidas correspondientes, desde la UMV se reitera apoyo.	EAAB - Zona 2
05. Mayo-2023	**420**	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renivelación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	ETB
05. Mayo-2023	**421**	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	ETB
05. Mayo-2023	**422**	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal manera, la Alcaldía necesita llegar el día 30 de junio con internet al predio, pero este requerimiento ha sido dilatado, porque no se tiene una respuesta real de si podemos hacer la instalación subterráneamente o aérea.	ETB
05. Mayo-2023	**423**	Para EAAB – Zona 1, se solicita realizar visita y medidas tendientes a reparar socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente – occidente.	EAAB - Zona 1
05. Mayo-2023	**424**	Para SDM, respecto de la respuesta a solicitud de aprobación de PMT, se indica que en el mes de febrero se radicaron 76 puntos, en marzo 265 y en abril 150, para un total de 491 puntos pendientes, sobre los cuales no se ha recibido respuesta, es importante precisar que no nos han hecho observaciones, entonces queremos saber que ha pasado con la respuesta, ya que se cuenta con aprobación del IDU y pagos.	SDM
05. Mayo-2023	**425**	Para Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3, respecto al caso de la afectación del circuito GRASCO, se solicita indicar a quién dirigir el tema del costo del daño a la infraestructura. Él contestó enviándole el caso a la ingeniera Magaly Leal, pero no se ha tenido respuesta de a quién se le transfiere el costo del daño del circuito.	EAAB - Zona 3
05. Mayo-2023	**426**	Se solicita acta de coordinación al Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB - Zona 3, se ha requerido de manera reiterativa desde enero, toda vez que se esta solicitando por una acción de tutela y a la fecha no se ha tenido respuesta al respecto.	EAAB - Zona 3
05. Mayo-2023	**427**	Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalizarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer. Hoy estarán enviando el oficio a SDM, para que se considere la señalización de vías ejecutadas por el FDL.	SDM
05. Mayo-2023	**428**	Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.	SDA
05. Mayo-2023	**429**	Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.	SDA
05. Mayo-2023	**430**	Para EAAB-Zona 3, se tiene programada la intervención para cambio de carpeta y mejoramiento de andenes por parte de la UMV en el tramo vial de la carrera 26 entre calle 44 sur y diagonal 45A sur, no obstante, en el proceso de socialización, indica la comunidad que la EAAB adelanta un trabajo de	EAAB - Zona 3

		construcción de cajas de inspección y posible renovación de la red de acueducto, por lo cual se requiere coordinar actividades.	
05. Mayo-2023	**431**	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una reunión que se llevó acabo ayer (10-mayo-2023), en el tramo de la carrera 18 B entre calle 145 y 146. Allí la UMV va a intervenir, pero según lo informado por la dirección de la obra (Ing. Rafael Pérez) hay problemas de drenajes, entonces, se solicita a la EAAB evaluar el caso de manera conjunta y llegar a una posible solución. En la reunión estuvo José Casallas y Jairo García de la EAAB, por lo que conocen este caso y se solicita sea comunicado al Ing. Mauricio Mahecha.	EAAB - Zona 1
05. Mayo-2023	**432**	Para ENEL Colombia, se relaciona con una cámara localizada en la calle 147 # 9-60, presencia de hueco que al observar con más detalle se encuentra que la base donde se apoya la tapa en dicha cámara se encuentra dañada generando una diferencia de altura, la cual al pasar un vehículo produce un efecto de rebote y a su vez las vibraciones dañando tanto la estructura de la cámara como la del pavimento adyacente a la misma.	ENEL COLOMBIA
05. Mayo-2023	**433**	Para EAAB – Zona 2, se requirió mediante correo electrónico del 10 de abril de 2023, respuesta por parte de la EAAB para arreglo de las canalizaciones que fueron afectadas durante los trabajos de reparación de la red de acueducto ejecutados por la Zona en la Carrera 73A por Calle 80 costado Este-Sur. Lo anterior en razón a que, en visita de la ETB, se encontró tapada la excavación y no hay evidencia de que la infraestructura haya sido reparada.	EAAB - Zona 2
05. Mayo-2023	**434**	Para EAAB –Zona 1, se reporta daño bastante fuerte en la KR 7 con CL 165 (Circuito Babilonia), se requiere conocer a quién se le reporta documento de daño a infraestructura de ENEL.	EAAB - Zona 1
05. Mayo-2023	**435**	Para IDU, el requerimiento presentado consiste en la obra que requiere adelantar Movistar frente a una de sus oficinas, el día de ayer la interventoría del contrato 1791, respondió que el acta de recibo definitivo no ha sido emitida para el inicio de la garantía, por tanto, no se pueden ejecutar obras adicionales. En adición, se observa que la ejecución se realizó sobre la ciclorruta y se requiere intervenir en un área diferente a este sector.	IDU
06. Junio-2023	**436**	Para EAAB Zona 3, frente a la reconstrucción de la red sanitaria y pluvial del segmento vial CIV 16001178 – KR 44 entre CL 4F y CL 4F Bis, la red estaba en contrapendiente, y debería ir de norte a sur, hacia el costado del parque, se solicitó nuevamente revisión por CCTV porque al parecer la red debería estar de sur a norte, ayer se entregó las grabaciones al Ing. Francisco, pero se requiere una definición pronta al respecto de la red, ya que se tiene caja abierta y la maquinaría se encuentra en stand by.	EAAB - Zona 3
06. Junio-2023	**437**	Para ETB, sobre la calle 4F se tiene un cámara al parecer de telefonía, no obstante, se encuentra con marcación de EPM, la cual afecta la red pluvial del proyecto. Se solicita apoyo al respecto. Se encuentra cercano al CIV 16001178 – KR 44 entre CL 4F y CL 4F Bis y el contrato del cual hace parte es el 263 de 2022, contratista CONSORCIO INGESEM 2022.	MOVISTAR
06. Junio-2023	**438**	Para EAAB – Zona 3, se solicita apoyo con un equipo de vactor en la carrera 17 con Calle 17 Sur sobre la carrera, se tiene alta colmatación en los sumideros y con la llegada de la temporada de lluvias, genera afectaciones en la comunidad.	EAAB - Zona 3
06. Junio-2023	**439**	Para ENEL Colombia, se relaciona con un daño en el alumbrado público del puente curvo de la carrera 11 entre calle 106 y 109, sitio en el cual hay una zona de ciclo ruta, se tiene una queja de la comunidad al respecto, ya que se genera alta inseguridad para quienes transitan en el sector.	ENEL COLOMBIA
06. Junio-2023	**440**	Para EAAB, en la carrera 69B con calle 17 en el costado nororiental se encontraron dos cámaras con cables y canalizaciones afectadas por obras de la EAAB. Se solicita visita para verificar y atender los daños.	EAAB - Zona 3
06. Junio-2023	**441**	Para EAAB, respecto a una solicitud de reposición de tapa en pozo ubicado en la Avenida Ciudad de Cali con calle 20, ya que según reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad se reportan faltantes de tapas, y al realizar la visita se encontró pozo de la EAAB sin este elemento.	EAAB - Zona 3
06. Junio-2023	**442**	Para ENEL, respecto a una solicitud de reposición de tapa en cámara ubicada en la Avenida Ciudad de Cali con calle 20, ya que según reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad se reportan faltantes de tapas, y al realizar la visita se encontró cámara de ENEL sin este elemento.	ENEL COLOMBIA

06. Junio-2023	**443**	Para SDA, frente al contrato FDL RU 281 de 2019, se realizó radicación N°. 2021ER143989, donde se programan y efectuan visitas con funcionario de la SDA, contratista e interventoría. De estos recorridos se solicita generar modificaciones, y nuevamente se radica a la Entidad con número 2022ER173992, no obstante, a la fecha no se ha generado respuesta y desde el Fondo de Desarrollo Local se han remitido diversos comunicaciones sin pronunciamiento por parte de SDA. Este contrato lleva aproximadamente suspendido desde febrero del año pasado porque se requiere respuesta de Secretaría Distrital de Ambiente, para definir lineamientos y precisar la terminación.	SDA
06. Junio-2023	**444**	Para ENEL Colombia SA ESP, se solicita recorrido para expansión de alumbrado público en el parque Sarasota de la localidad de Rafael Uribe, se remitió comunicación de manera previa a través de radicado 20216823134.	ENEL COLOMBIA
06. Junio-2023	**445**	Para ENEL Colombia SA ESP, se está adelantando la ejecución de un contrato de obra, en este momento se encuentra finalizando la etapa de estudios y diseños, en general se han logrado los objetivos propuestos con cada ESP como los inventarios de redes existentes en el área de intervención, no obstante, ha sido muy difícil entablar comunicación fluida con ENEL, se han efectuado varios requerimientos y las respuestas recibidas señalan que “nuestra solicitud está en evaluación”, sin emitir respuesta de fondo a los requerimientos.	ENEL COLOMBIA
06. Junio-2023	**446**	Para EAAB, corresponde a un reporte realizado en el chat grupal el 26 de mayo de 2023, se refiere a una afectación vial localizada en la KR 10 con Av. Jiménez, se asocia a posibles daños en red de la EAAB.	EAAB - Zona 3
06. Junio-2023	**447**	Para EAAB, corresponde a un reporte efectuado en el chat grupal el 29 de mayo de 2023, se asocia a un daño en la carrera 16 con calle 138, se efectuó intervención y no fue recuperado el pavimento.	EAAB - Zona 1
06. Junio-2023	**448**	Para EAAB – Zona 1, respecto a la Avenida Ciudad de Cali con calle 134, se informa que son obras de redes donde su contratista dejó abandonada la intervención, son alrededor de 80 metros y la EAAB está solicitando que la UAERMV apoye con la terminación de esta obra. Se realizará la visita, pero la posición de apoyar el requerimiento en el momento es casi nula.	EAAB - Zona 1
06. Junio-2023	**449**	Para VANTI, con respecto a un CIV en Alameda en la CL 63 Bis Sur entre carrera 74 H y 74F, solicita coordinar una visita de acompañamiento para tratar temas especificos en el punto. La obra fue reportada por medio de un oficio via correo electrónico informando las intervenciones y ubicación al inicio del contrato. Por otro lado, se realiza requerimiento frente a cinco puntos más en donde se van a abrir nuevos frentes de obra y solicita coordinar aspectos con VANTI. Se enviará correo electrónico para programar las visitas respectivas.	VANTI GAS NATURAL
06. Junio-2023	**450**	Para EAAB, corresponde a un reporte realizado en el chat grupal el 5 de junio de 2023, se refiere a una vía en mal estado en la vía CL 140 en el sector de la KRA 15 debido a que se llevó a cabo una intervención efectuada por la EAAB y no se realizó la recuperación del pavimento.	EAAB - Zona 1
06. Junio-2023	**451**	Para UAESP y ENEL, respecto a la localidad de Fontibón en la calle 24 A frente al # 81-37, en la casa cural, de la iglesia de Modelia, el párroco solicita le instalen una luminaria ya que hay un poste, pero no tiene luz y el sector se ha venido tornando peligroso.	ENEL COLOMBIA
06. Junio-2023	**452**	Se solicita a ENEL Colombia SA ESP, que por favor deleguen a una persona para llevar a cabo las coordinaciones y los acercamientos a los que haya lugar en cumplimiento del principio de planeación y ley de infraestructura, frente a la etapa de formulación de los proyectos que tiene en curso el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.	ENEL COLOMBIA
06. Junio-2023	**453**	En el desarrollo del contrato 289, se llegó a la etapa de liquidación, y se están tramitando los certificados de “paz y salvo” con la EAAB, el día 16 de mayo de 2023 se remitió comunicación, pero no se ha logrado una coordinación con el líder de zona 1 y 2, el número de radicado es E-2023-047187, se solicita una respuesta oportuna. Se requiere visita de manera efectiva, para lograr liquidar, se han recibido recomendaciones de hacer nuevamente un oficio y radicar una reiteración en la EAAB, especialmente para zona 1, no obstante, se espera coordinar a través de esta instancia.	EAAB - Zona 1

06. Junio-2023	**454**	En el marco de la ejecución del contrato 327 de 2023, se realizó la solicitud de visita técnica en campo a ENEL Colombia SA ESP, y a la fecha no se ha recibido respuesta, por lo cual se solicita un contacto para gestionar los requerimientos del contrato. Adicionalmente se informa que el radicado de la solicitud a ENEL es 000537380 del 23 de mayo de 2023.	ENEL COLOMBIA
06. Junio-2023	**455**	Para EAAB-Zona 1, el FDL de Usaquén se encuentra liquidando el contrato N°. 175 de 2022, por lo cual se encuentran en proceso de obtener los certificados de “paz y salvo” por parte de las empresas de servicios públicos, de tal manera, se requiere respuesta por parte de la EAAB-Zona 1, el radicado es E-2023-045253 del 10 de mayo de 2023.	EAAB - Zona 1
06. Junio-2023	**456**	Para ETB, en la carrera 75 con calle 24, la UAERMV está realizando trabajos de rehabilitación, en una actividad se generó daño en red de fibra óptica de ETB que se encontraba superficial, se requiere conocer si la Gerencia de Intervención se comunicó con Benjamín Ochoa para efectuar reparación temporal.	ETB
06. Junio-2023	**457**	Para EAAB-Zona 5, se compartió el día de ayer un reporte correspondiente a daño sobre una cámara telefónica de ETB localizada en límite entre Bosa y Soacha, se solicita socializar situación con delegado correspondiente, para que se realice la reparación o se reciba factura con costo de los daños, adicionalmente se señala que al tener expuesto los cables telefónicos, pueden ser objeto de vandalismo y/o generar algún tipo de accidente.	EAAB - Zona 5
06. Junio-2023	**458**	Para EAAB-Zona 5, se reporta segmento vial que salió en las noticias, está ubicado en la CL 26 S Entre KR 73 B BIS Y KR 73 C, se evidenció una socavación aparentemente por daño de redes, se intervino en marzo de 2022 en el Convenio 389 de 2020 entre el Fondo De Desarrollo Local de Kennedy y UMV, no obstante, no se puede adelantar parcheo hasta tanto se realice revisión y reparación de redes.	EAAB - Zona 5
07. Julio-2023	**459**	Para EAAB – Red Matriz, se requiere validación de daños generados por las obras de la manija de Tibitoc, en la Av. Boyacá con Calle 10B, se envió correo electrónico a Fabián Restrepo (contratista de la obra), pero no se ha obtenido ningún tipo de respuesta, por tanto, se requiere escalar con delegado de EAAB.	EAAB – Red Matriz
07. Julio-2023	**460**	Para SDA, se solicita respuesta a requerimiento radicado 2023ER97832 (SDP 2-2023-45032), en aras de obtener concepto actualizado de determinantes ambientales y continuar con el debido trámite del Plan Director Bosques del Mediterráneo.	SDA
07. Julio-2023	**461**	Para EAAB-Zona 5, se solicita respuesta de fondo al requerimiento radicado en la EAAB como E-2023-054108, donde a la fecha se emitió concepto de salida S-2023-143100, señalando que allí se ubica un plan parcial, lo cual es del conocimiento de esta Secretaría, se ha aclarado y reiterado que el plan director hace parte del plan parcial, y, por tanto, se requiere un nuevo concepto. Toda vez que el concepto de viabilidad del plan parcial, ya venció (tenía vigencia de 3 años) y no se puede avanzar con otros instrumentos que hacen parte del plan hasta tanto se actualice concepto por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 5
07. Julio-2023	**462**	Para SDA, se realizaron varios requerimientos para cierre de PINES AMBIENTALES: 19817 con radicado 2023ER977455, 19879 con radicado 2023ER97478, 18724 con radicado 2023ER97479, 21178 con radicado 2023ER97480, la solicitud se efectuó hace más de tres meses, lo cual representa un valor de aproximadamente 3000 millones, afectando las obligaciones por pagar, y siendo contratos que están próximos a fenecer, es un tema urgente para el FDL. Se hizo reunión en la Alcaldía Mayor hace 8 días, invitando a Secretaría Distrital de Ambiente, pero no se muestra ninguna disposición para avanzar.	SDA
07. Julio-2023	**464**	Se presenta requerimiento para VANTI, respecto al traslado de una red de polietileno de 1” en el sector de Gualoche que se instaló sobre la vía. Se han realizado visitas por parte de VANTI, pero se requiere consolidar el traslado de la red a un costado del andén, generando retrasos en el proceso constructivo.	VANTI GAS NATURAL
07. Julio-2023	**465**	Para IDU, Requerimiento respecto al contrato 1311 correspondiente a sumideros, del cual no se ha podido cerrar el recibo de vías por parte del IDU, el contratista ya entregó los documentos radicados de acuerdo con lo conversado. Coordina una visita al IDU con el ing. Álvaro Reinoso ya que para ese contrato se vencen los términos próximamente.	IDU
07. Julio-2023	**466**	Para SDM, respecto al contrato 391 de 2022, se solicita mesa de trabajo para revisar temas pendientes de aprobación de diseños de señalización horizontal	SDM

		y vertical en 15 segmentos viales. Radicado a SDM: 202361202283602 (Aprobación de diseño de Señalización.) Así mismo, una concertación respecto a estudios técnicos requeridos, en la intervención propuesta que corresponde a cambio de barandas de puentes; SDM ha solicitado estudio de comportamiento hídrico, geología. Etc. Por tanto, se plantea realizar una mesa de trabajo con SDA porque el FDL no cuenta con presupuesto para todos los estudios que son solicitados.	
07. Julio-2023	**467**	Para EAAB-Zona 3, se solicita cambio de rejillas de cárcamo ubicado en la calle 23C entre carrera 118A y 117A, las rejillas existentes fallaron. Se ha radicado solicitud de remplazo, pero no se ha recibido respuesta al respecto.	EAAB - Zona 3
07. Julio-2023	**468**	Para EAAB-Zona 3, se solicita revisión y reparación de pozo de inspección que presenta hundimiento en calzada localizado en la calle 21 entre carrera 91 y carrera 93, también se ha realizado traslado derivado de derechos petición, no obstante, no se ha recibido respuesta.	EAAB - Zona 3
07. Julio-2023	**469**	Para ENEL, se tiene solicitud por parte de contratista S y S ingeniería, que termino contrato el 21 de mayo de 2023 con el FDL de Fontibón, ha solicitado certificación de “paz y salvo” y no ha recibido respuesta.	ENEL COLOMBIA
07. Julio-2023	**470**	Para VANTI, se tiene solicitud por parte de contratista S y S ingeniería, que termino contrato el 21 de mayo de 2023 con el FDL de Fontibón, ha solicitado certificación de “paz y salvo” y le han informado que no es posible emitir certificación de “paz y salvo” porque se tiene pendiente el pago de un daño, se ha solicitado factura, pero no se ha emitido respuesta.	VANTI GAS NATURAL
07. Julio-2023	**471**	Para SDA, se solicita apoyo del delegado para realizar cierre de los siguientes pines ambientales, los cuales cursan trámite en la Entidad: COP 314-2021: 2022ER150964, COP 290-2018: 2022ER320627, COP 291-2018: 2022ER295400, COP 317-2021: 2022ER168259.	SDA
07. Julio-2023	**472**	Para SDA, respecto al contrato 391 de 2022, se presentan una serie de observaciones con el permiso de ocupación de cauce (Radicado SDA 2023EP74478 del 30 de marzo de 2023), el cual es requerido para intervenir puentes peatonales y vehiculares que cruzan por cauces de agua. Se precisa una revisión previa, puesto que al contrato le queda solo un mes de ejecución y se solicita información especializada.	SDA
07. Julio-2023	**473**	Para EAAB-Zona 2, se solicita respuesta a requerimiento de “paz y salvo” para parques donde se efectuó mantenimiento por parte del FDL, el radicado de entrada es E-2023-038775 del 25 de abril de 2023.	EAAB - Zona 2
07. Julio-2023	**474**	Para SDA, se solicita respuesta a requerimiento de “cierre del PIN Ambiental N°. 21870” para parques donde se efectuó mantenimiento por parte del FDL, el radicado de entrada es 2023ER129015.	SDA
07. Julio-2023	**475**	Para Claro, se solicita respuesta a requerimiento de “paz y salvo” para contrato 396 de 2022 de INCITECO.	CLARO
07. Julio-2023	**477**	Para EAAB-Zona 4, respecto a un daño evidenciado en la calle 55 sur con carrera 17 – CIV 6001412 PK 324192, la UAERMV está realizando intervención en el marco del programa de barrios vitales en la localidad de Tunjuelito, se observó un escape de agua, se solicita atención por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 4
07. Julio-2023	**478**	Para IDU, se solicita el cierre de la licencia de excavación N°. 173 de 2020, así mismo, se requiere informar al delegado de la EAAB si hay alguna observación o respuesta al contratista, se anexa radicado IDU 20235260604902.	IDU
07. Julio-2023	**479**	Para EAAB-Zona 1, se indica que existe una filtración de agua potable sobre cámara de ETB ubicada en la Autopista Norte con Calle 125, se requiere atender con urgencia y que se realice la recuperación respectiva por parte de la EAAB.	EAAB - Zona 1
07. Julio-2023	**480**	Para EAAB-Zona 3, se informa de la subestación de Fontibón que se realizará la intervención prioritaria de un interruptor, y se requiere desenergizar en la PTAR localizada en la calle 27 con carrera 96.	EAAB - Zona 3
07. Julio-2023	**481**	Para la Alcaldía de Engativá, el área operativa de la EAAB encontró unas obras que ejecutó un particular, se observa conexión de una domiciliaria de alcantarillado en la KR 90 Bis N°. 69A-18 de la localidad de Engativá, se presentó afectación del espacio público sobre calzada e intervención no autorizada sobre las redes.	Alcaldía Engativá

08. Agosto-2023	**482**	Para EAAB – Zona 2, se reporta daño en la Avenida Circunvalar con Calle 59 por posible fallo en infraestructura de la EAAB, se remitió por chat de la instancia el pasado 25 de julio.	EAAB - Zona 2
08. Agosto-2023	**484**	Se presenta tema pendiente con VANTI – Gas Natural, y que se ha venido adelantando con el profesional Mauricio García, se informa que se encontró una red de 4" en acero, instalada posiblemente a través de perforación dirigida, afectando una descarga de domiciliaria de 6" en un predio localizado en la Calle 5B con carrera 73C, aunque ya se tiene conocimiento de la situación a resolver, se solicita quede consignado en el acta y se de seguimiento al caso, ya que se pueden generar situaciones de riesgo a los ciudadanos y daños mayores sobre el sector.	VANTI GAS NATURAL
08. Agosto-2023	**485**	Se reporta hundimiento en la calle 39 sur con carrera 72J – barrio Carimagua, se solicita que VANTI – Gas Natural indique si la válvula quedó instalada conforme a sus especificaciones técnicas, ya que en ejecución de obra efectuada por la EAAB se encontró red de gas en eje de intervención, así como poste de media tensión de 11400 V, por lo cual se recibió apoyo de ENEL Colombia.	VANTI GAS NATURAL
08. Agosto-2023	**486**	Para EAAB – Zona 4, en la calle 55 sur con carrera 17 se reitera solicitud para que la EAAB repare daño en una zona por intervenir de la UMV.	EAAB - Zona 4
08. Agosto-2023	**487**	Para EAAB – Zona 2, en la carrera 56 entre calle 5 y calle 5B, se presenta red de alcantarillado con obstrucción, se requiere apoyo sobre este tramo ya que la UMV realizará intervención.	EAAB - Zona 2
08. Agosto-2023	**488**	Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema, el tema ha sido informado a Nubia Riaño, pero no se ha recibido respuesta.	EAAB – Red Matriz
08. Agosto-2023	**489**	Para EAAB – Zona 3, evento SIRE 5419995 ubicado en el barrio Rocío Centro Oriental, TV 7A Bis Este entre calle 3 y calle 2c, se presentó falla en el pavimento en un área aproximada de 4 m2, se observa socavación alrededor de pozo por posible filtración y lavado de finos.	EAAB - Zona 3
08. Agosto-2023	**490**	Para EAAB – Zona 3, evento SIRE 5419922, localizado en la calle 5C entre KR 70 y 70C, se presenta daño en calzada por posible daño en redes que genera lavado de finos.	EAAB - Zona 3
08. Agosto-2023	**491**	Desde el mes de marzo se han sostenido varias comunicaciones con la Secretaría Distrital de Movilidad al respecto del cumplimiento de la meta de inversión pública del proyecto de mantenimiento y/o conservación de ciclo infraestructura de la localidad, precisando que el Fondo de Desarrollo Local cuenta con los recursos para atender 6 segmentos que se localizan sobre el río Fucha. Por su parte SDM a través del profesional Miguel Forero de la Subdirección de Bicicleta y el Peatón ha expresado que existe un convenio interadministrativo entre SDM y UAERMV para el mantenimiento y señalización del corredor de ciclo infraestructura sobre el río Fucha; donde la UAERMV realizó la recuperación del pavimento, pero en los que faltan las actividades de señalización, por lo cual se expresó a SDM la posibilidad de realizarlo con recursos del FDL. Al respecto, SDM observa viable que el FDL haga la inversión de recursos para implementar la señalización faltante sobre los segmentos viales, no obstante, se requiere pronunciamiento por parte de la UAERMV y a su vez, que efectué levantamiento de la reserva en el aplicativo SIG IDU. Se remite radicado SDM 202361202915592, al respecto de este tema, y se solicita informar avances del caso.	SDM
08. Agosto-2023	**492**	Para la EAAB-Zona 4, se solicita respuesta de los radicados E-2023-062631 y E-2023-076559, correspondiente a solicitud de NO objeción a los diseños cercanos al Canal Río Seco.	EAAB - Zona 4
08. Agosto-2023	**497**	Para IDU, solicitud de información para revisar el contrato en donde se realizó la intervención del espacio público en la calle 53 con carrera 25 en el sector de Galerías, en ese punto hay dos predios identificados con nomenclaturas	IDU

		25-35 y 25-los cuales están presentando problemas de drenaje, ya que al parecer el IDU en su momento afectó las conexiones. Requieren apoyo por parte del IDU para obtener información de los contratos y así mismo de quien ejecutó la obra en su momento.	
08. Agosto-2023	**499**	Para ENEL, en el sector de Zona rosa en un predio de la AV CRA 15 # 82 30 el cual presenta problemas de drenaje de Aguas residuales en donde al momento de realizar la inspección no se encontró la caja de conexión domiciliaria. En dicha inspección se encontró al parecer una cámara de ENEL la cual también funciona como caja de conexión domiciliaria de alcantarillado. Solicita conocer quién es el responsable de las redes y coordinar una visita para verificar si la caja está siendo utilizada con una doble función ya que está en riesgo la prestación de los servicios públicos.	EAAB - Zona 2
09. Septiembre-2023	**501**	Para Movistar, se están realizando trabajos en el barrio San Luis en la localidad de Chapinero en donde se van a intervenir unas vías, pero hay infraestructura de Movistar, solicita coordinar una visita técnica para ejecutar la obra de manera efectiva y no afectar las redes de Movistar.	MOVISTAR
09. Septiembre-2023	**502**	Para IDU, en el predio de la AV carrera 68 # 68B – 61 el cual pertenece al concesionario de Motoriza solicita por medio del contratista hacer la reubicación de una caja que hace parte del sistema de alcantarillado de dicho predio. Indica que en el año 2022 gracias a la verificación de Google Maps, se puede observar que la caja se encontraba ubicada dentro del andén pero que debido a obras de ampliación realizadas por IDU en la calzada oriental para el proyecto Avenida 68, este dejó la caja domiciliaria en la calzada. La caja no está hecha para soportar cargas de tráfico y por lo tanto debe estar ubicada sobre el andén.	IDU
09. Septiembre-2023	**503**	Para Vanti, La Alcaldía de Rafael Uribe solicita la instalación de servicio de gas para unas viviendas y no se han realizado. El FDL de Rafael Uribe hizo la solicitud por correo electrónico, pero no han obtenido respuesta.	VANTI GAS NATURAL
09. Septiembre-2023	**505**	Para VANTI, solicita tener acceso a algunos de los planos de redes de VANTI para obras a ejecutar. Se hará la solicitud vía correo electrónico.	VANTI GAS NATURAL
09. Septiembre-2023	**506**	Para UMV, solicita una reunión con UMV para tratar el reporte de un daño en calle 78C # 17 f - 47 vía al Mochuelo ya que hay un daño en la acometida de EAAB	UMV
09. Septiembre-2023	**507**	Para SDM, solicita aclaración para unos trámites de pmt que están realizando ya que han recibido varias objeciones respecto al los sectores patrimoniales los cuales hacen parte del IDPC.	SDM
09. Septiembre-2023	**508**	Para ENEL, solicita información respecto a unas cámaras de Enel que no tienen tapas, requiere un correo de contacto para hacer la gestión.	ENEL COLOMBIA

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
-Casos presentados	365	**100,00%**	143	**100,00%**
-Casos resueltos al corte	255	**69,86%**	47	**32,87%**
-Casos pendientes al corte	110	**30,14%**	95	**67,13%**

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras

de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver cinco (5) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 463, 476, 493, 496 y 498.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver cinco (5) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional los números 463, 476, 493, 496 y 498.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8 COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 21-septiembre de 2023
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Data Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 21-septiembre de 2023
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (virtual o presencial).	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 21-septiembre de 2023

9 CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye la sesión número treinta y tres **(33)** del Comité para la vigencia 2023, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 21 de septiembre de 2023 a las 8:30 am, de manera presencial y/o vía Google Meet.**

En constancia se firman,

WILLIAM RODRIGUEZ CASTELLANOS
PRESIDENTE

ANAMARIA SOLANO MONROY
SECRETARIA

Proyectó: Anamaria Solano M– SDP.
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte del Acta 33 de 2023.

Subserie 2131-2.14

Comité Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. - 2023

Consulta por Entidad que presentó el caso

Consulta por Entidad Responsable

Mes reporte del caso

Tema de la solicitud

Número de casos registrados por mes

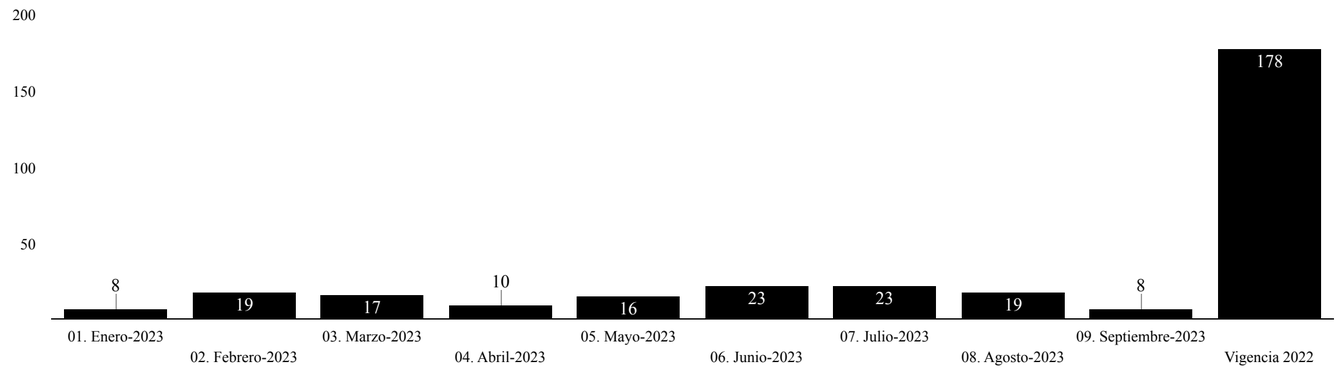

N°. de casos registrados

321

Número de casos resueltos por mes

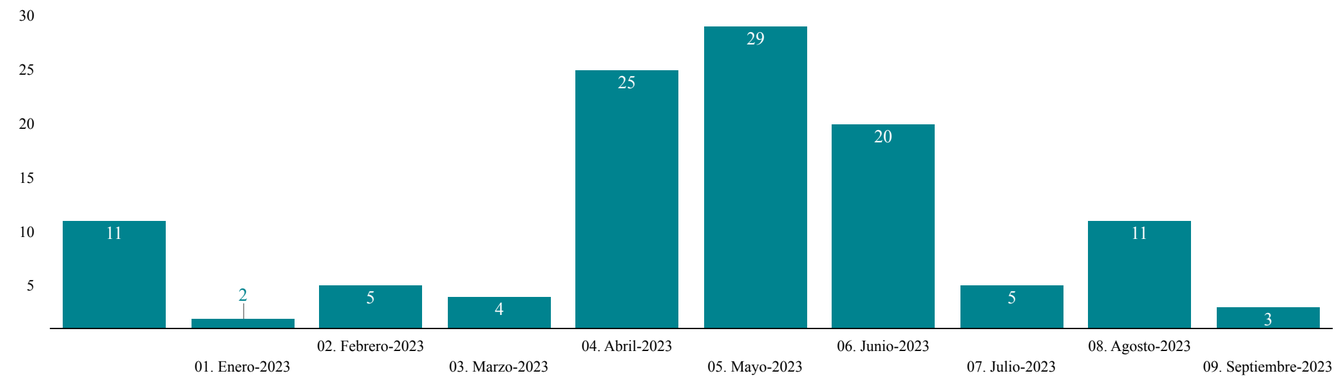

N°. de casos resueltos

115

Porcentaje de avance

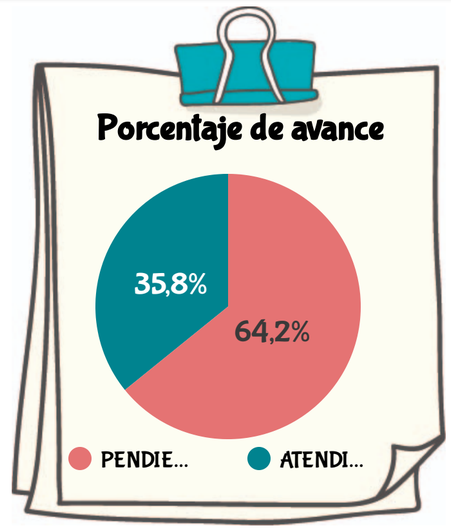

Número de casos pendientes por mes

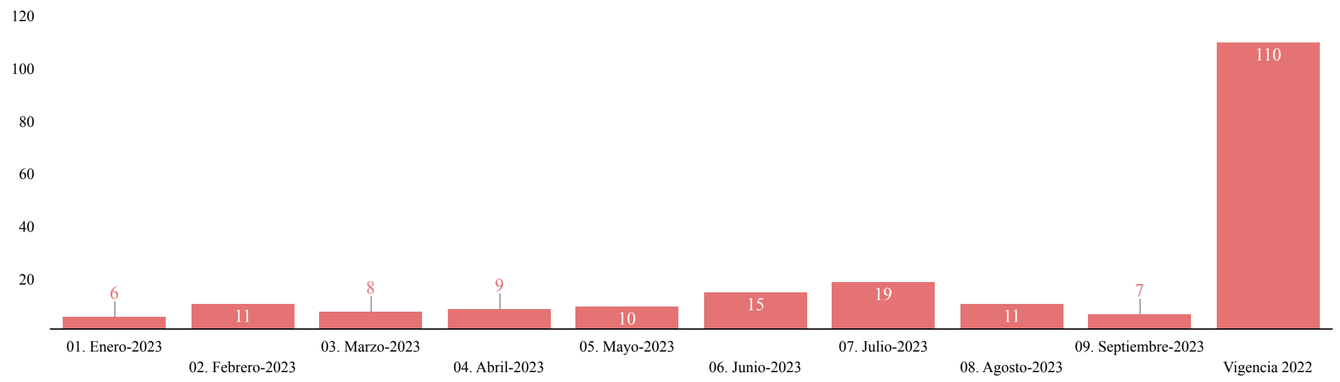

N°. de casos pendientes

206

TOP – Entidades más casos asignados

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	57
2.	EAAB - Zona 2	34
3.	IDU	28
	Total	**321**

1 - 30 / 30

TOP – Entidades con casos resueltos

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	24
2.	EAAB - Zona 3	16
3.	SDM	12
	Total	**115**

1 - 23 / 23

TOP – Entidades con casos pendientes

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	33
2.	IDU	26
3.	EAAB - Zona 1	22
	Total	**206**

1 - 24 / 24

Recuento de casos

N°. SESIÓN DE ...	N°. DE CA...	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO
02 - Enero 26 de 2023	366	UMV	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a rea…	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	369	IDU	Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero qu…	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
02 - Enero 26 de 2023	368	MOVISTAR	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontr…	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	367	MOVISTAR	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se pres…	IDU	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de …	372	SDG	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contr…	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de …	371	Alcaldía San Cristóbal	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022…	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de …	373	EAAB - Zona 4	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliairia del predio car…	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de …	370	ENEL COLOMBIA	Se solicita coordinación con entidades como Acuecuto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto…	Entidades participantes en el Co…	PENDIENTE
04- Febrero 09 de 2…	374	UMV	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carrera…	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05- Febrero 16 de 2…	376	MOVISTAR	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos:…	IDU	PENDIENTE
05- Febrero 16 de 2…	375	UMV	Se reporta hundimeinto en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05- Febrero 16 de 2…	377	Alcaldía Kennedy	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully …	IDU	ATENDIDO
06- Febrero 23 de 2…	380	VANTI GAS NATURAL	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón …	IDU	PENDIENTE
06- Febrero 23 de 2…	383	ETB	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Es…	SDP	ATENDIDO
06- Febrero 23 de 2…	382	ETB	Se reporta novedad en cámara de ETB con filtración de aguas negras en la Calle 20 No. 13 - 29 se deja registro en video por e…	EAAB - Zona 3	ATENDIDO
06- Febrero 23 de 2…	384	ETB	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	ATENDIDO

1 - 100 / 321

Casos:
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB

N°. de casos registrados
146

N°. de casos resueltos
46

Número de casos registrados por mes

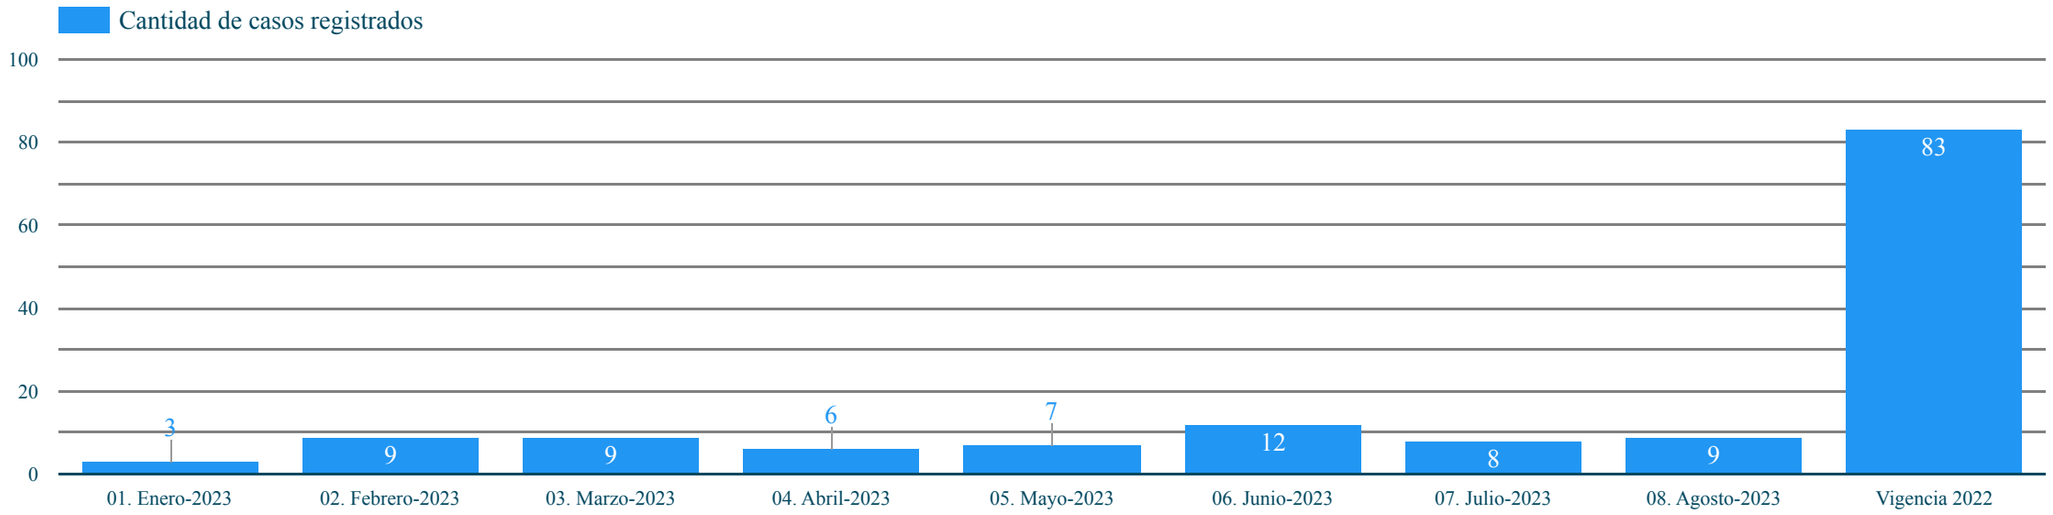

Número de casos por zona o área pendientes

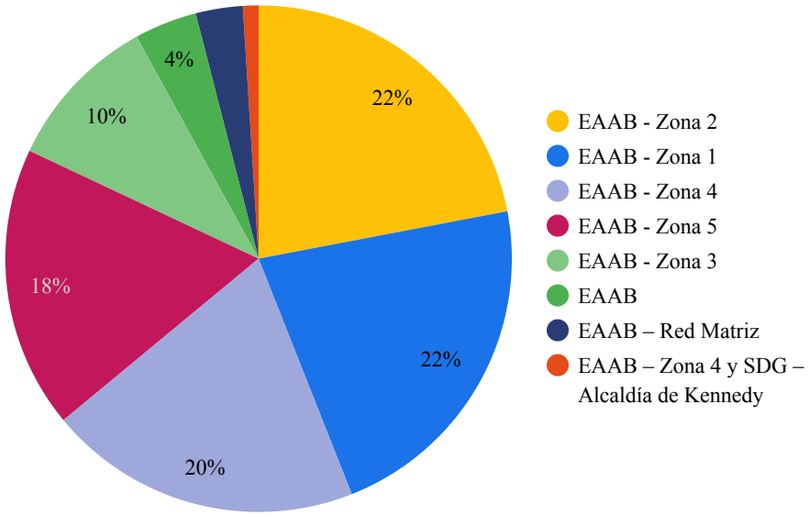

N°. DE CASO...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EABB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021)	PENDIENTE
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	ATENDIDO
29	Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021)	PENDIENTE
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	PENDIENTE

Casos:
Secretaría Distrital de Ambiente

N°. de casos registrados
9

N°. de casos resueltos
0

Número de casos registrados por mes

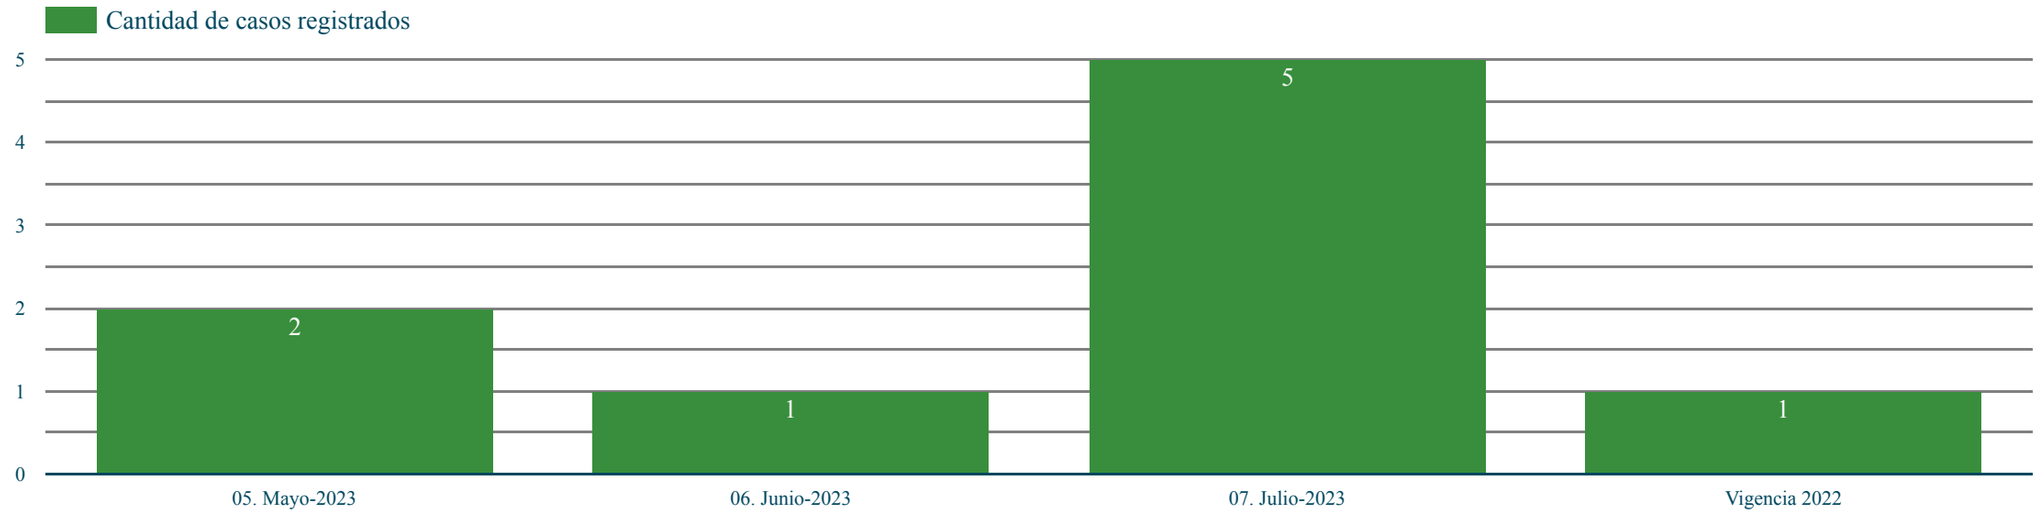

Pendientes por Entidad que presentó el caso

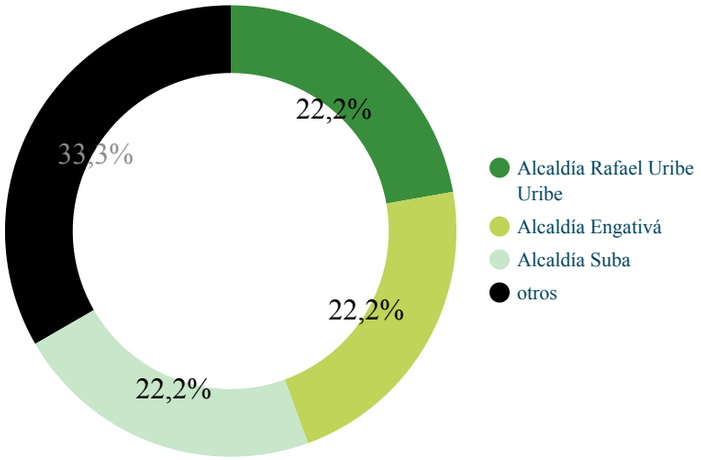

N°. DE CASO ▲	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
94	En el tema de malla vial, PENDIENTEs de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – IX Sesión 2022)	PENDIENTE
428	Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.	PENDIENTE
429	Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.	PENDIENTE
443	Para SDA, frente al contrato FDL RU 281 de 2019, se realizó radicación N°. 2021ER143989, donde se programan y efectuan visitas con funcionario de la SDA, contratista e interventoría. De estos recorridos se solicita generar modificaciones, y nuevamente se radica a la Entidad con número 2022ER173992, no obstante, a la fecha	PENDIENTE

Casos:
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

N°. de casos registrados
29

N°. de casos resueltos
3

Número de casos registrados por mes

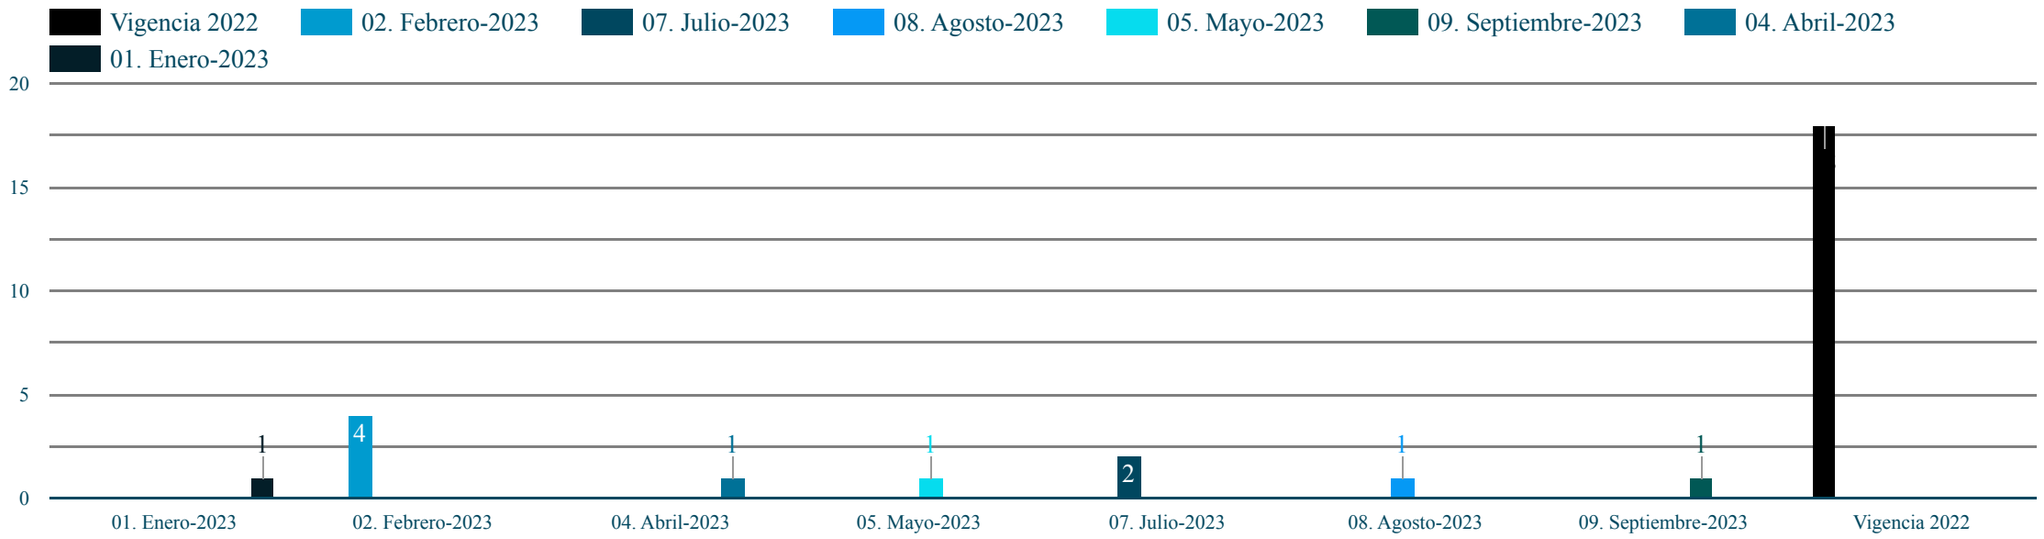

Número de casos pendientes por solicitante

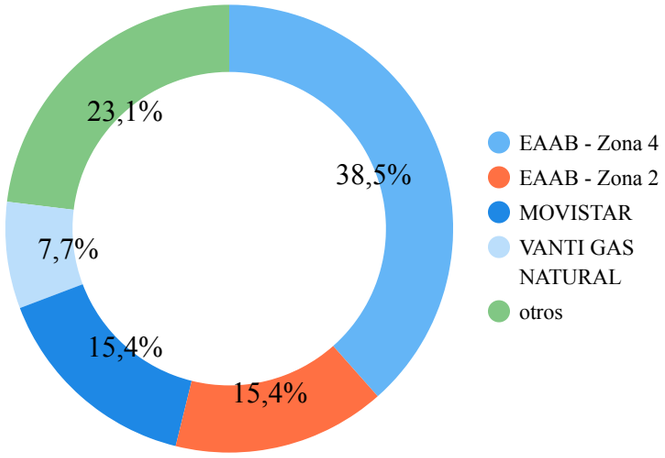

MES REP…	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, Cl26 con KR 69 y el tercer punto Cl 26 cerca a la Av Boyaca	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va	PENDIENTE

Casos:
Unidad de Mantenimiento Vial - UMV

N°. de casos registrados
5

N°. de casos resueltos
4

Número de casos registrados por mes

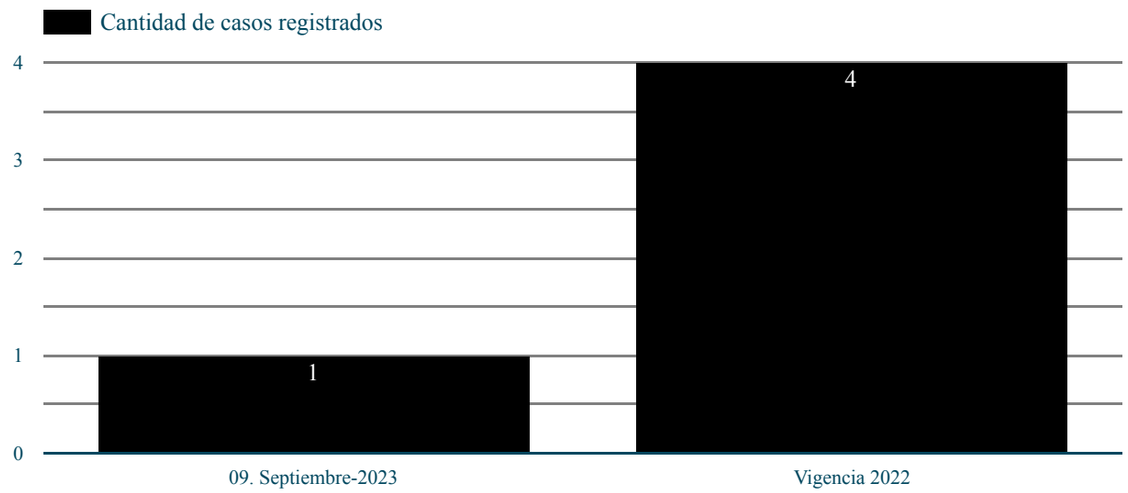

Pendientes por Entidad que presentó el caso

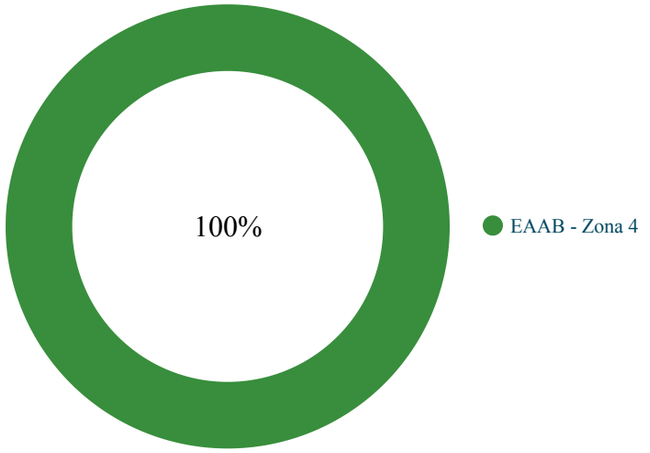

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
09. Septiembre-2023	Para UMV, solicita una reunión con UMV para tratar el reporte de un daño en calle 78C # 17 f - 47 vía al Mochuelo ya que hay un daño en la acometida de EAAB	PENDIENTE
Vigencia 2022	Para UMV, en la localización TV 19 con CL 44 sur y CL 47 sur, la calzada está bastante afectada ocasionando alto riesgo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para la UMV, para las intervenciones en el barrio “20 de julio”, se requiere contacto del área de intervención, en aras de realizar proceso de coordinación al respecto de las obras adelantadas en este sector.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para UMV, se le consulta al Ing. Humberto frente a la intervención realizada en el barrio el Tuno – Calle 118 Bis Sur N°. 0-61, se reportó que la reserva del tramo corresponde a la UMV, por lo cual se requiere verificar si al efectuar labores de mantenimiento en carpeta de rodadura, se taparon dos pozos de alcantarillado, se requiere ingresar a los pozos para hacer mantenimiento a la red.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	ATENDIDO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Casos:
Secretaría Distrital de Movilidad - SDM

N°. de casos registrados	N°. de casos resueltos
13	12

Número de casos registrados por mes

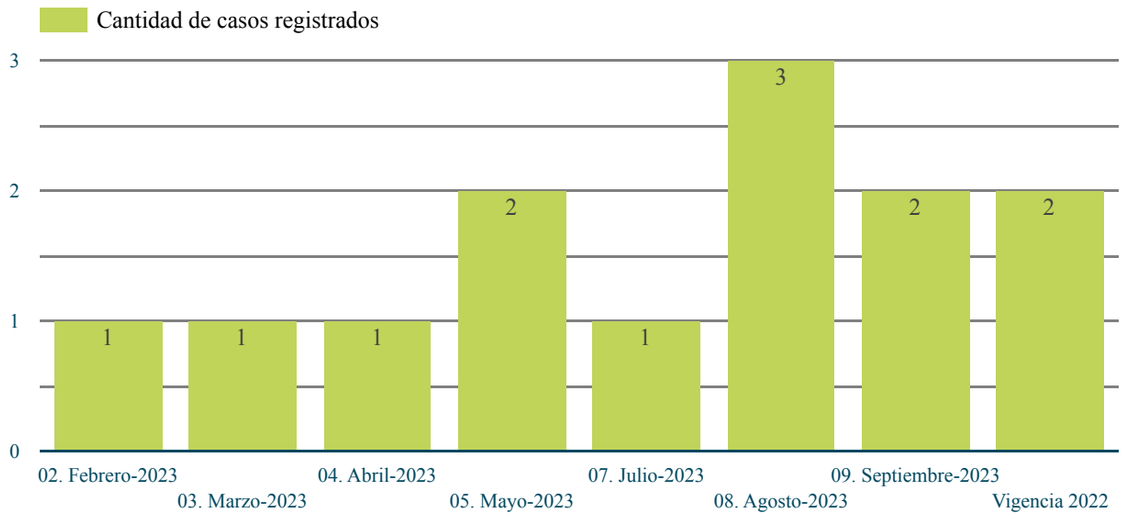

Pendientes por Entidad que presentó el caso

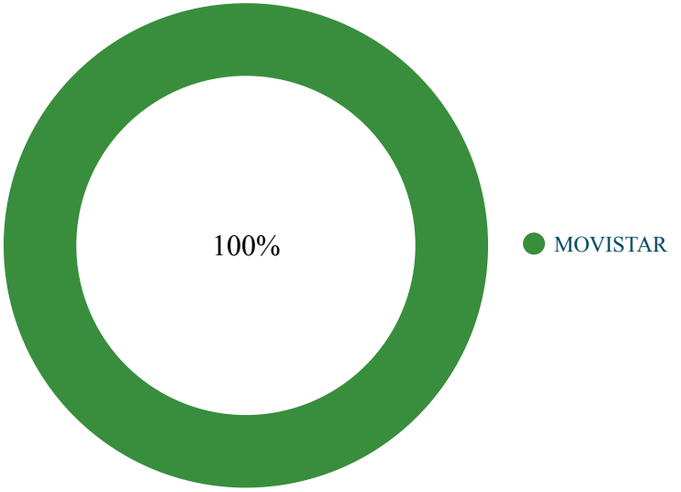

MES REPORTE DE CASO ▲	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 20236120058209 2 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	ATENDIDO
03. Marzo-2023	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	ATENDIDO
04. Abril-2023	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalizarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer. Hoy estarán enviando el oficio a SDM, para que se considere la señalización de vías ejecutadas por el FDL.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para SDM, respecto de la respuesta a solicitud de aprobación de PMT, se indica que en el mes de febrero se radicaron 76 puntos, en marzo 265 y en abril 150, para un total de 491 puntos pendientes, sobre los cuales no se ha recibido respuesta, es importante precisar que no nos	ATENDIDO

BOGOTÁ

Casos:
ENEL Colombia ESP

N°. de casos registrados
58

N°. de casos resueltos
25

Número de casos registrados por mes

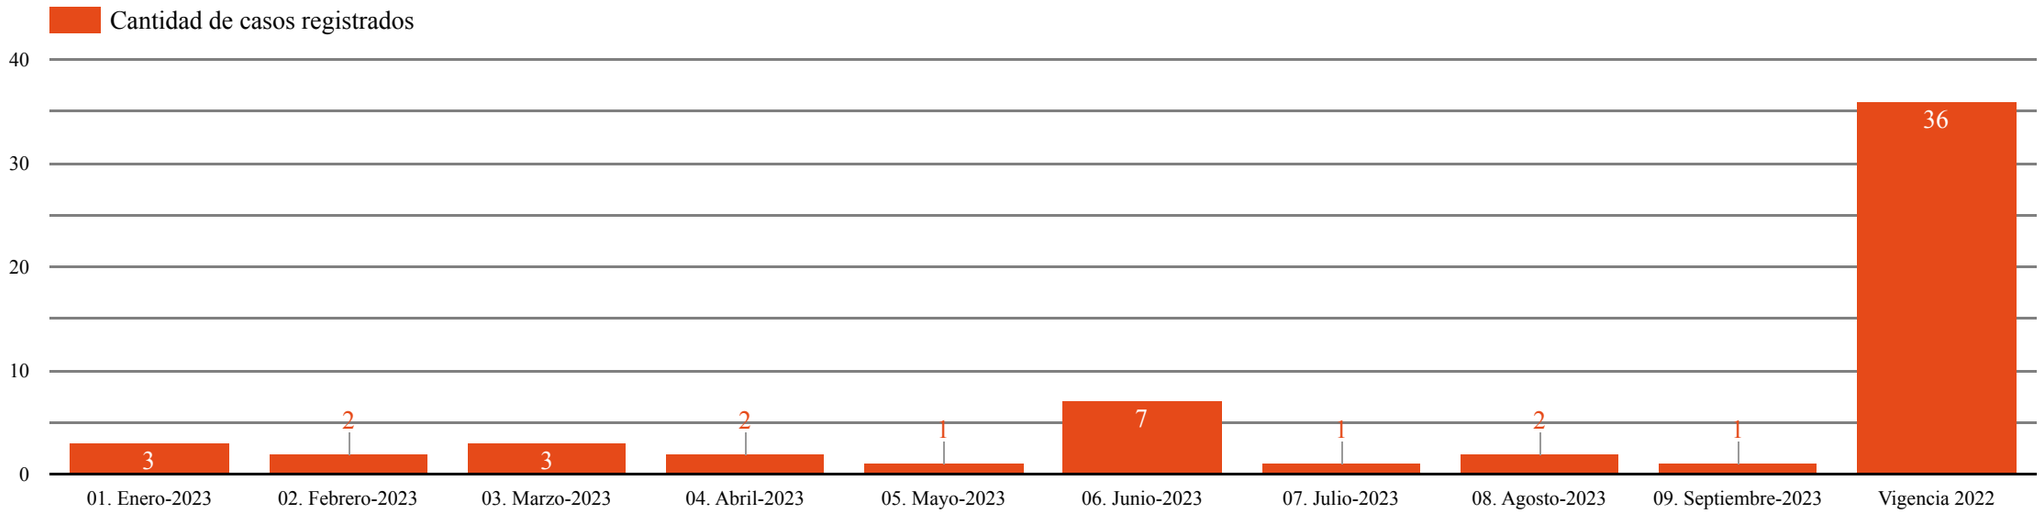

Pendientes por Entidad que presentó el caso

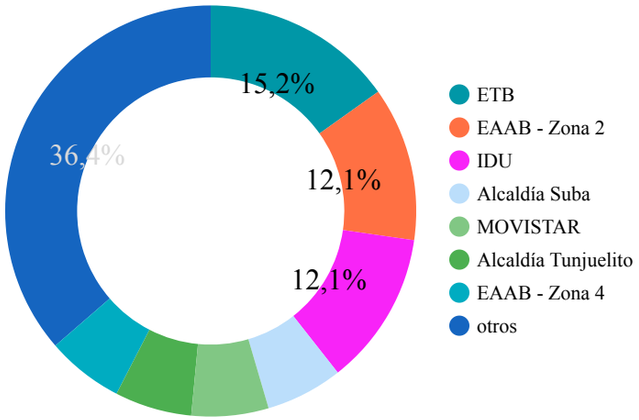

MES REPORT…	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los incovenientes general soluciones y reactivar el contrato	PENDIENTE
01. Enero-2023	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliairia del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	PENDIENTE
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Solicitud para Enel, referente a un poste con riesgo de caída y obstrucción de acceso al predio de la Calle 25B No. 74 50	ATENDIDO

Casos:
GRUPO VANTI

N°. de casos registrados
14

N°. de casos resueltos
9

Número de casos registrados por mes

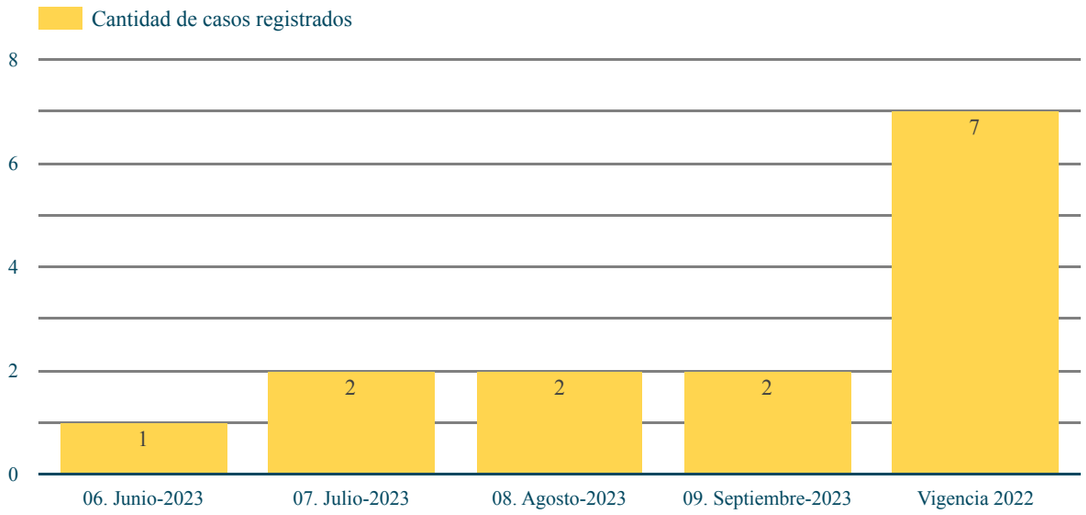

Pendientes por Entidad que presentó el caso

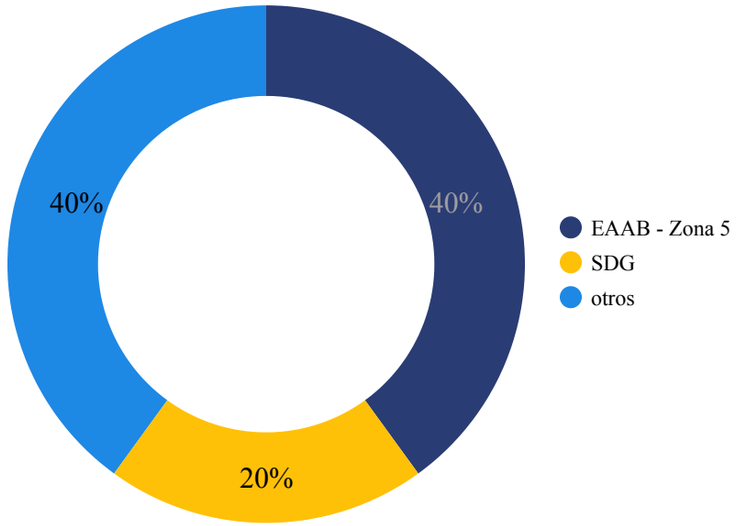

MES REPORTE DE CAS…	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
06. Junio-2023	Para VANTI, con respecto a un CIV en Alameda en la CL 63 Bis Sur entre carrera 74 H y 74F, solicita coordinar una visita de acompañamiento para tratar temas especificos en el punto. La obra fue reportada por medio de un oficio via correo electrónico informando las intervenciones y ubicación al inicio del contrato. Por otro lado, se realiza requerimiento frente a cinco puntos más en donde se van a abrir nuevos frentes de obra y solicita coordinar aspectos con VANTI. Se enviará correo electrónico para programar las visitas respectivas.	ATENDIDO
07. Julio-2023	Se presenta requerimiento para VANTI, respecto al traslado de una red de polietileno de 1” en el sector de Gualoche que se instaló sobre la vía. Se han realizado visitas por parte de VANTI, pero se requiere consolidar el traslado de la red a un costado del andén, generando retrasos en el proceso constructivo.	PENDIENTE
07. Julio-2023	Para VANTI, se tiene solicitud por parte de contratista S y S ingeniería, que termino contrato el 21 de mayo de 2023 con el FDL de Fontibón, ha solicitado certificación de “paz y salvo” y le han informado que no es posible emitir certificación de “paz y salvo” porque se tiene pendiente el pago de un daño, se ha solicitado factura, pero no se ha emitido respuesta.	ATENDIDO
08. Agosto-2023	Se presenta tema pendiente con VANTI – Gas Natural, y que se ha venido adelantando con el profesional Mauricio García, se informa que se encontró una red de 4” en acero, instalada posiblemente a través de perforación dirigida, afectando una descarga de domiciliaria de 6” en un predio localizado en la Calle 5B con carrera 73C, aunque ya se tiene conocimiento de la situación a resolver, se solicita quede consignado en el acta y se de seguimiento al caso, ya que se pueden generar situaciones de riesgo a los	PENDIENTE

Casos:
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB

N°. de casos registrados
13

N°. de casos resueltos
6

Número de casos registrados por mes

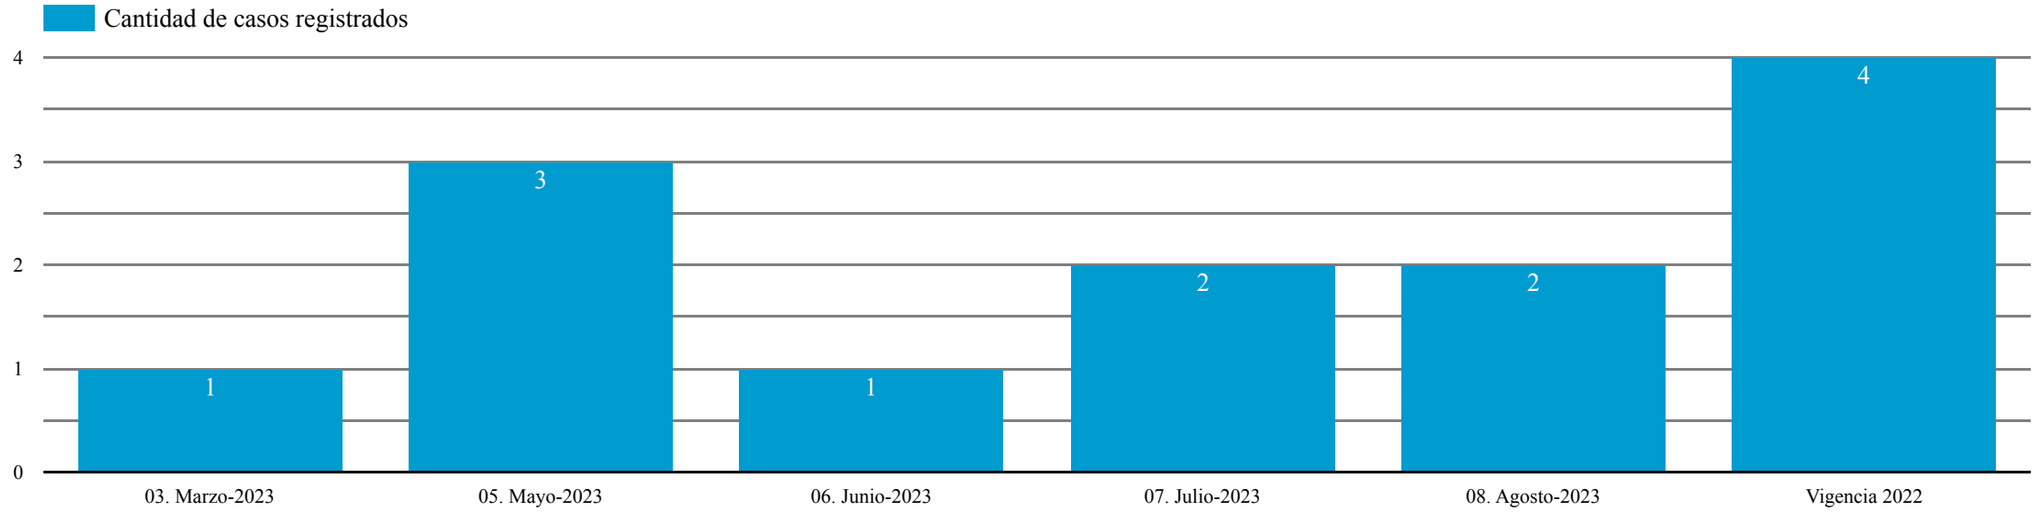

Pendientes por Entidad que presentó el caso

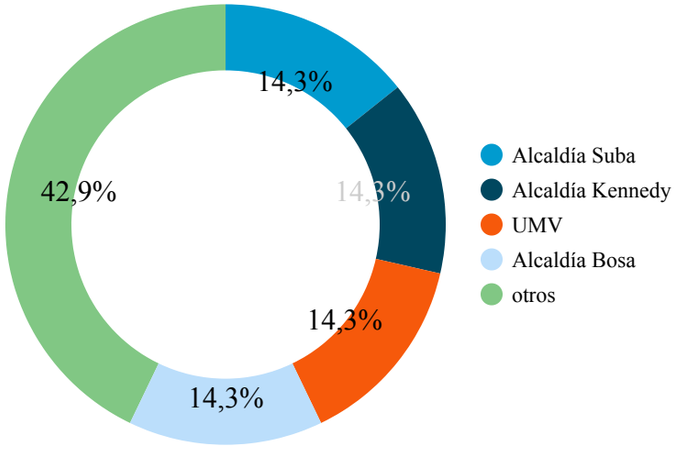

MES REPORT…	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
03. Marzo-2023	Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renivelación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal	ATENDIDO

Casos:
Claro Colombia

N°. de casos registrados
5

N°. de casos resueltos
3

Número de casos registrados por mes

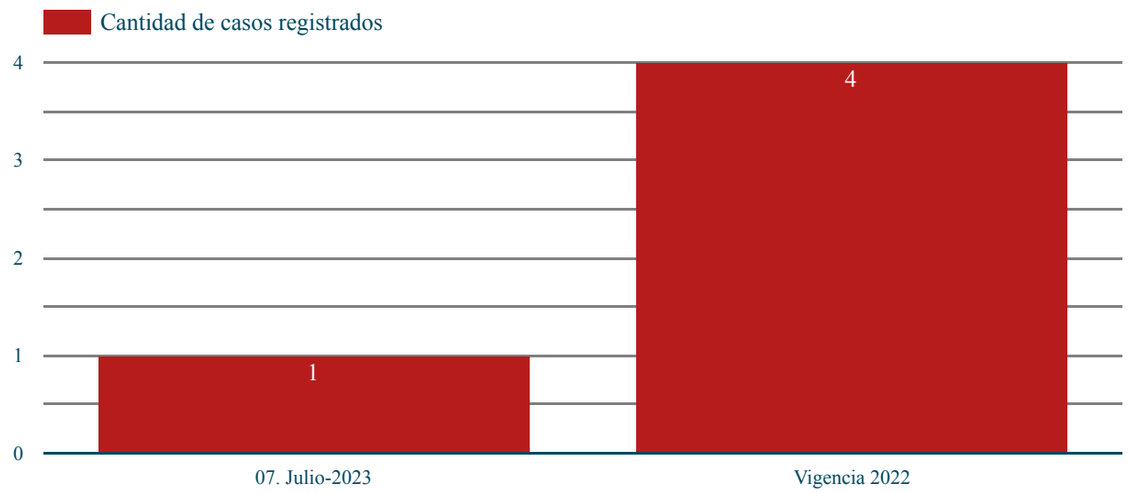

Pendientes por Entidad que presentó el caso

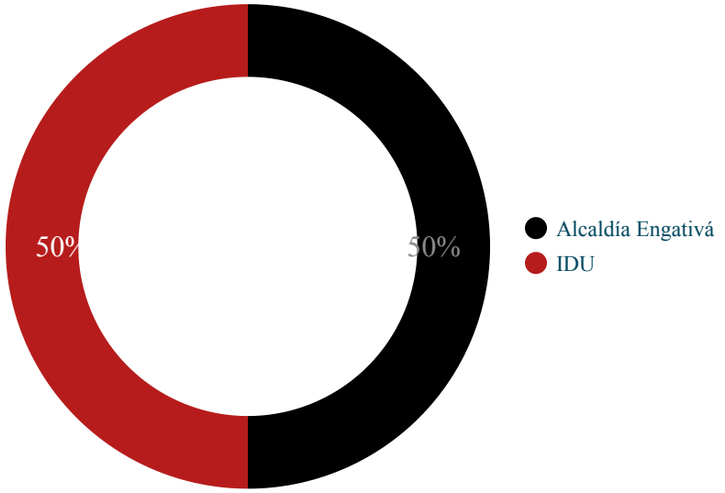

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
07. Julio-2023	Para Claro, se solicita respuesta a requerimiento de “paz y salvo” para contrato 396 de 2022 de INCITECO.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopuente del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	PENDIENTE

Casos:
Telefónica - Movistar

N°. de casos registrados
7

N°. de casos resueltos
4

Número de casos registrados por mes

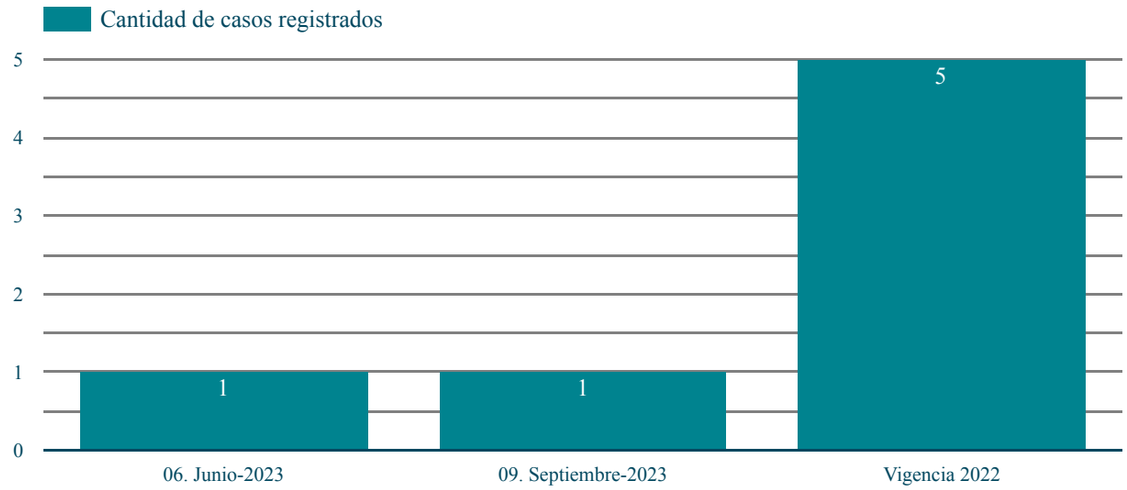

Pendientes por Entidad que presentó el caso

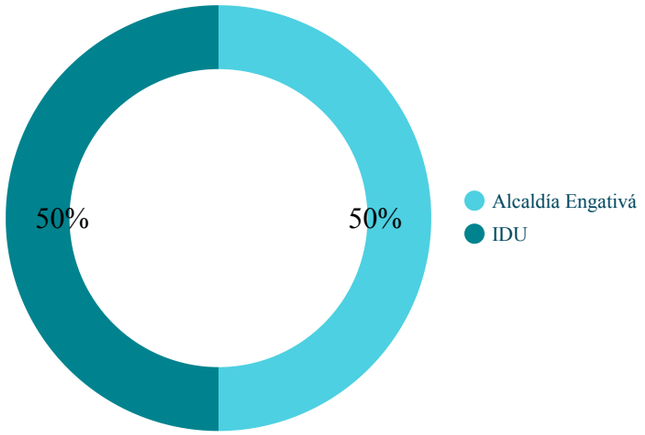

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
07. Julio-2023	Para Claro, se solicita respuesta a requerimiento de “paz y salvo” para contrato 396 de 2022 de INCITECO.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopuente del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	PENDIENTE

Secretaría Distrital de Gobierno

Casos:
Alcaldías locales

ENTIDAD RESPONSABLE RESPUESTA | MES REPORTE DE CASO | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | ESTADO DEL CASO

Número de casos pendientes por mes a cargo de Alcaldías locales

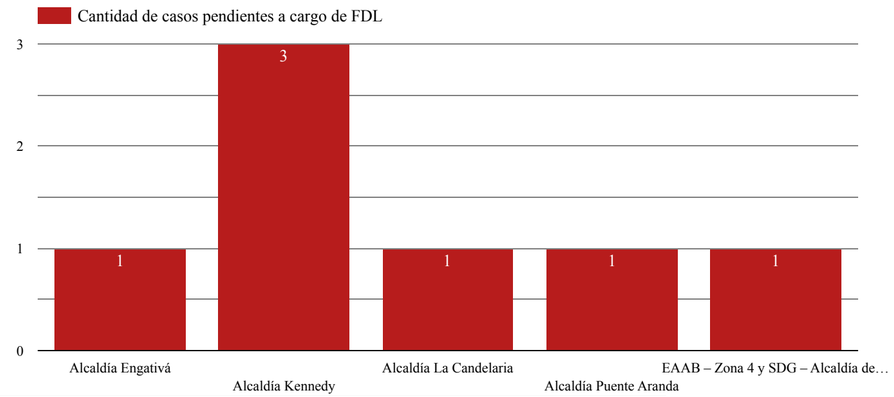

Número de casos presentados por mes por Alcaldías locales

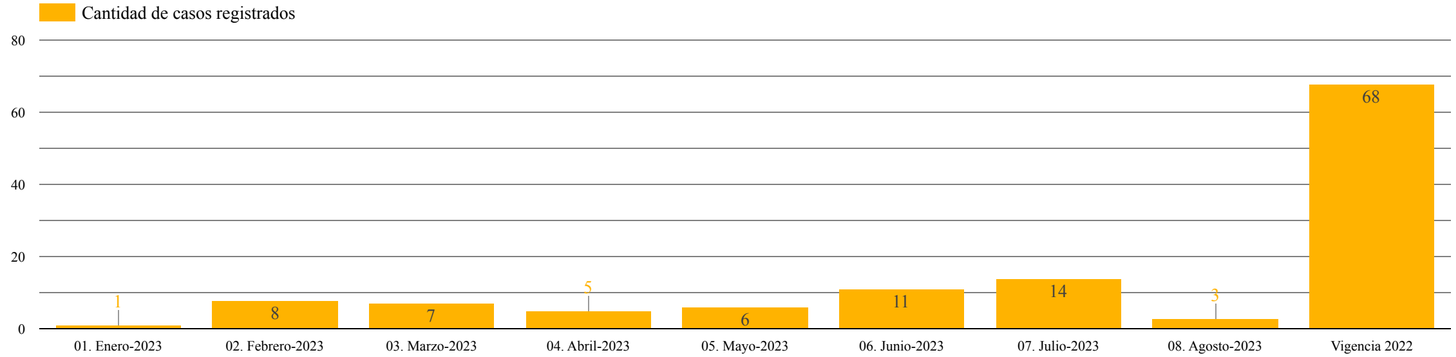

Casos presentados por Alcaldía local

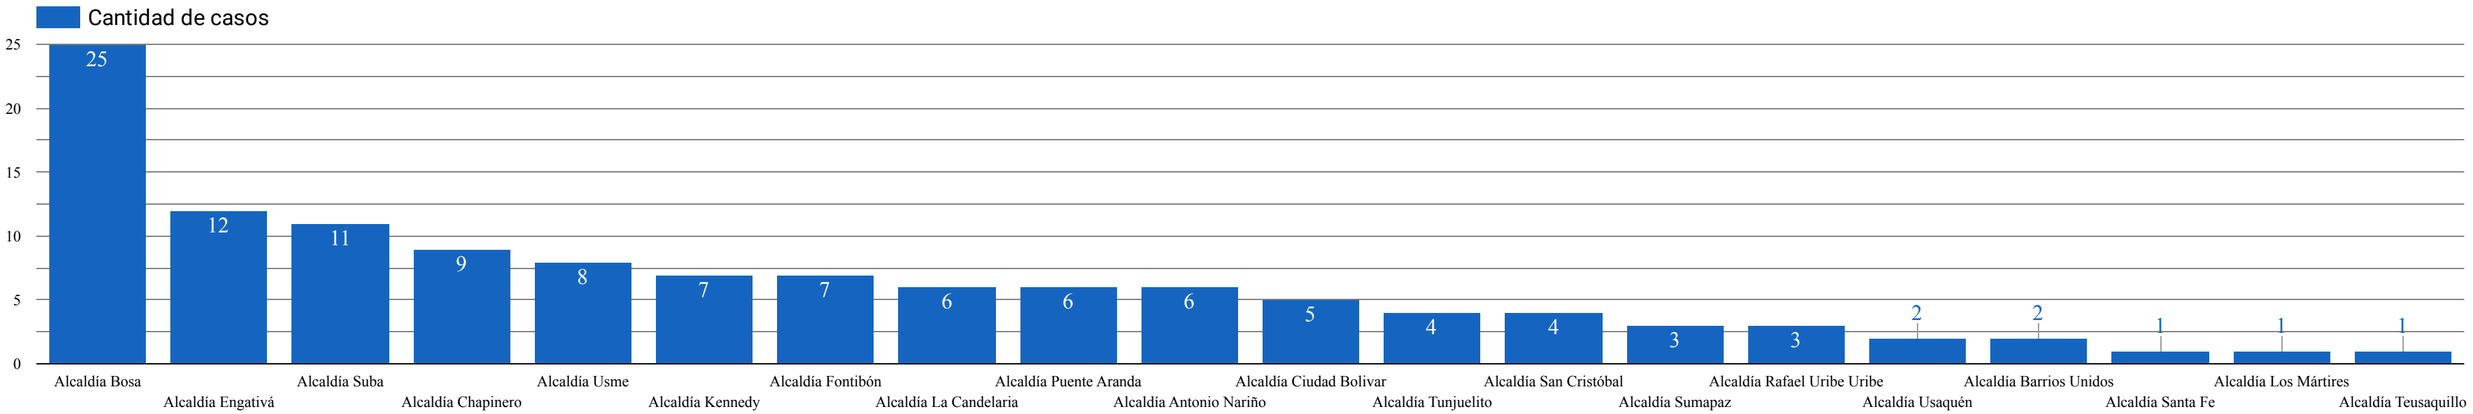

Registro de los casos

MES REPO…	SOLICITUD	ENTIDAD …	ESTADO DE…
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero-2023	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 20236120058209 2 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Solicitud de respuesta por parte de la EAAB respecto a los requerimientos E-2022-008905, E-2022-012772 del año pasado y uno realizado en enero de este año, indagando sobre unos tramos viales que están reservados por el consorcio Alcantarillado de Occidente, al momento no se ha dado respuesta	EAAB	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Solicitud para Enel, referente a un poste con riesgo de caída y obstrucción de acceso al predio de la Calle 25B No. 74 50	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO

1 - 100 / 132

N°. de casos registrados
123

N°. de casos resueltos
62

N°. de casos pendientes
61

BOGOTÁ
